




NUEVO HOSPITAL DE TERUEL



PROGRAMA

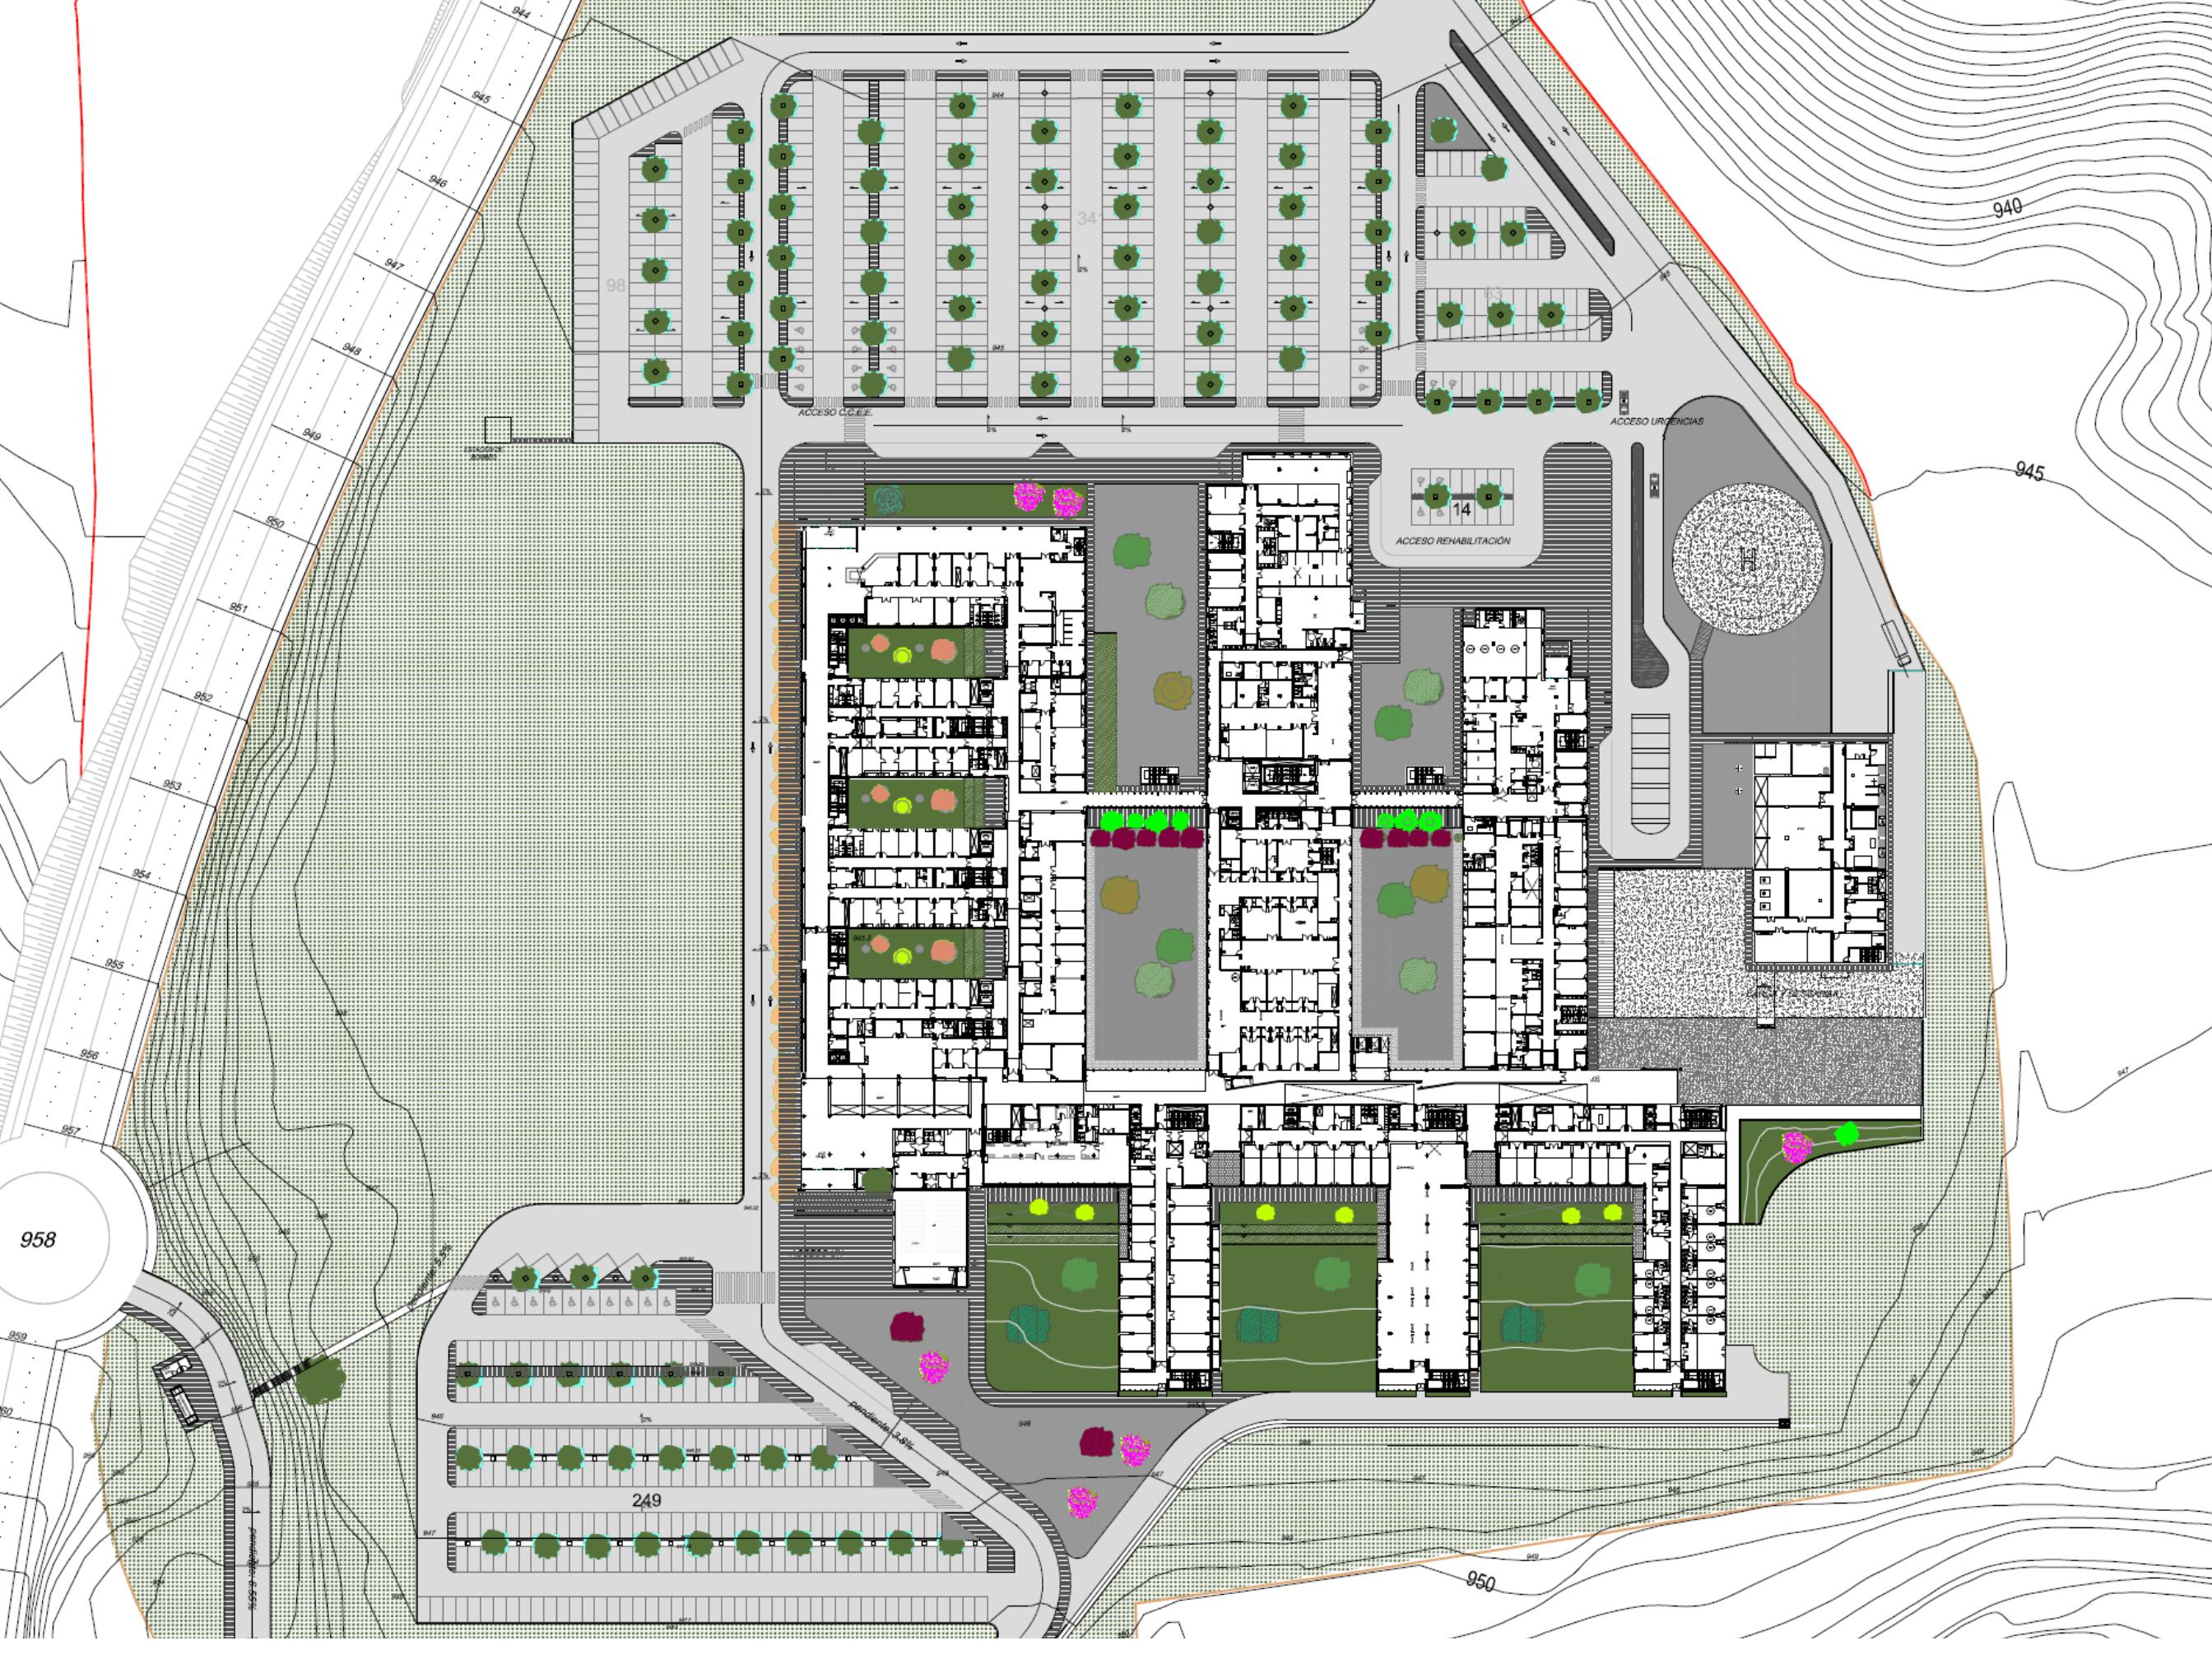

940

945

947

948

949

950

958

959

960

961

962

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

98

34

14

249

ACCESO C.C.E.E.


ACCESO URGENCIAS


ACCESO REHABILITACIÓN

Acceso al Hospital

Acceso al Hospital


950

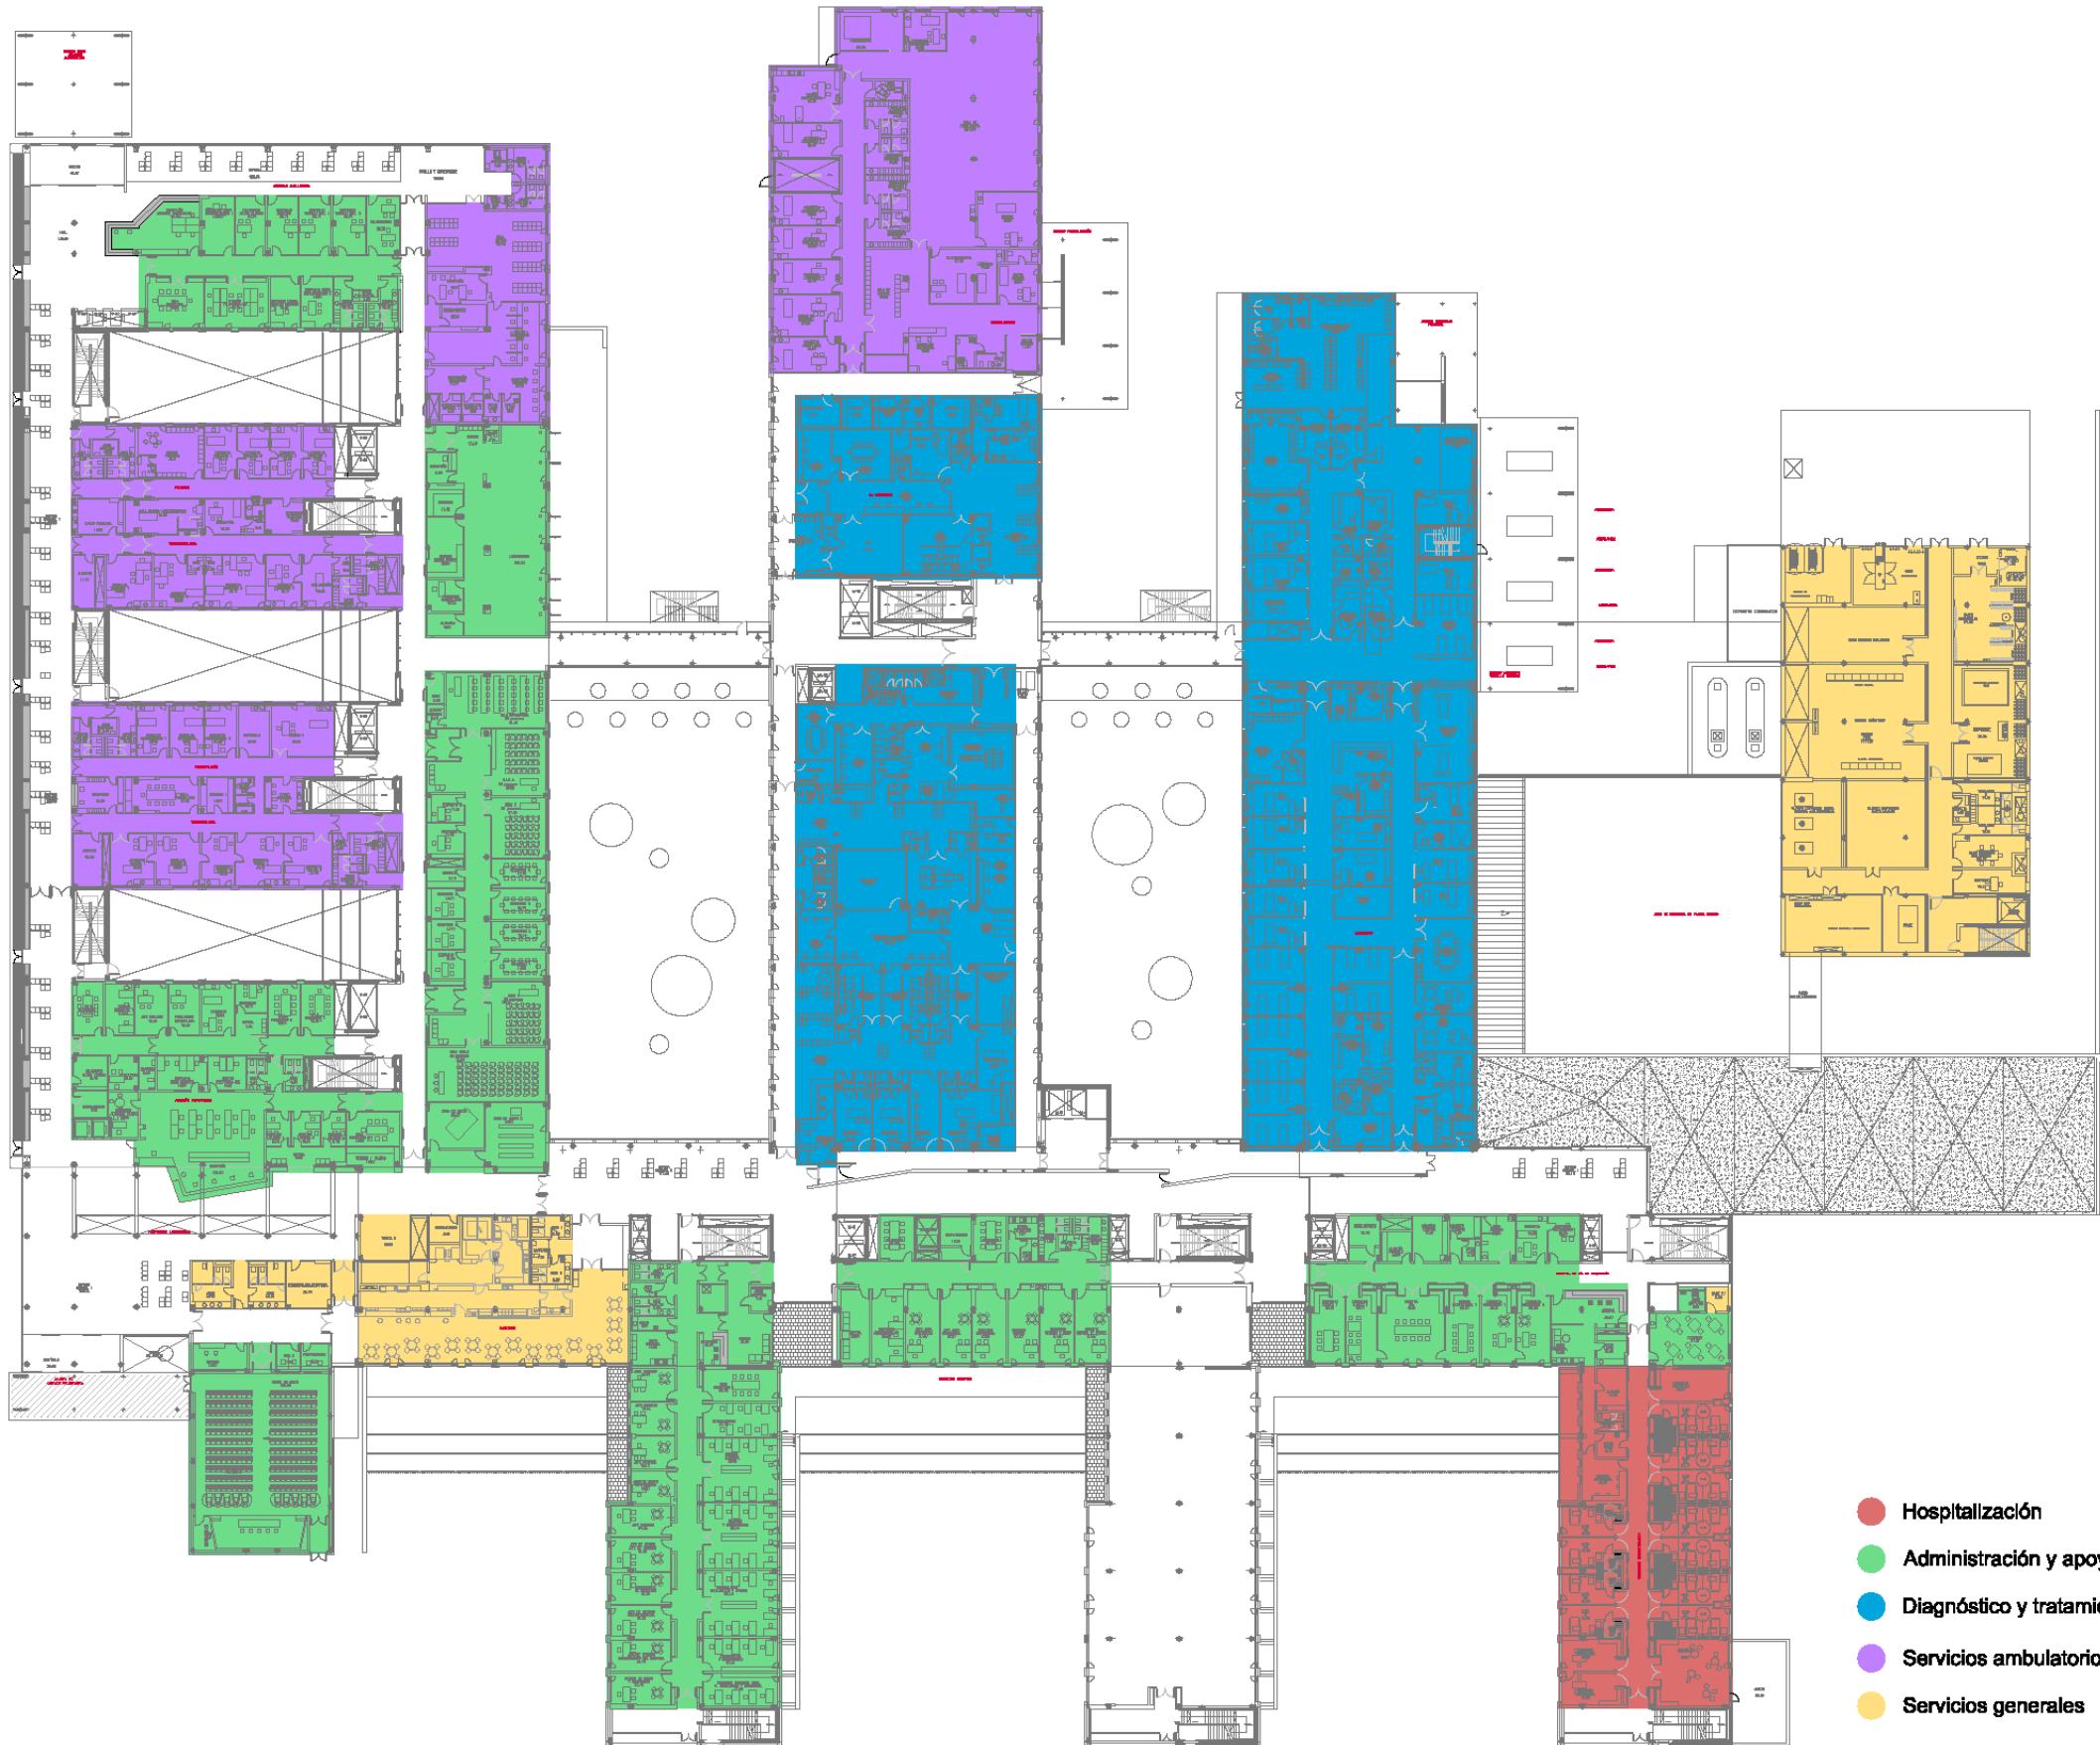

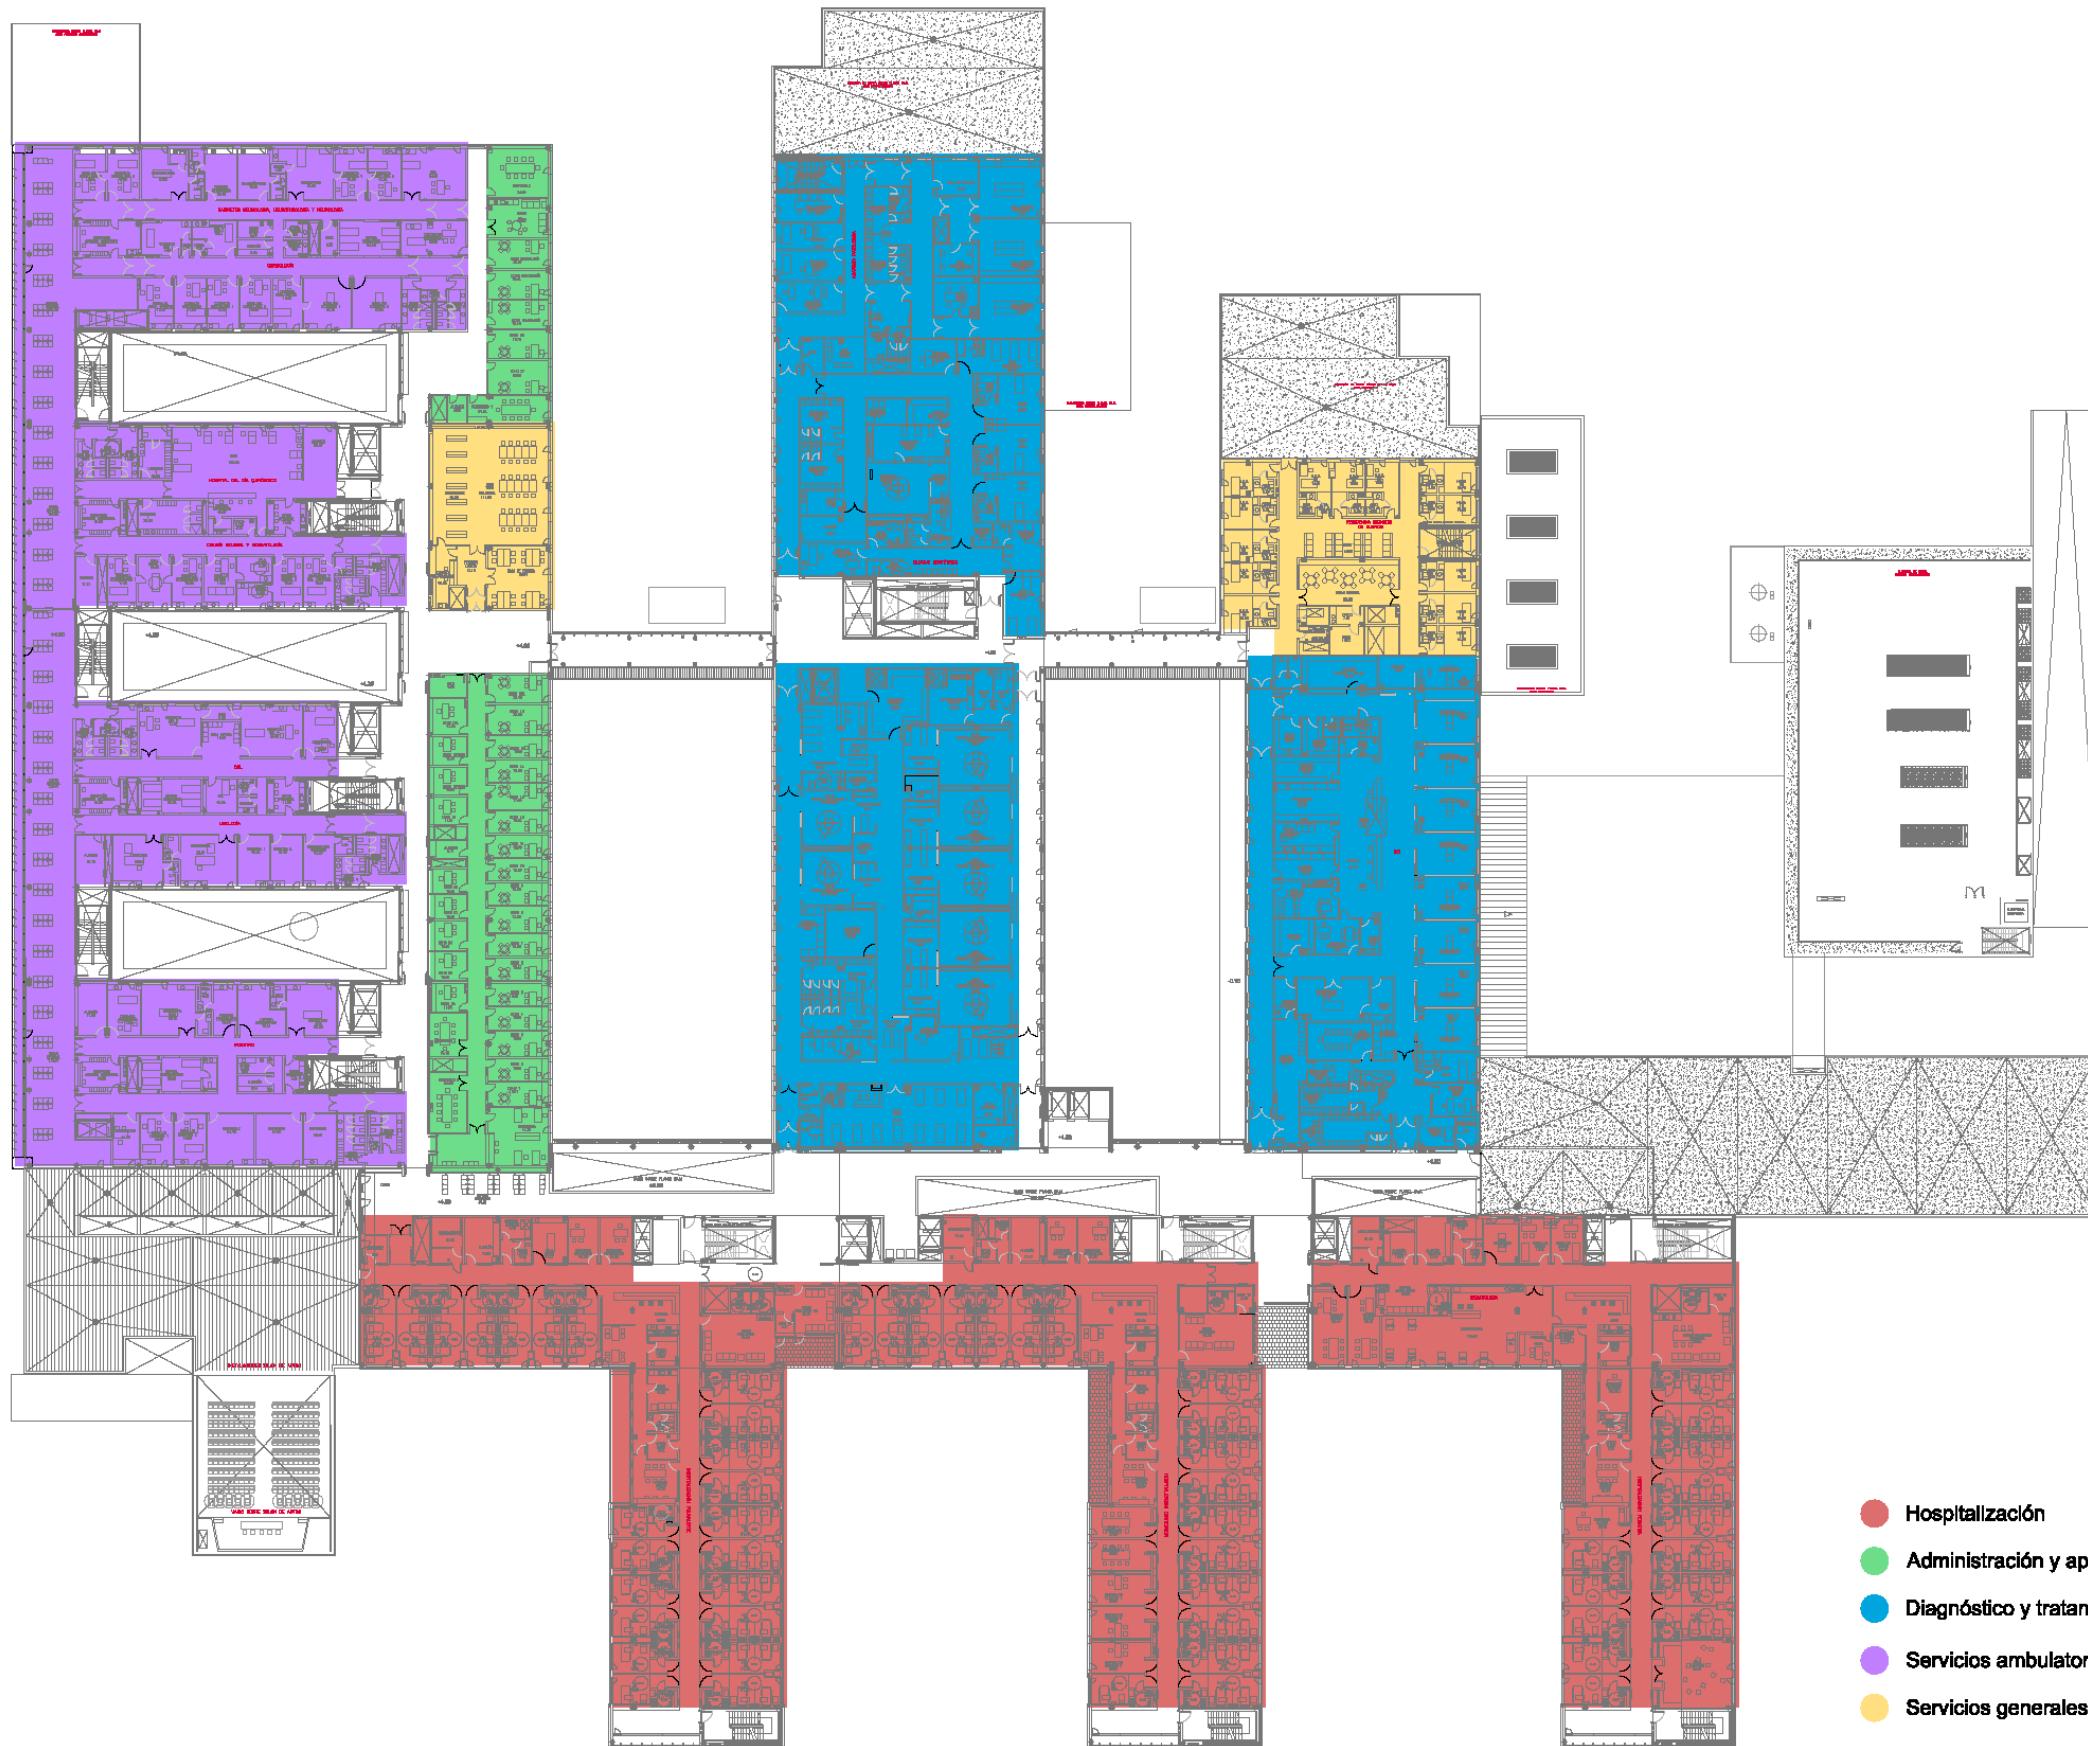

- Hospitalización
- Administración y apoyos clínicos
- Diagnóstico y tratamiento
- Servicios ambulatorios
- Servicios generales



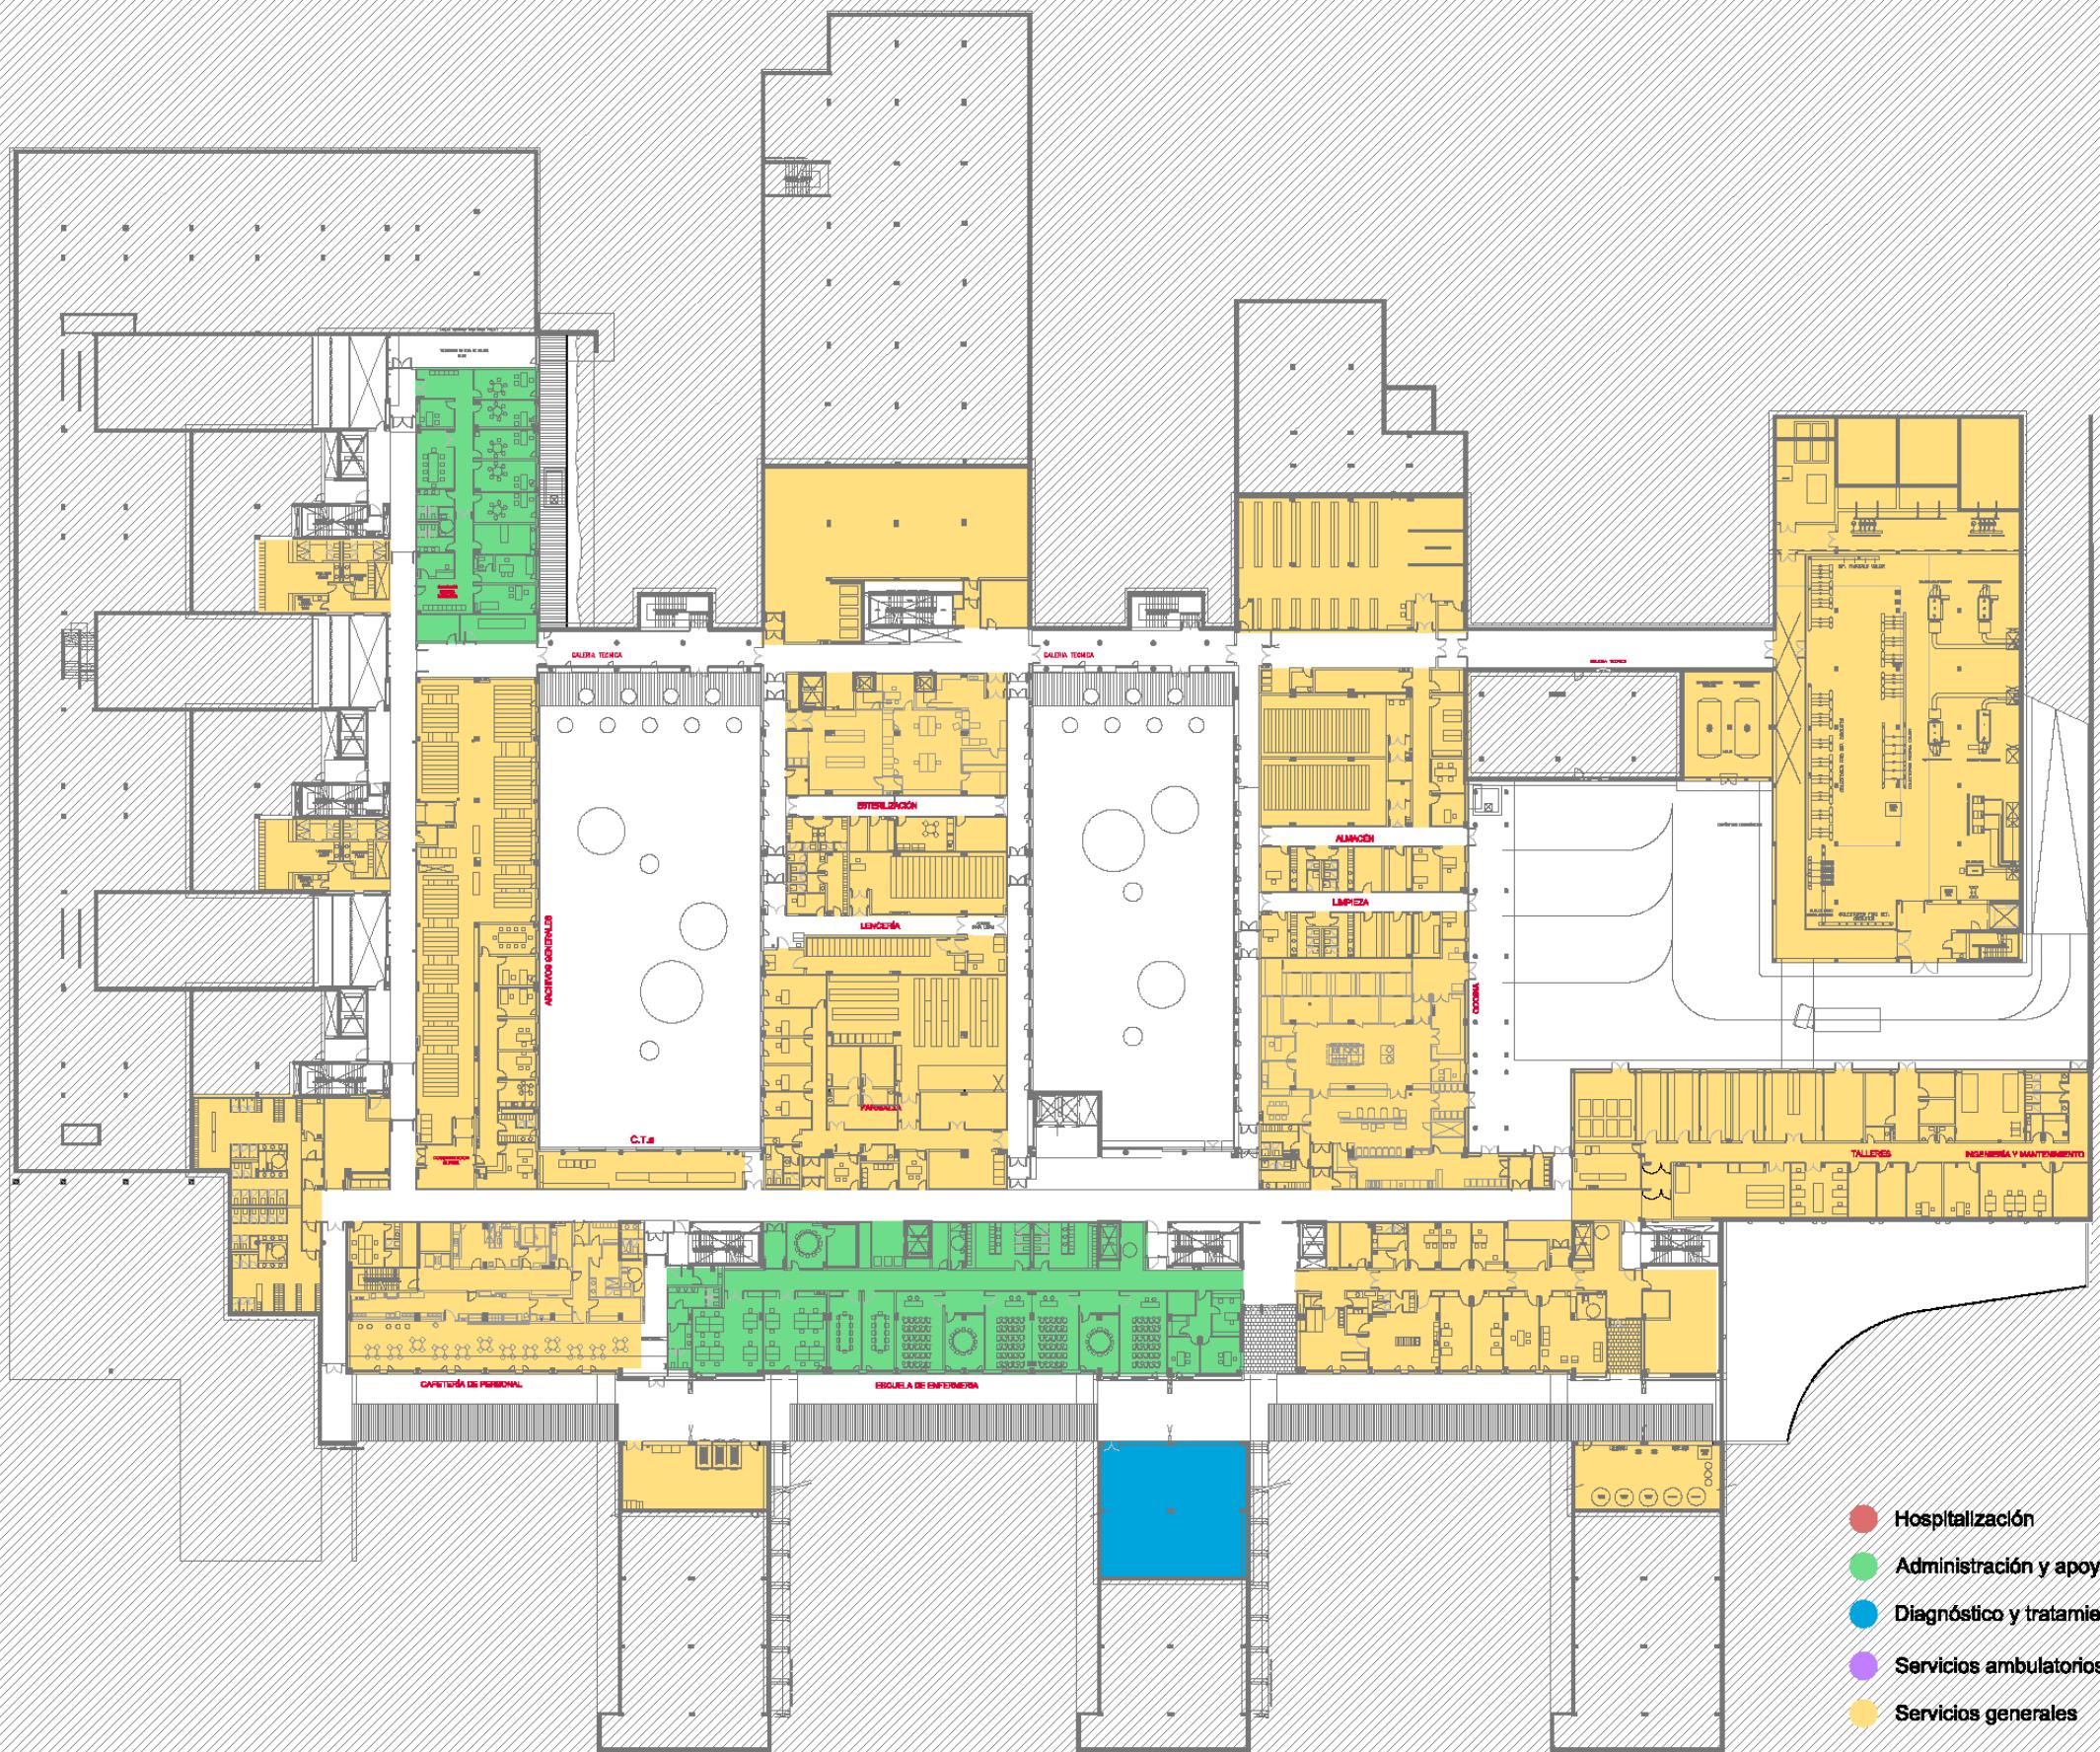

- Hospitalización
- Administración y apoyos clínicos
- Diagnóstico y tratamiento
- Servicios ambulatorios
- Servicios generales



Hospital actual:
21.200m²

Hospital nuevo:
53.920m²

HOSPITALIZACIÓN	Habit dobles	Habit individ.	Habit indiv polivalentes(*)
POLIVALENTE	61	31	
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA	5	6	7
PEDIATRÍA	5	8	
PSIQUIATRÍA	7	4	
TOTAL	78	49	7

LOCALES	Número	Nº Puestos
QUIRÓFANOS DE PROGRAMADA	4	
QUIRÓFANOS DE CMA	2	
QUIRÓFANOS DE URGENCIAS	1	
QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍA	1	
HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO		10
TOTAL	8	

H.
OBISPO
POLANCO

NUEVO
HOSPITAL

HABITACIONES	Polivalente	Doble		122
		Individual		31
	Obstetricia/ Ginecología	Doble		10
		Individual		6
		polivalente		14
	Pediatria	Doble		10
		Individual		8
		Cunas- Incubadoras		7
	Psiquiatria	Doble		14
		Individual		4
TOTAL			209	226

UCI	Nº Boxes		6	9
-----	----------	--	---	---

QUIRÓFANOS	Programado			4
	CMA			2
	Urgencias			1
	Cesáreas			1
	TOTAL		5	8

H. DE DÍA	Quirúrgico		5	8
	Médico		4	12
	Hemodiálisis		16	16
	Oncológico		8	14



CONTRATACIÓN

9 LOTES

46 MESES

**Acta Inicio
25.FEB.2019**

LOTES OBRA NH TERUEL	ADJUDICACION	FIRMA ACTA INICIO
L 1.-CIMENTACION Y ESTRUCTURA	18.310.274,97	8/04/2019
L 2.-OBRA CIVIL	25.268.813,57	25/02/2020
L 3.-ELECTRICIDAD	10.408.493,13	18/06/2020
L 4.-CLIMATIZACION Y FONTANERIA	17.594.610,00	18/06/2020
L 5.-CONTRAINCENDIOS	2.328.728,86	18/06/2020
L 6.-GASES MEDICINALES Y TRANSPORTE NEUMATICO	1.548.496,13	18/06/2020
L 7.-ASCENSORES	1.111.711,70	PENDIENTE
L 8.-TRASVERSAL Y URBANIZACION	9.218.338,60	25/02/2019
L 9.-CONTROL DE CALIDAD	585.389,01	25/02/2019
SUMA TOTAL	86.374.855,00	

LOTE 1 FINALIZADO

LOTE 2 EN FASE RESOLUCIÓN

LOTE 3,4,5,6 ACTA INICIO 18.JUNIO.2020/ PARALIZACIÓN

REPROGRAMACIÓN

LOTE 4 REINICIA SU TRABAJO 1 OCTUBRE

LOTE 3 REINICIARÁ EN OCTUBRE

LOTE 5 REINICIARÁ EN NOVIEMBRE

LOTE 6 REINICIARÁ EN NOVIEMBRE/DICIEMBRE

ESTADO

ACTUAL


AÑO	INVERSION
2019	9.553.751,44
(*)2020	11.046.016,92
TOTAL	20.599.768,36


**INVERSIÓN
REALIZADA**






MODIFICACIONES


LOTE 2


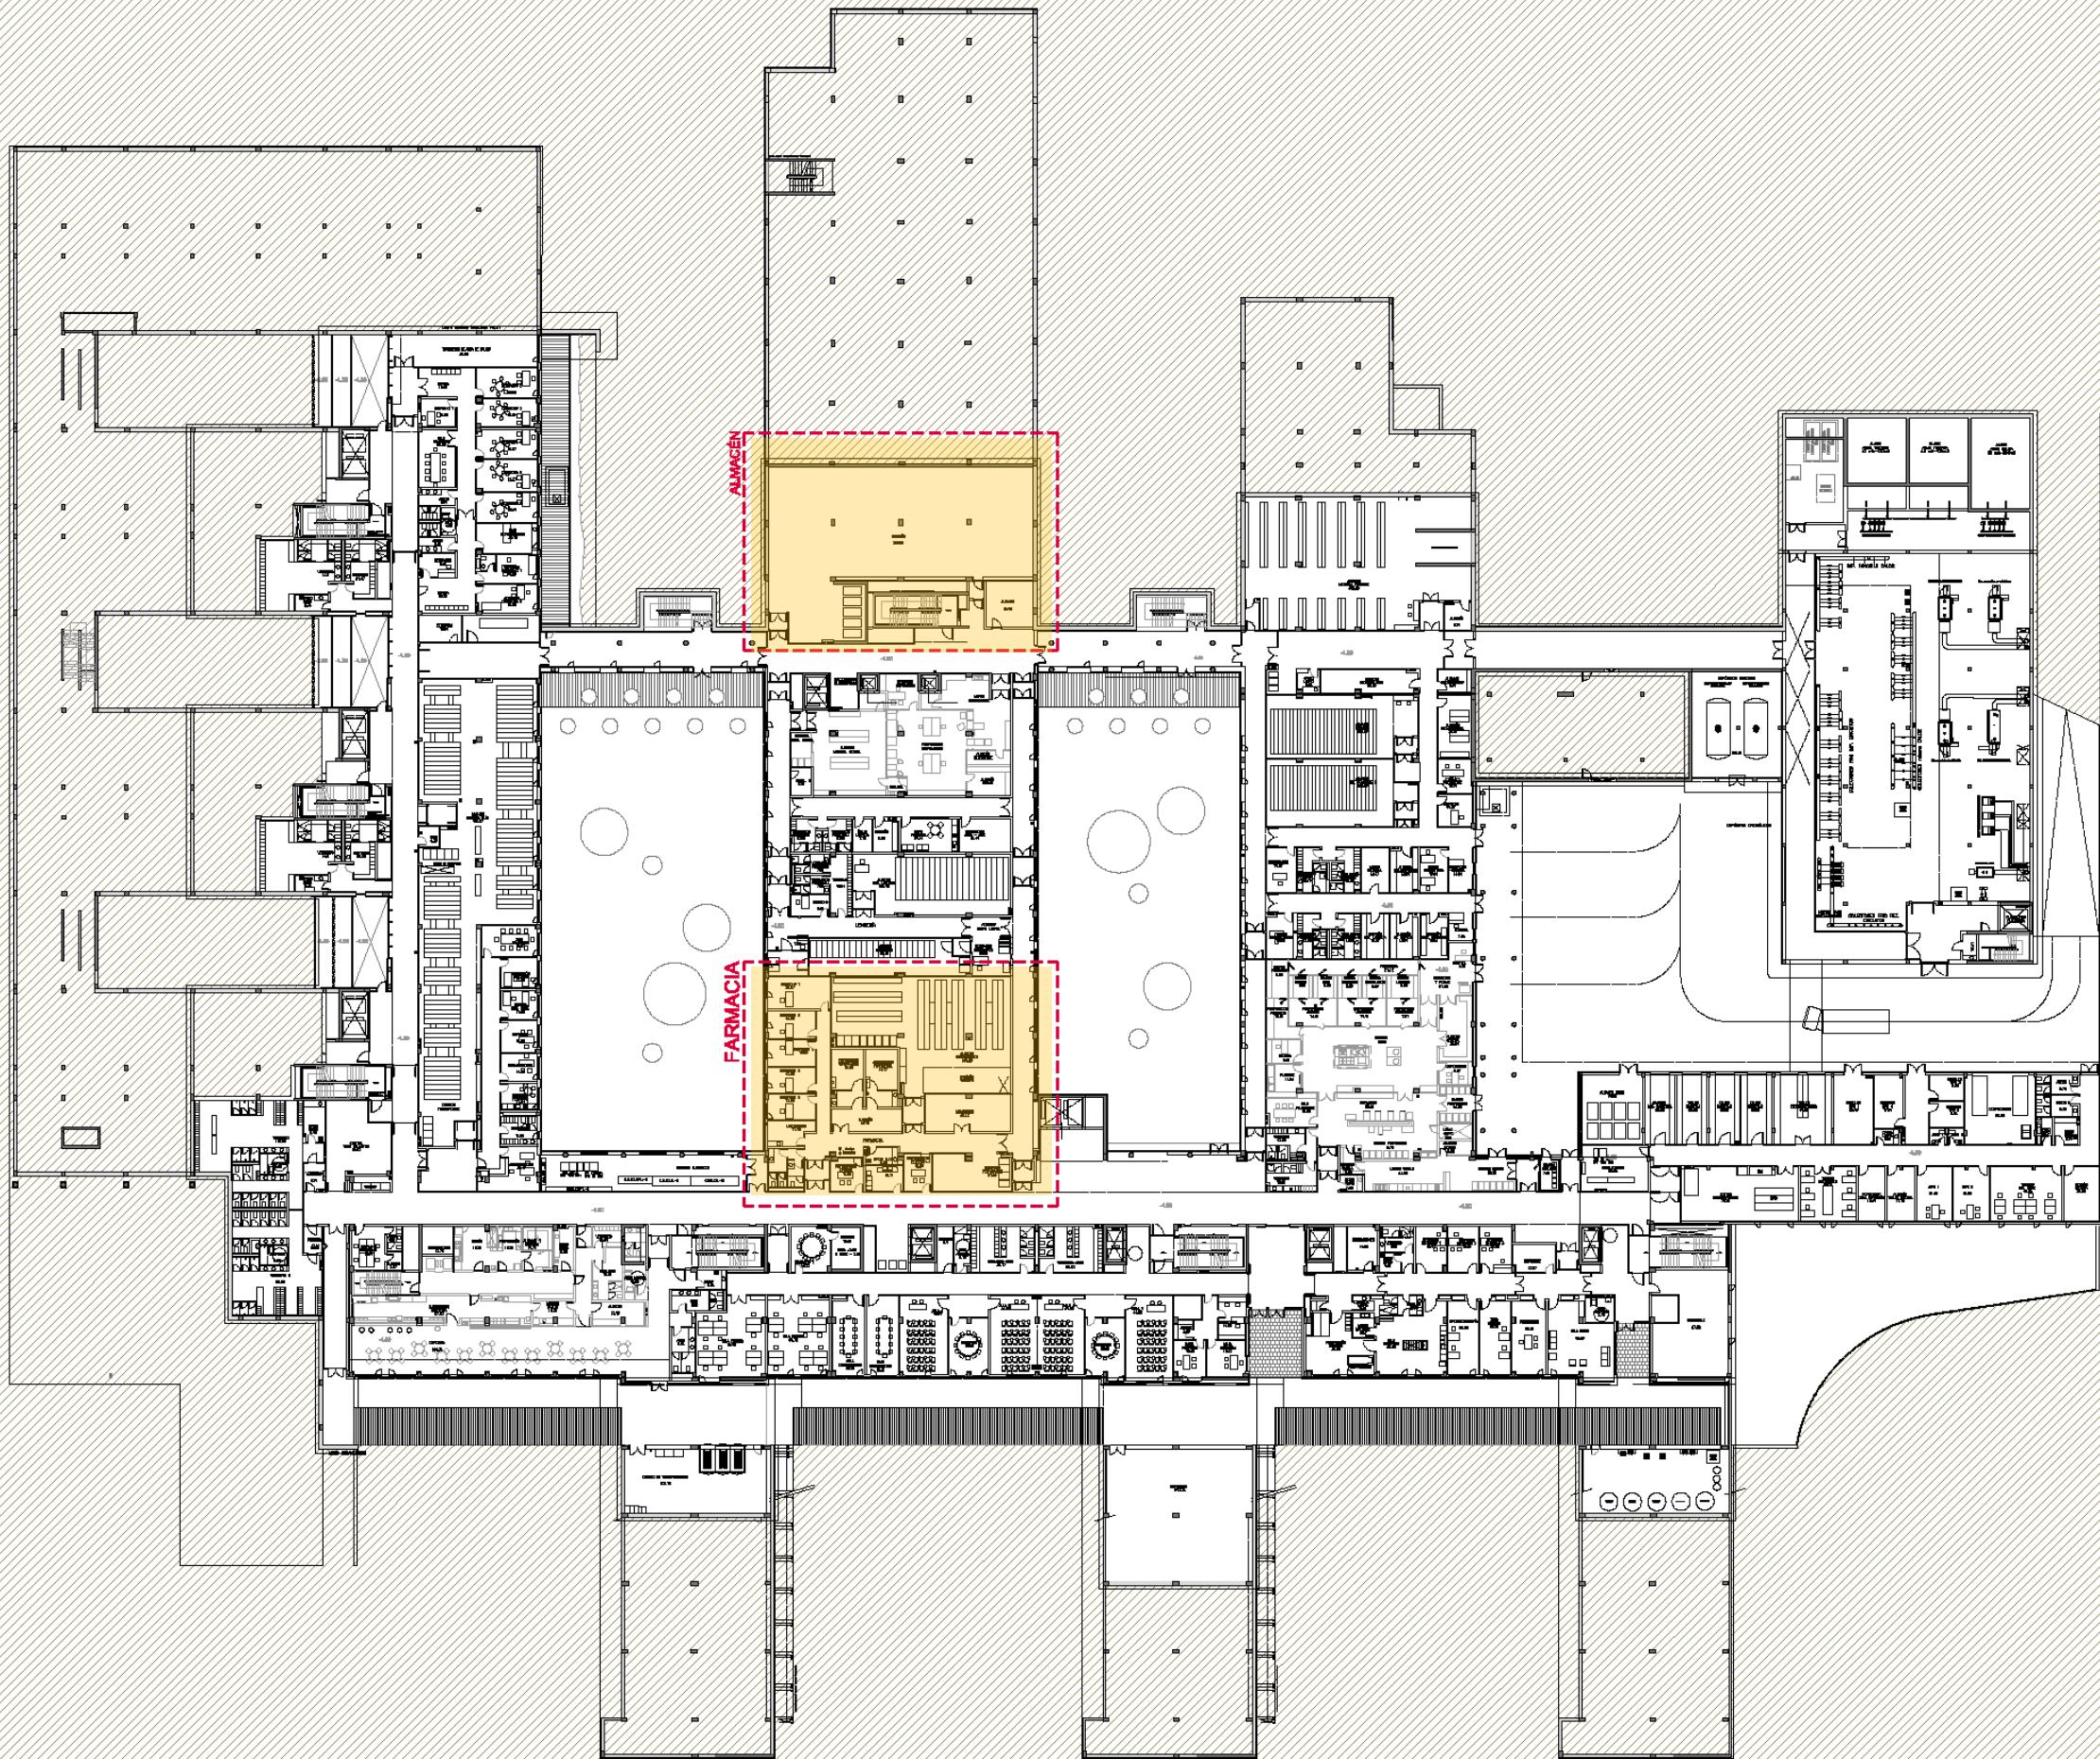


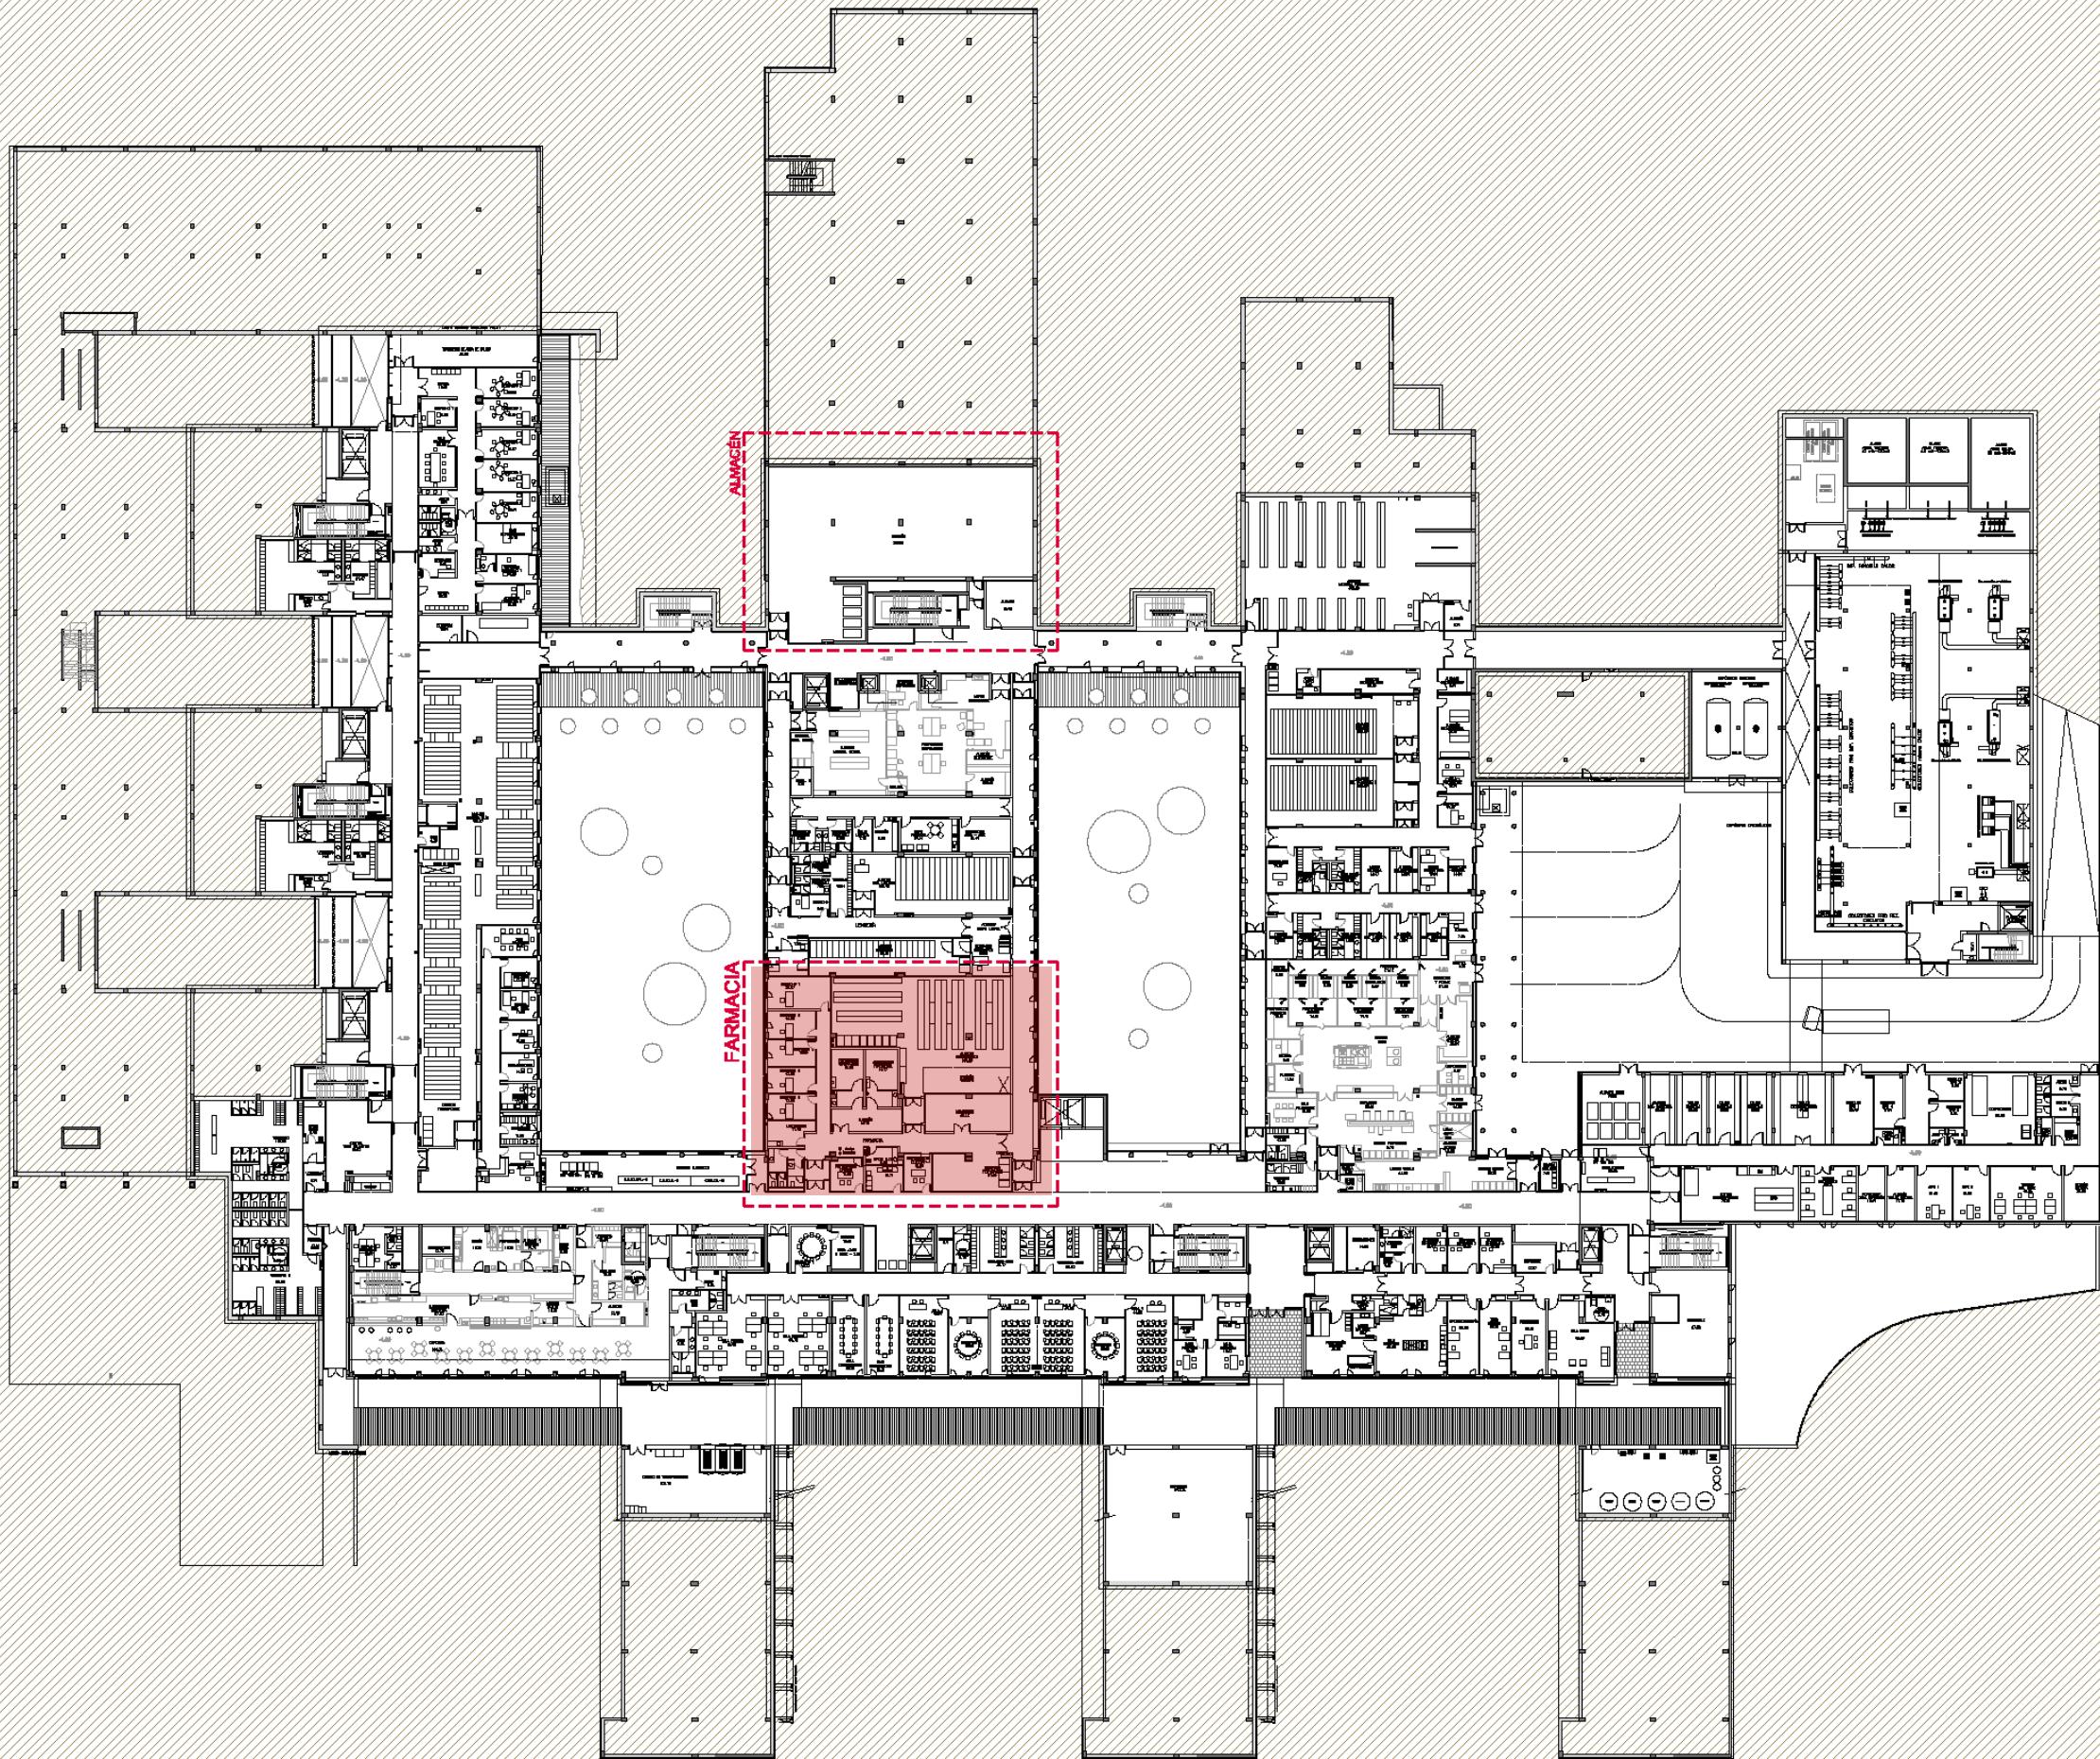


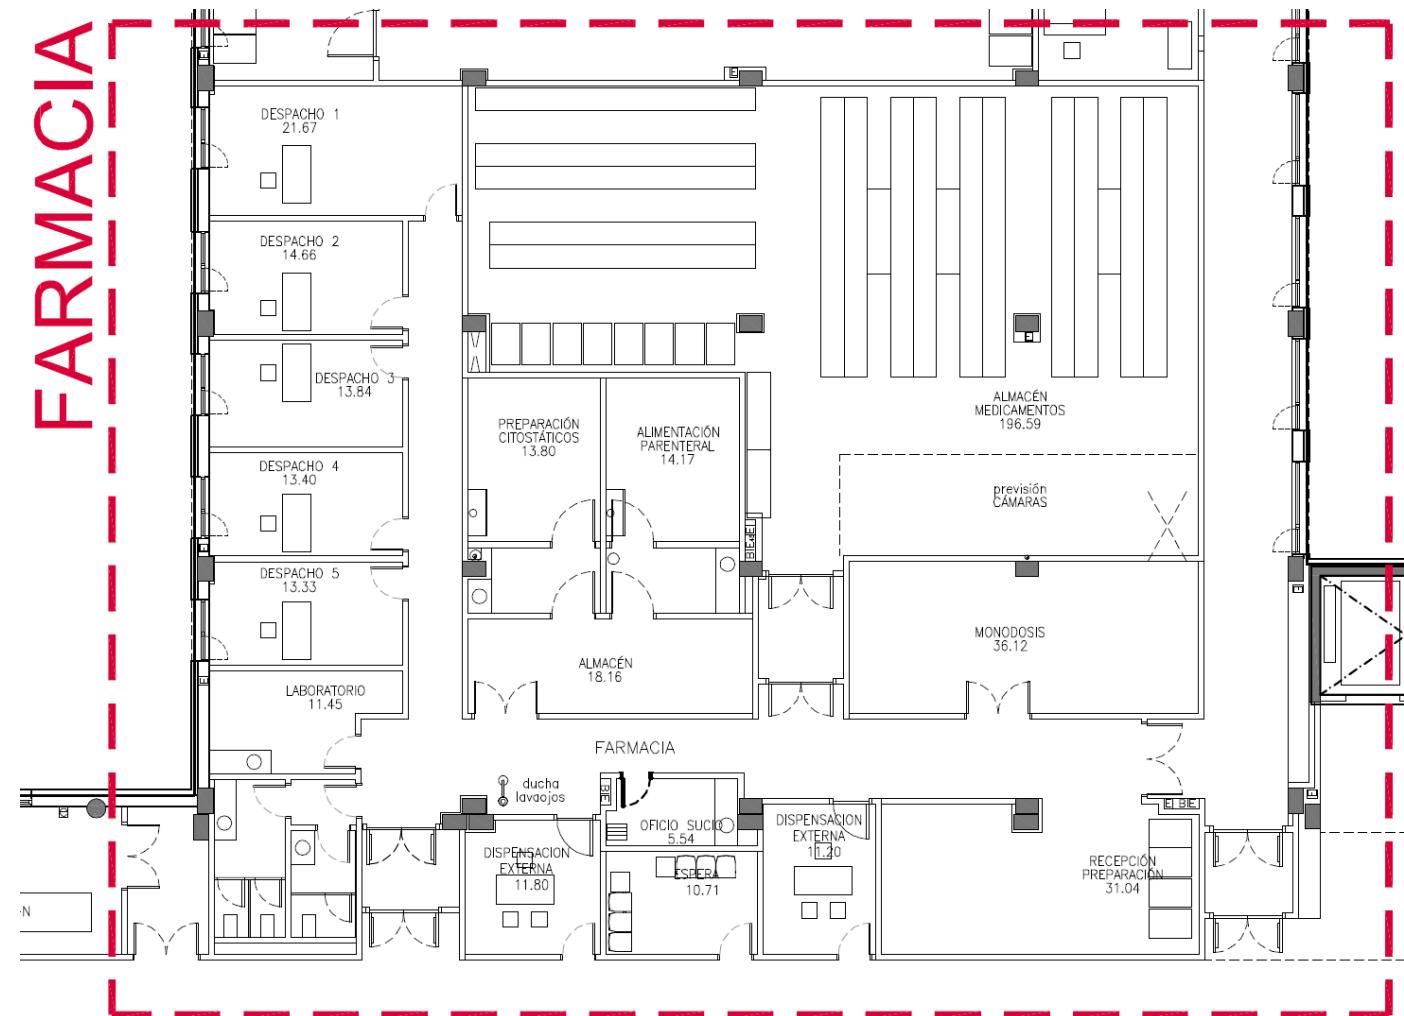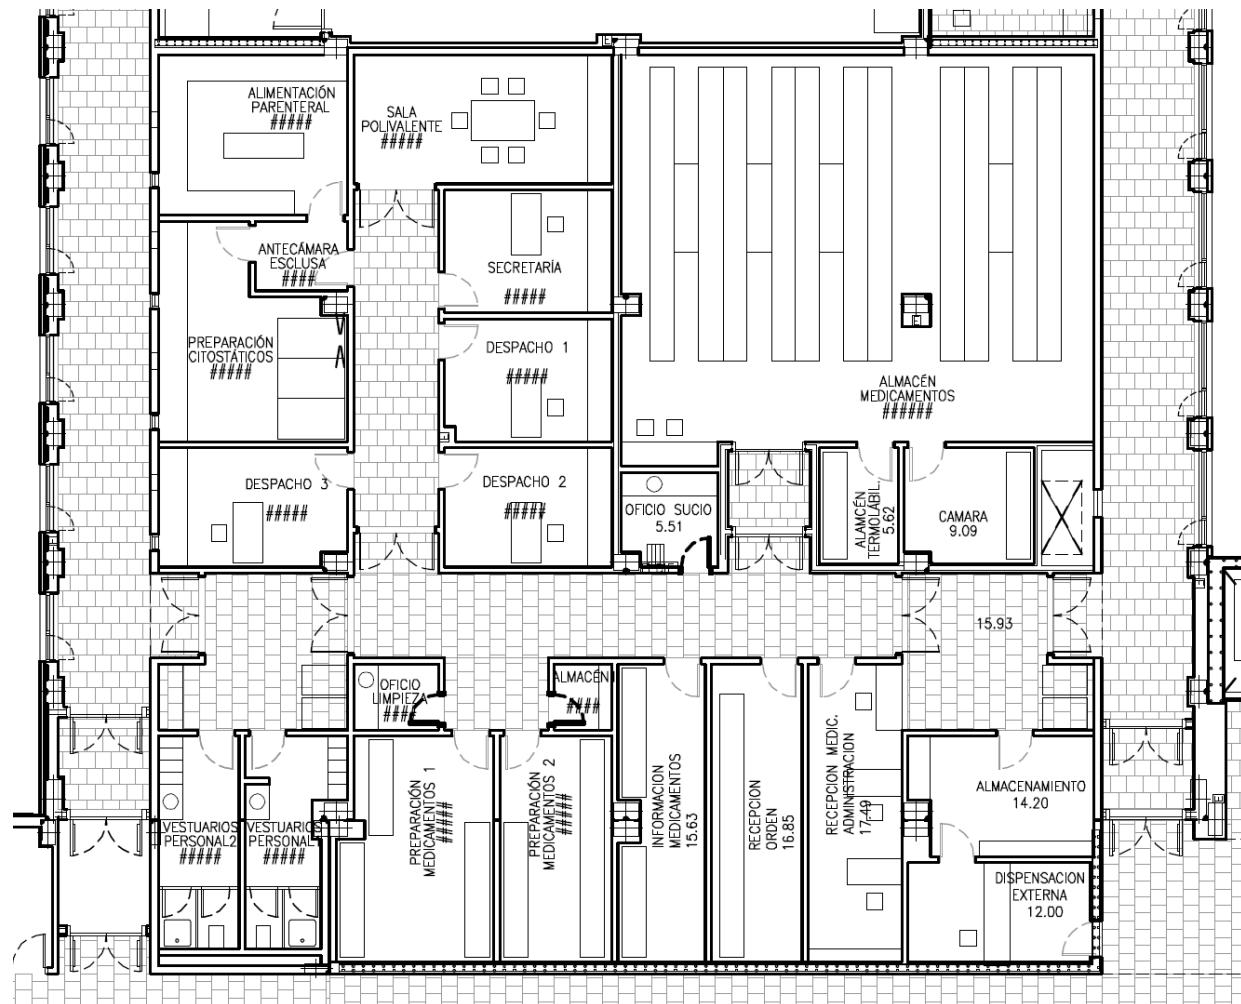


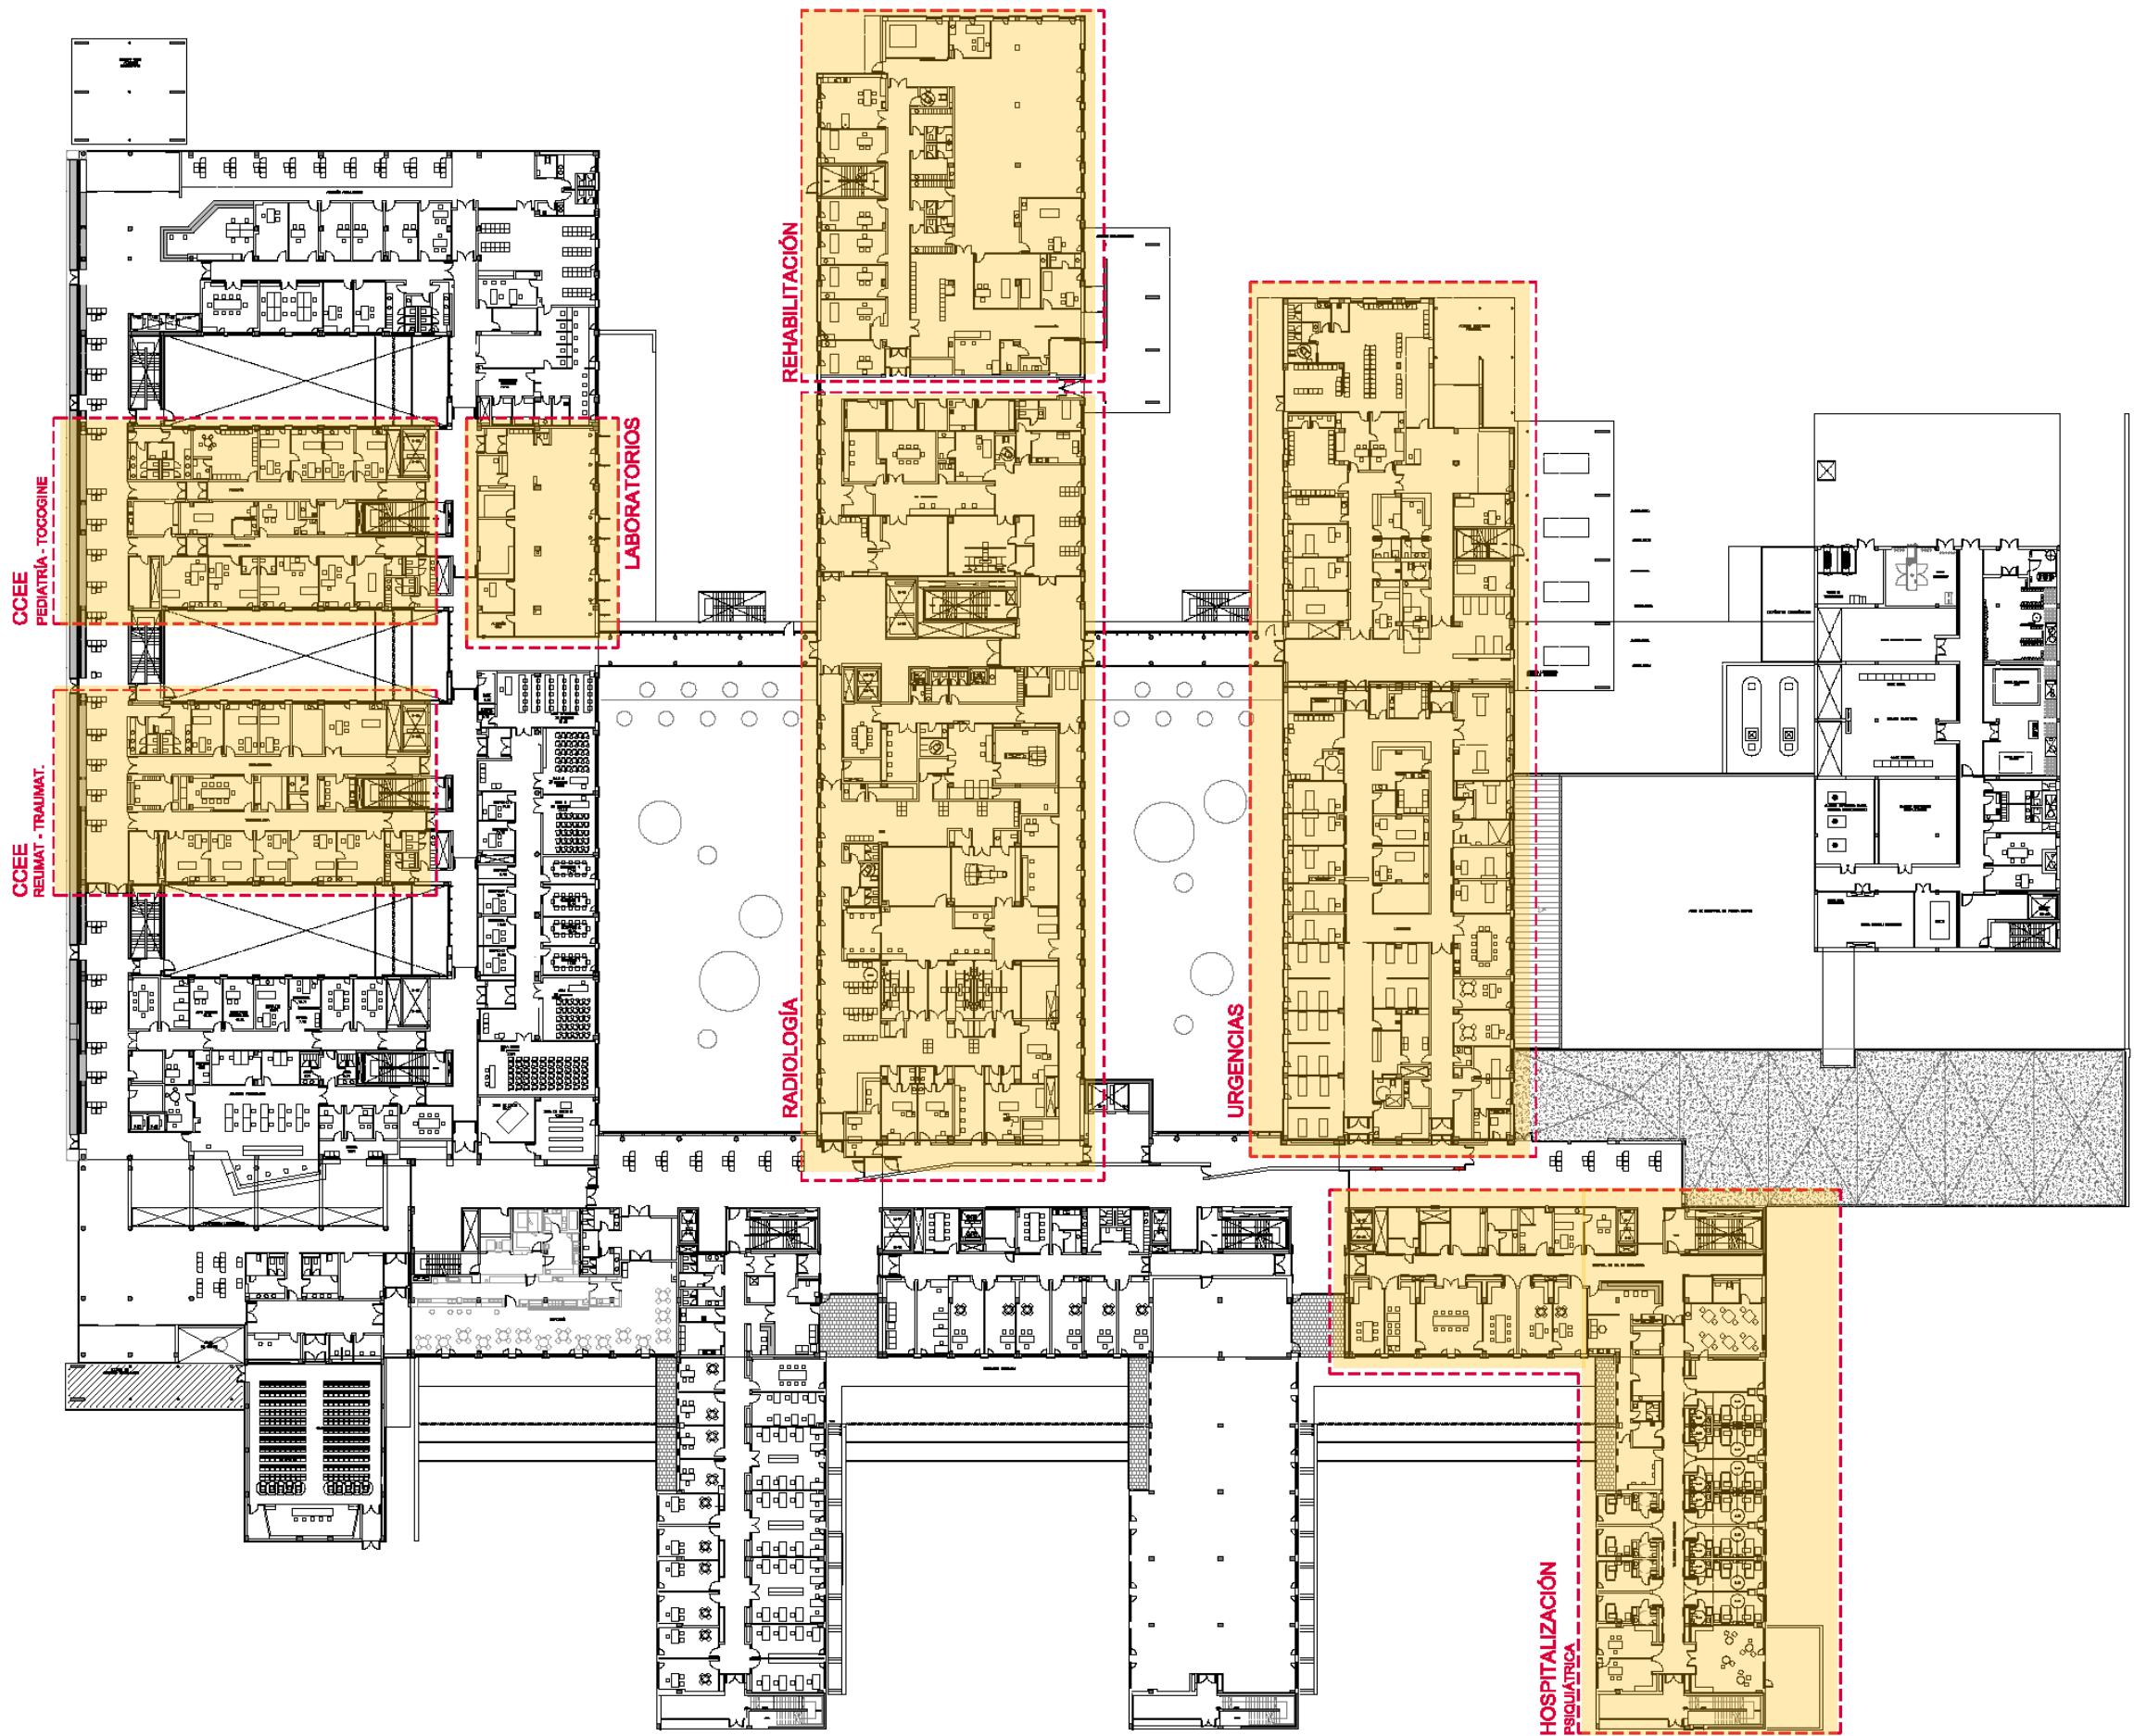

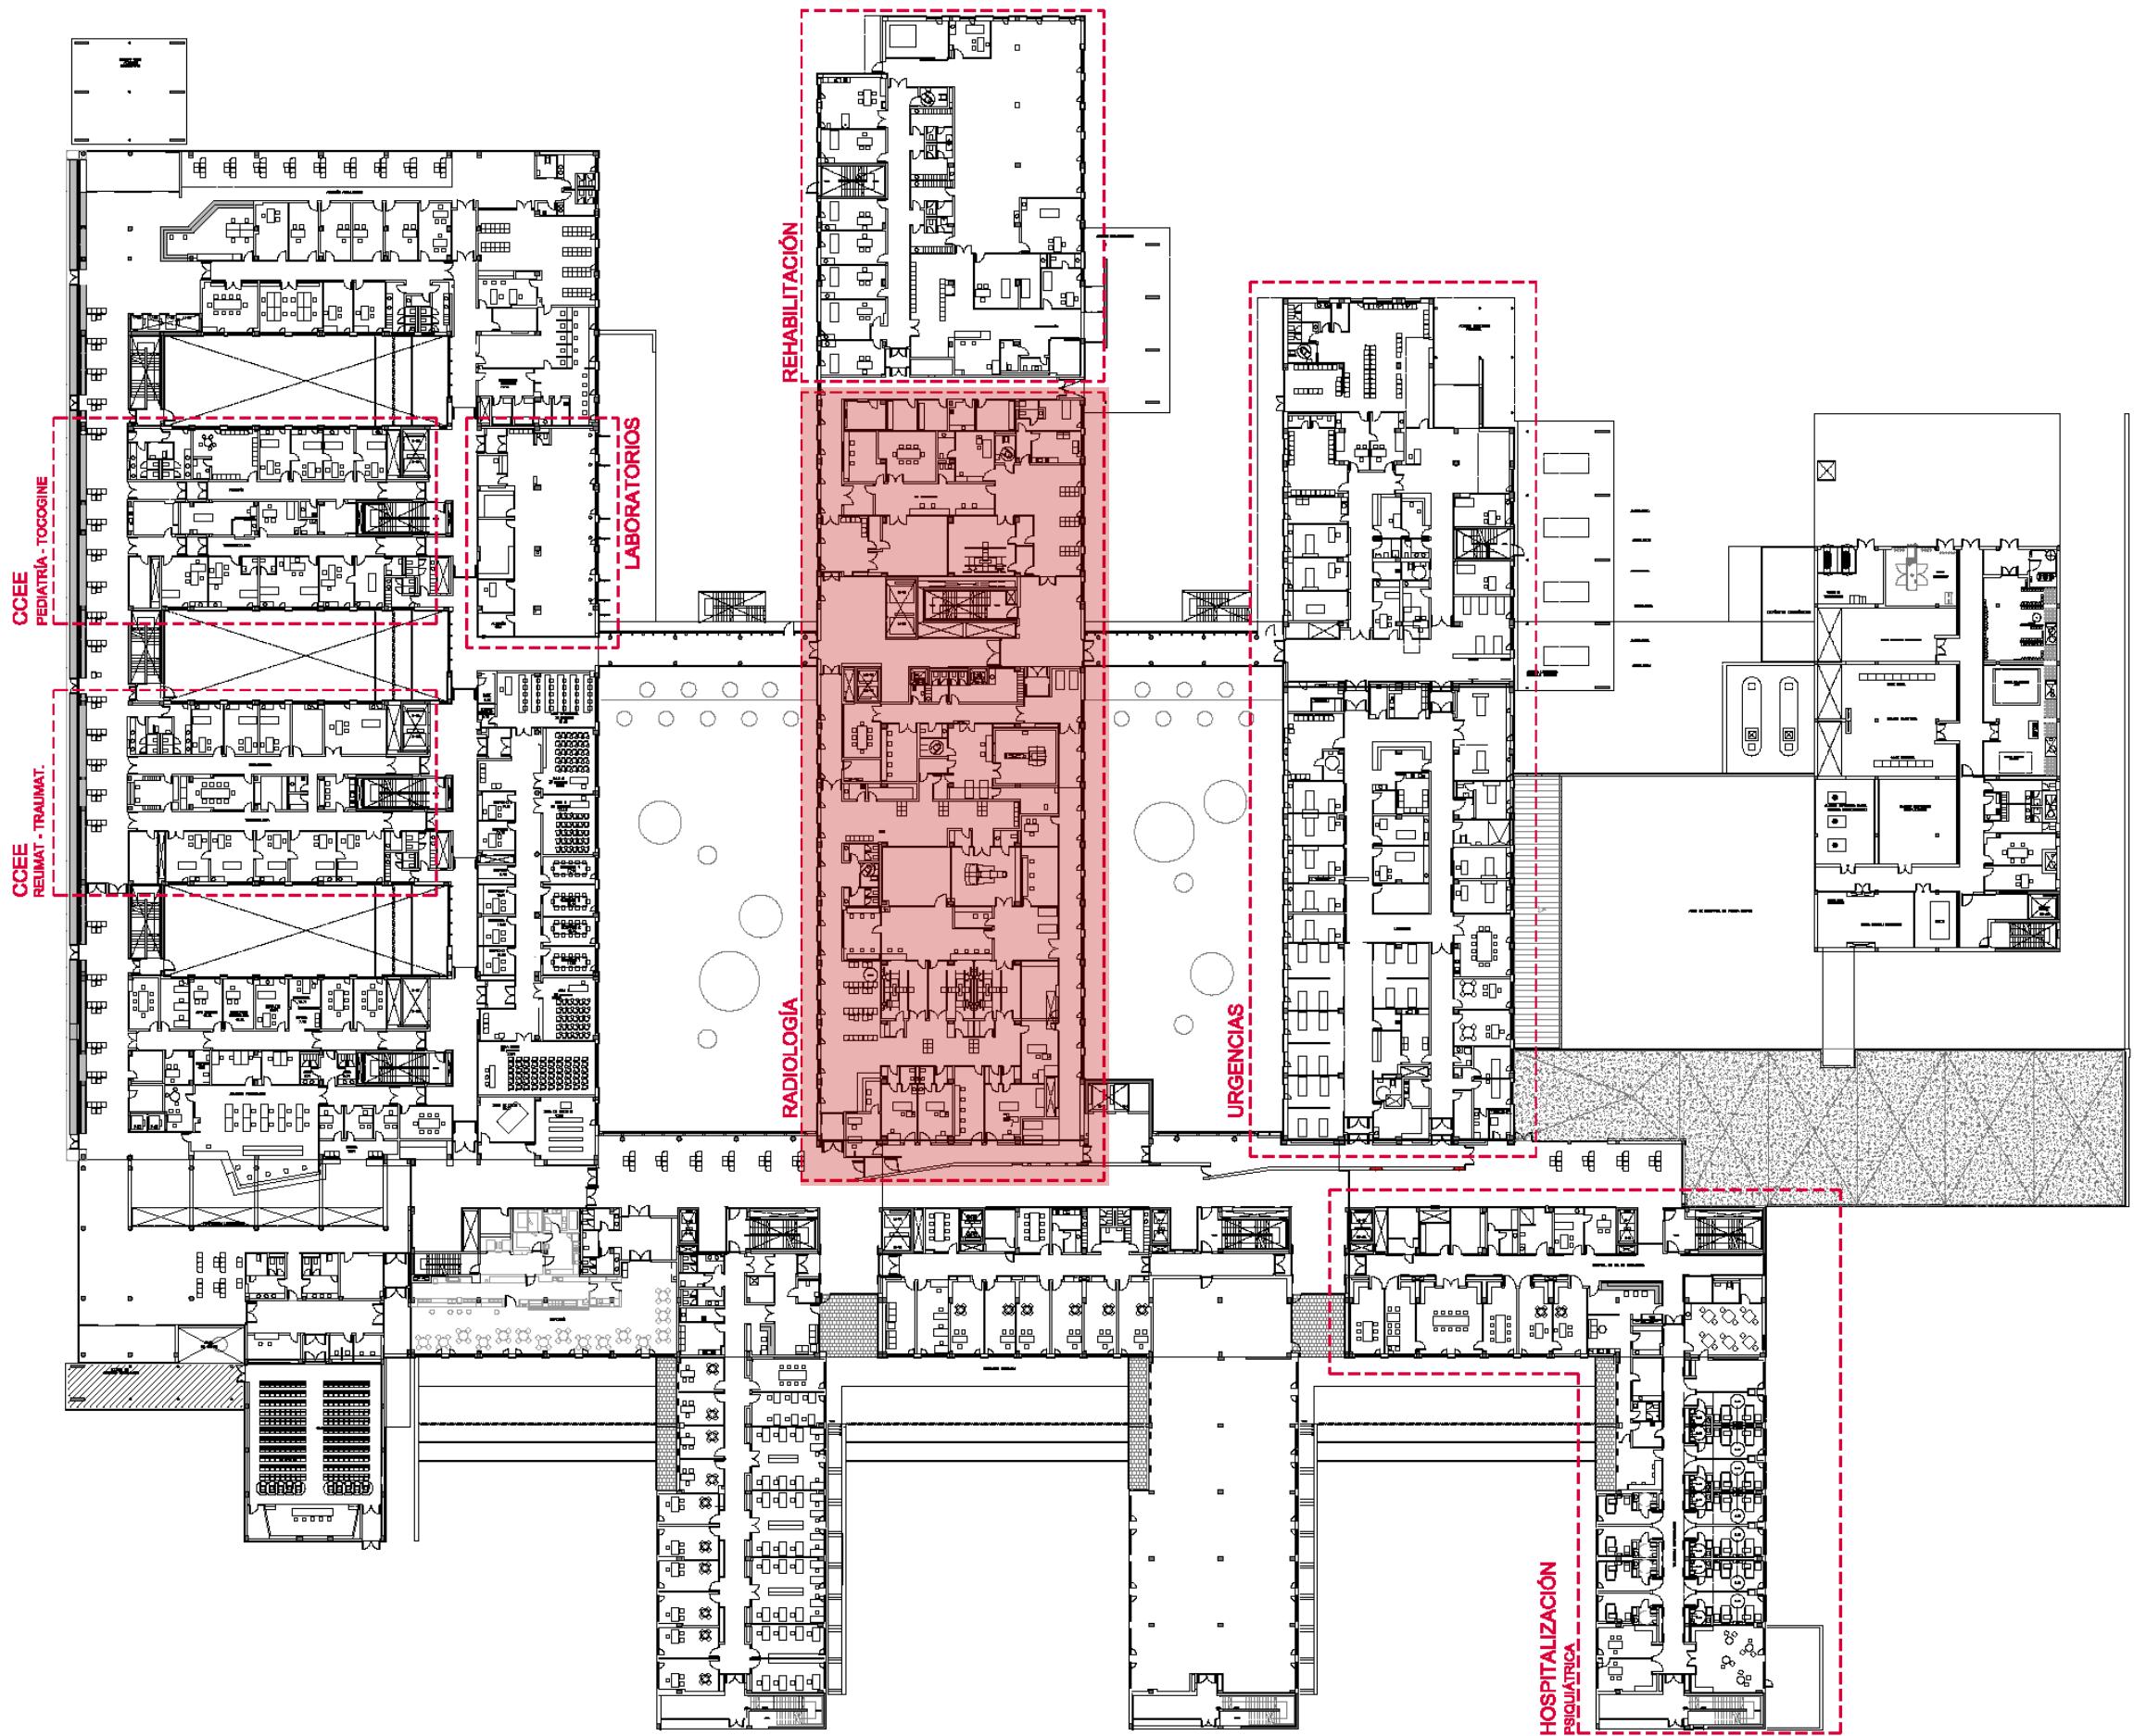


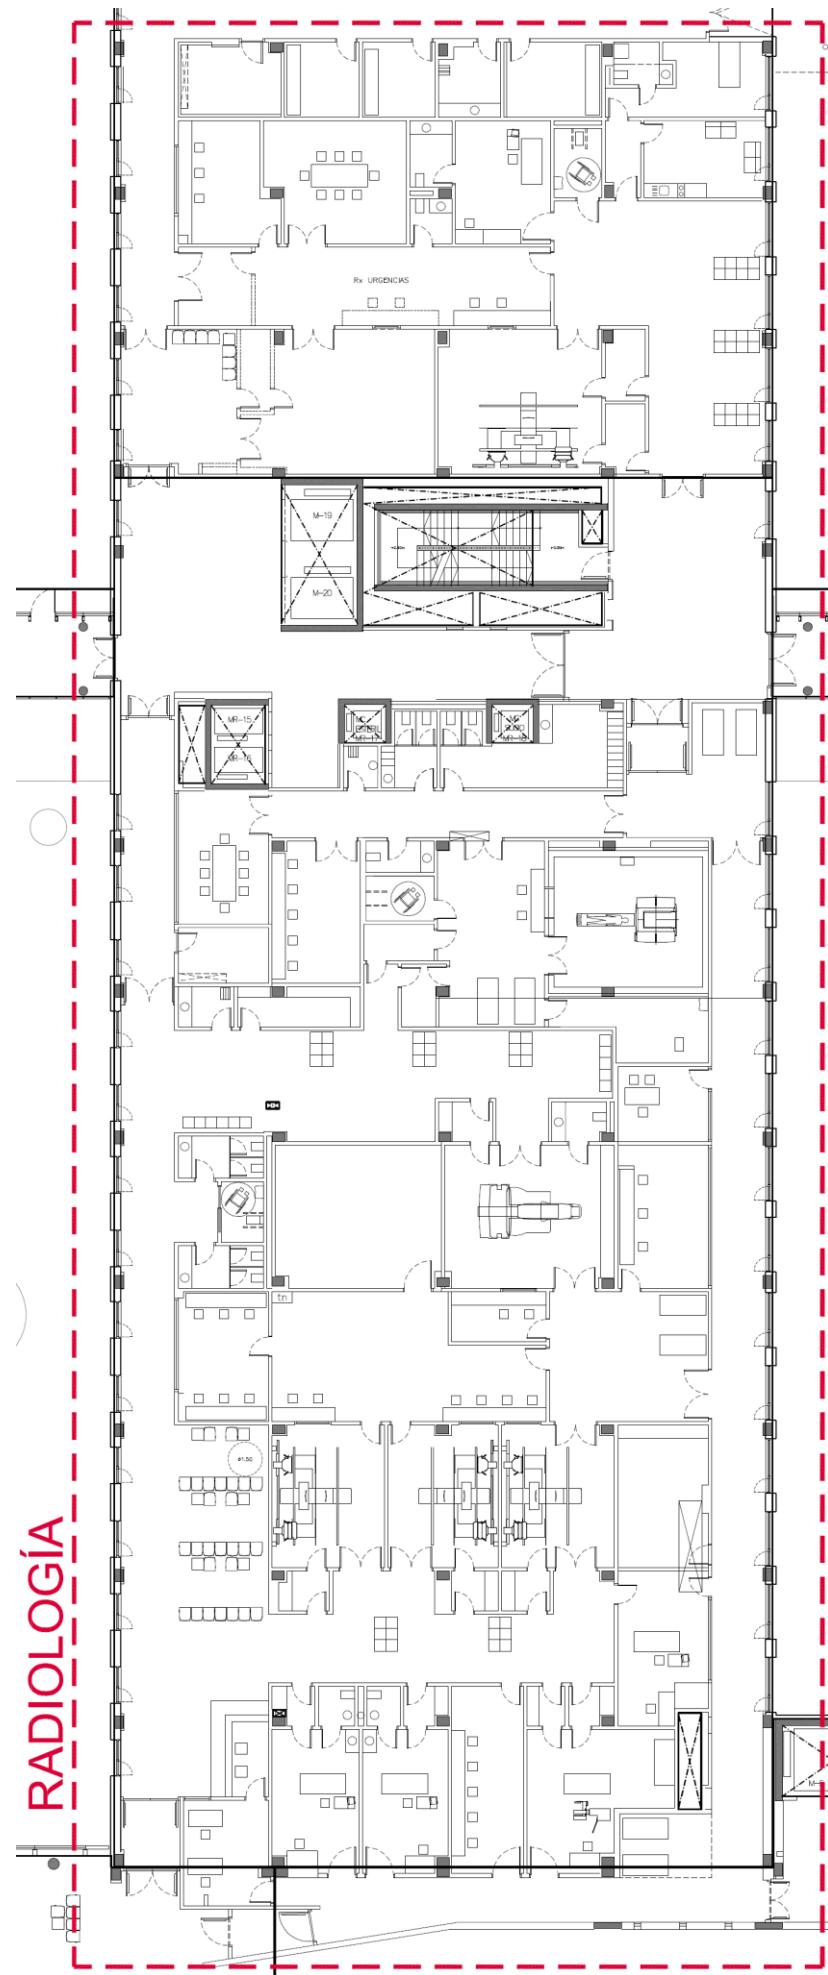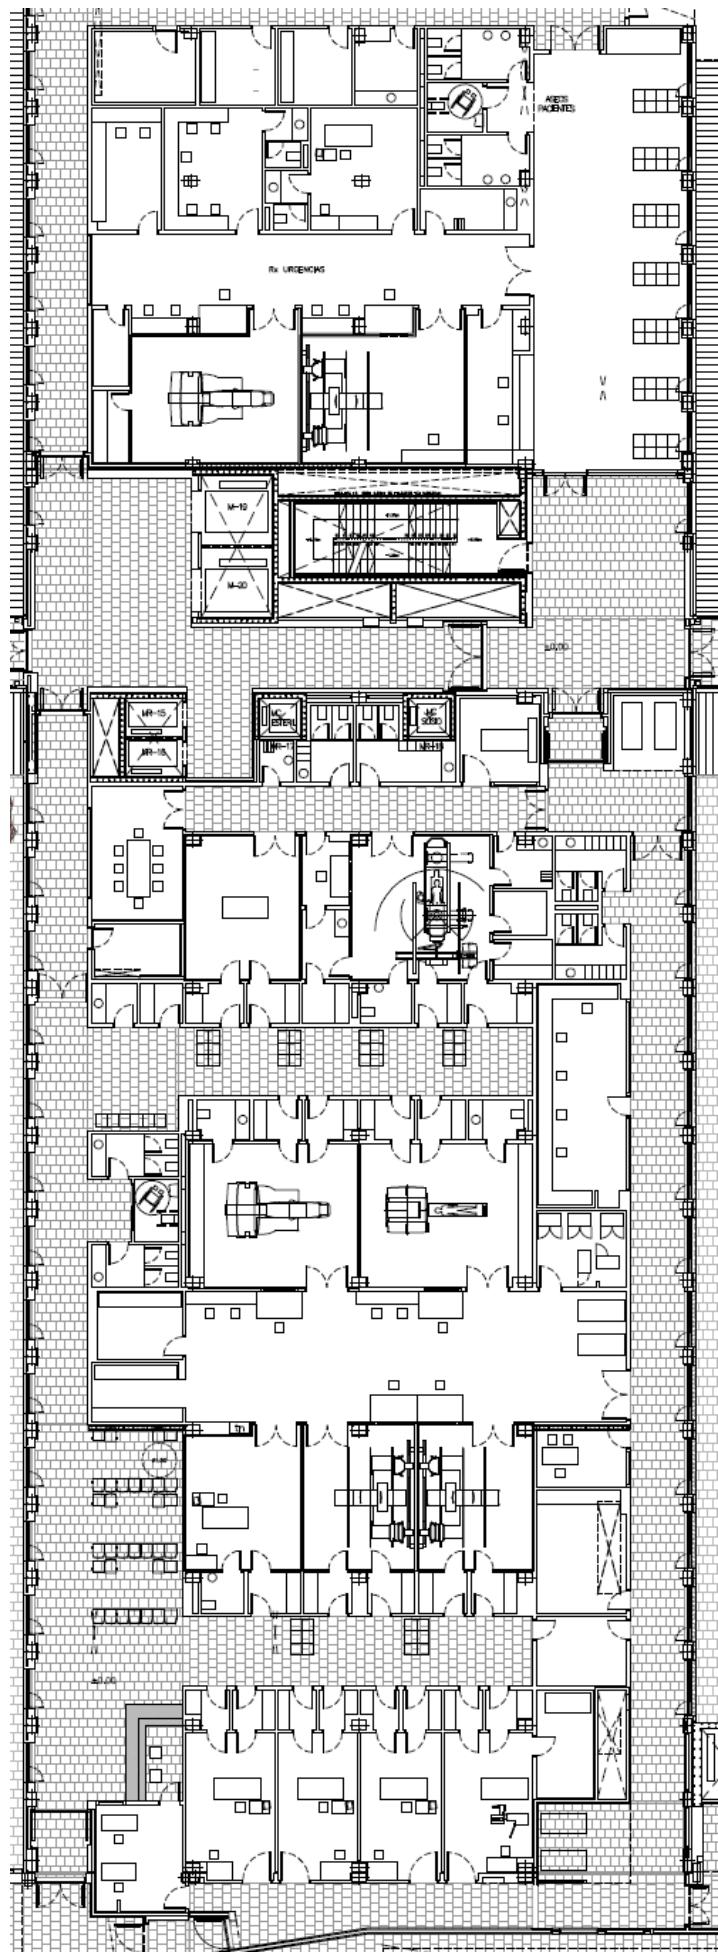


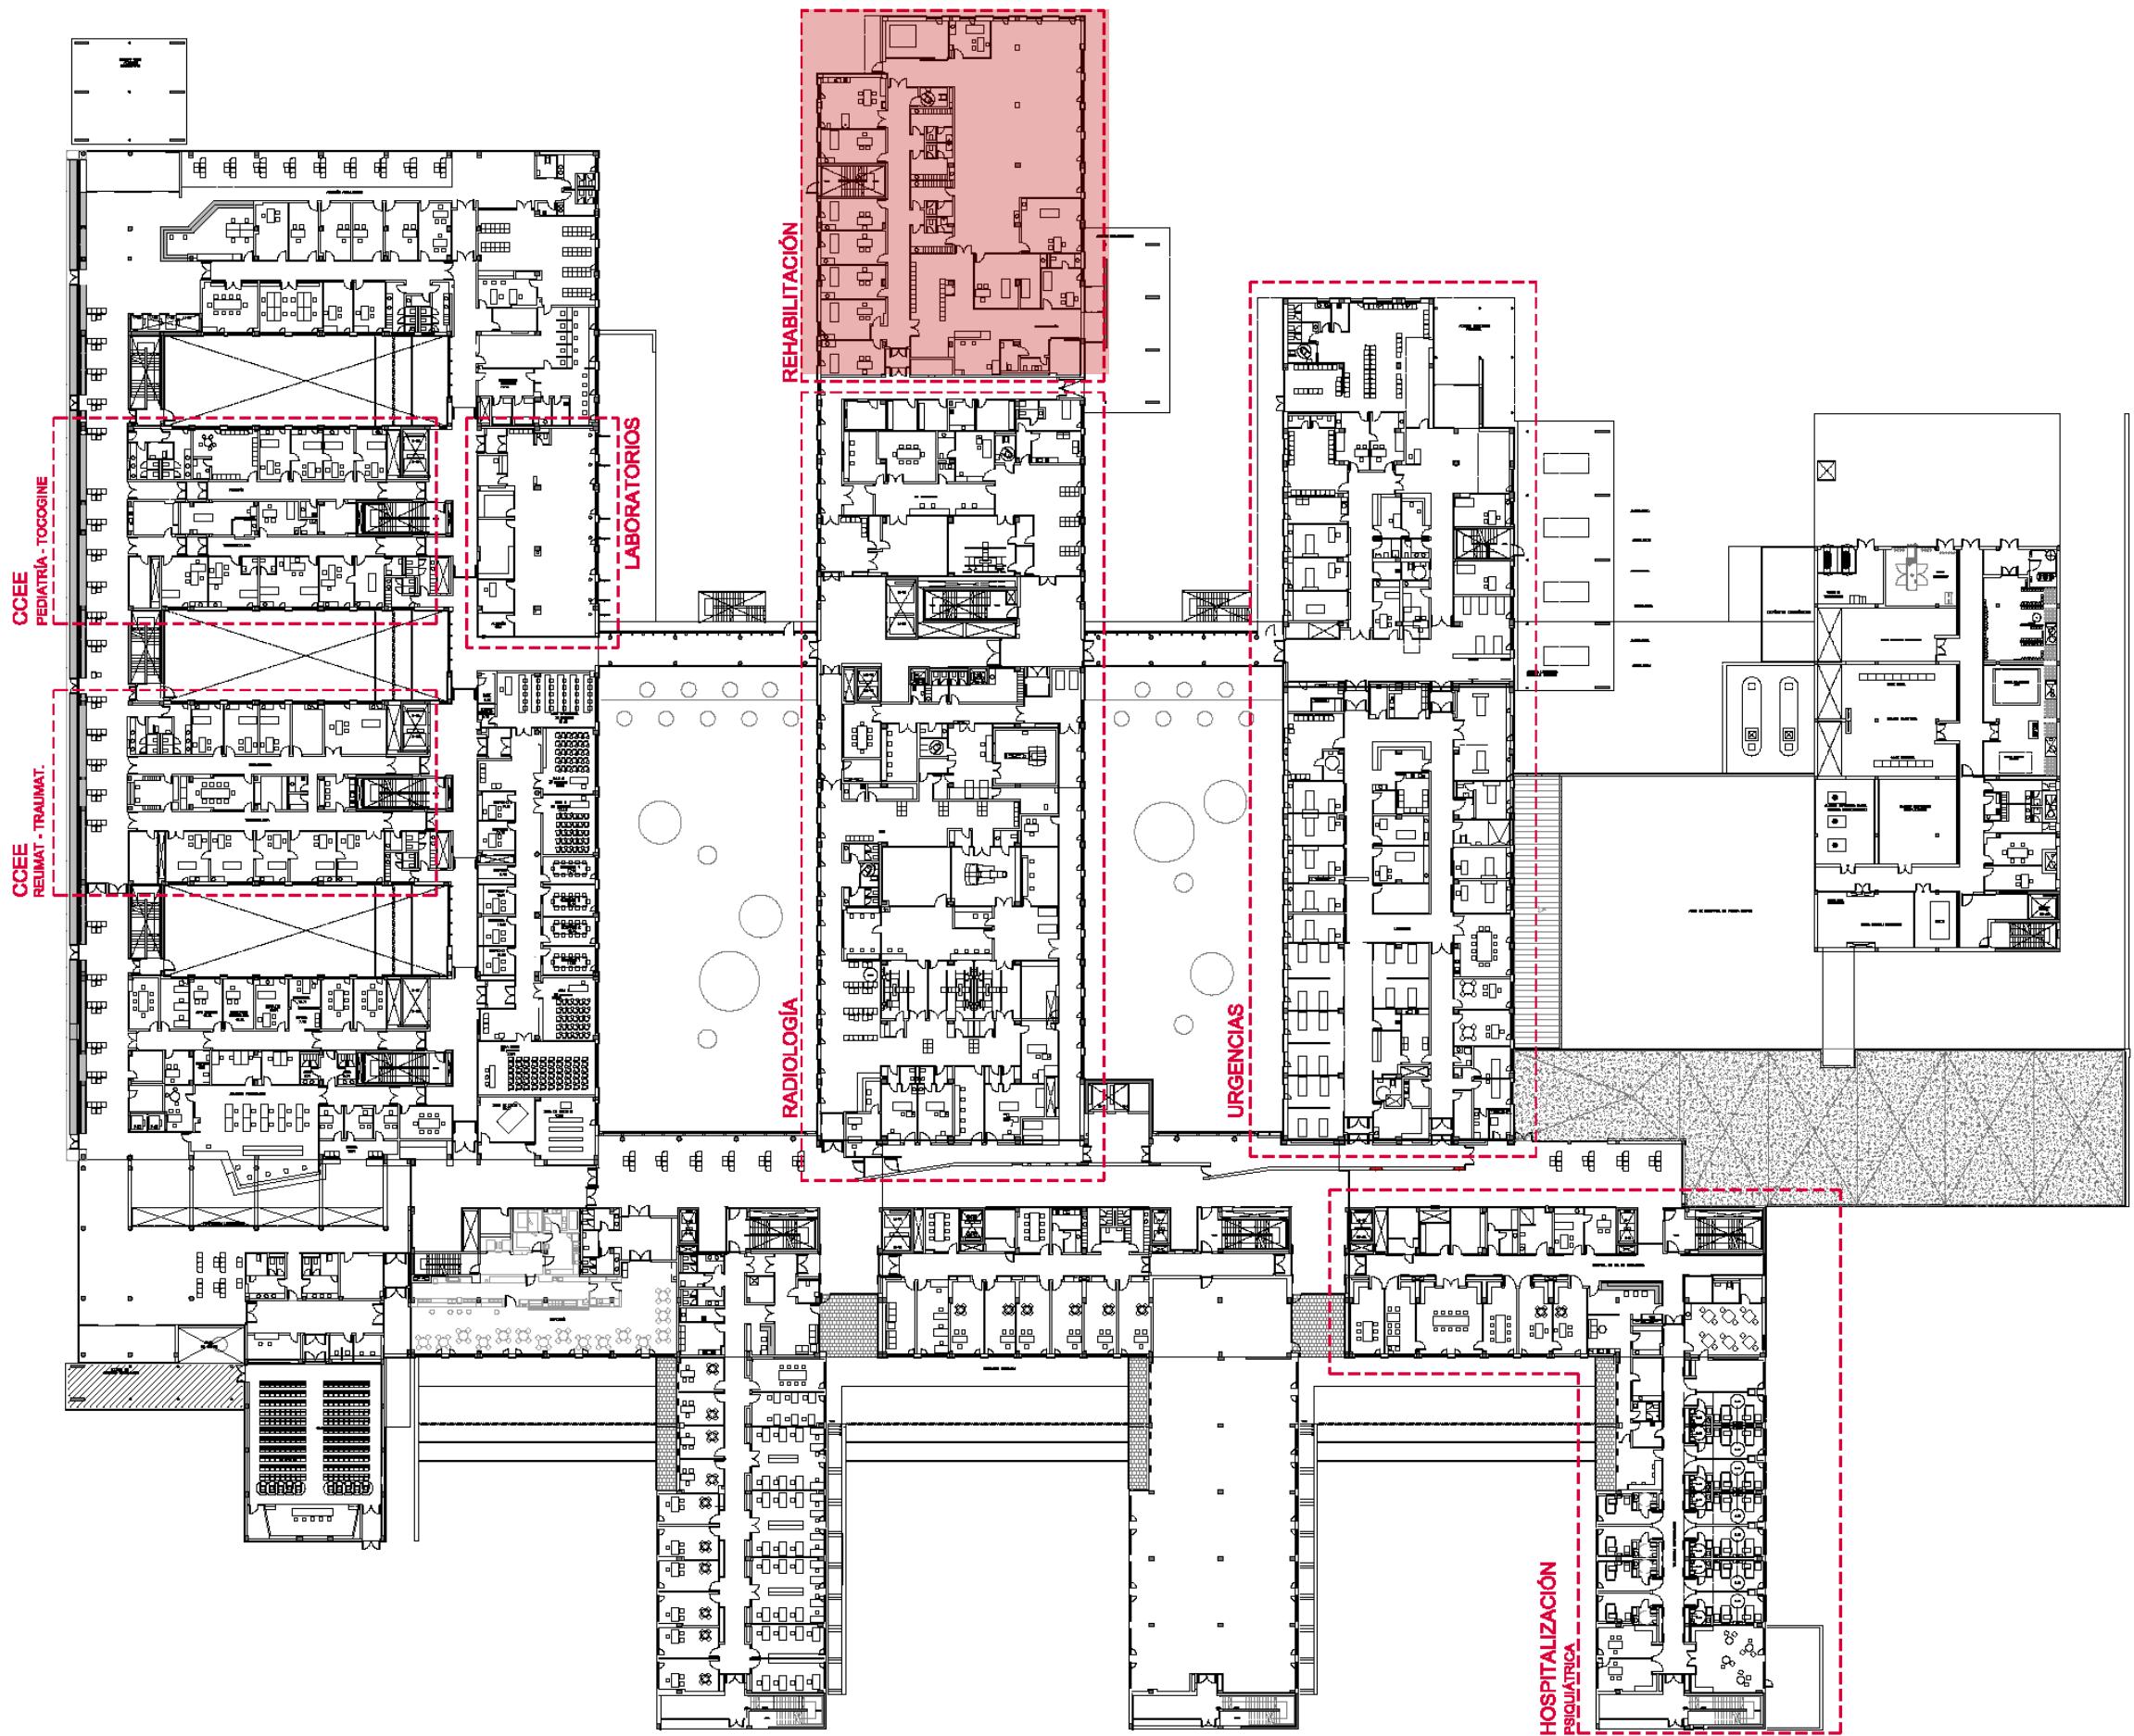


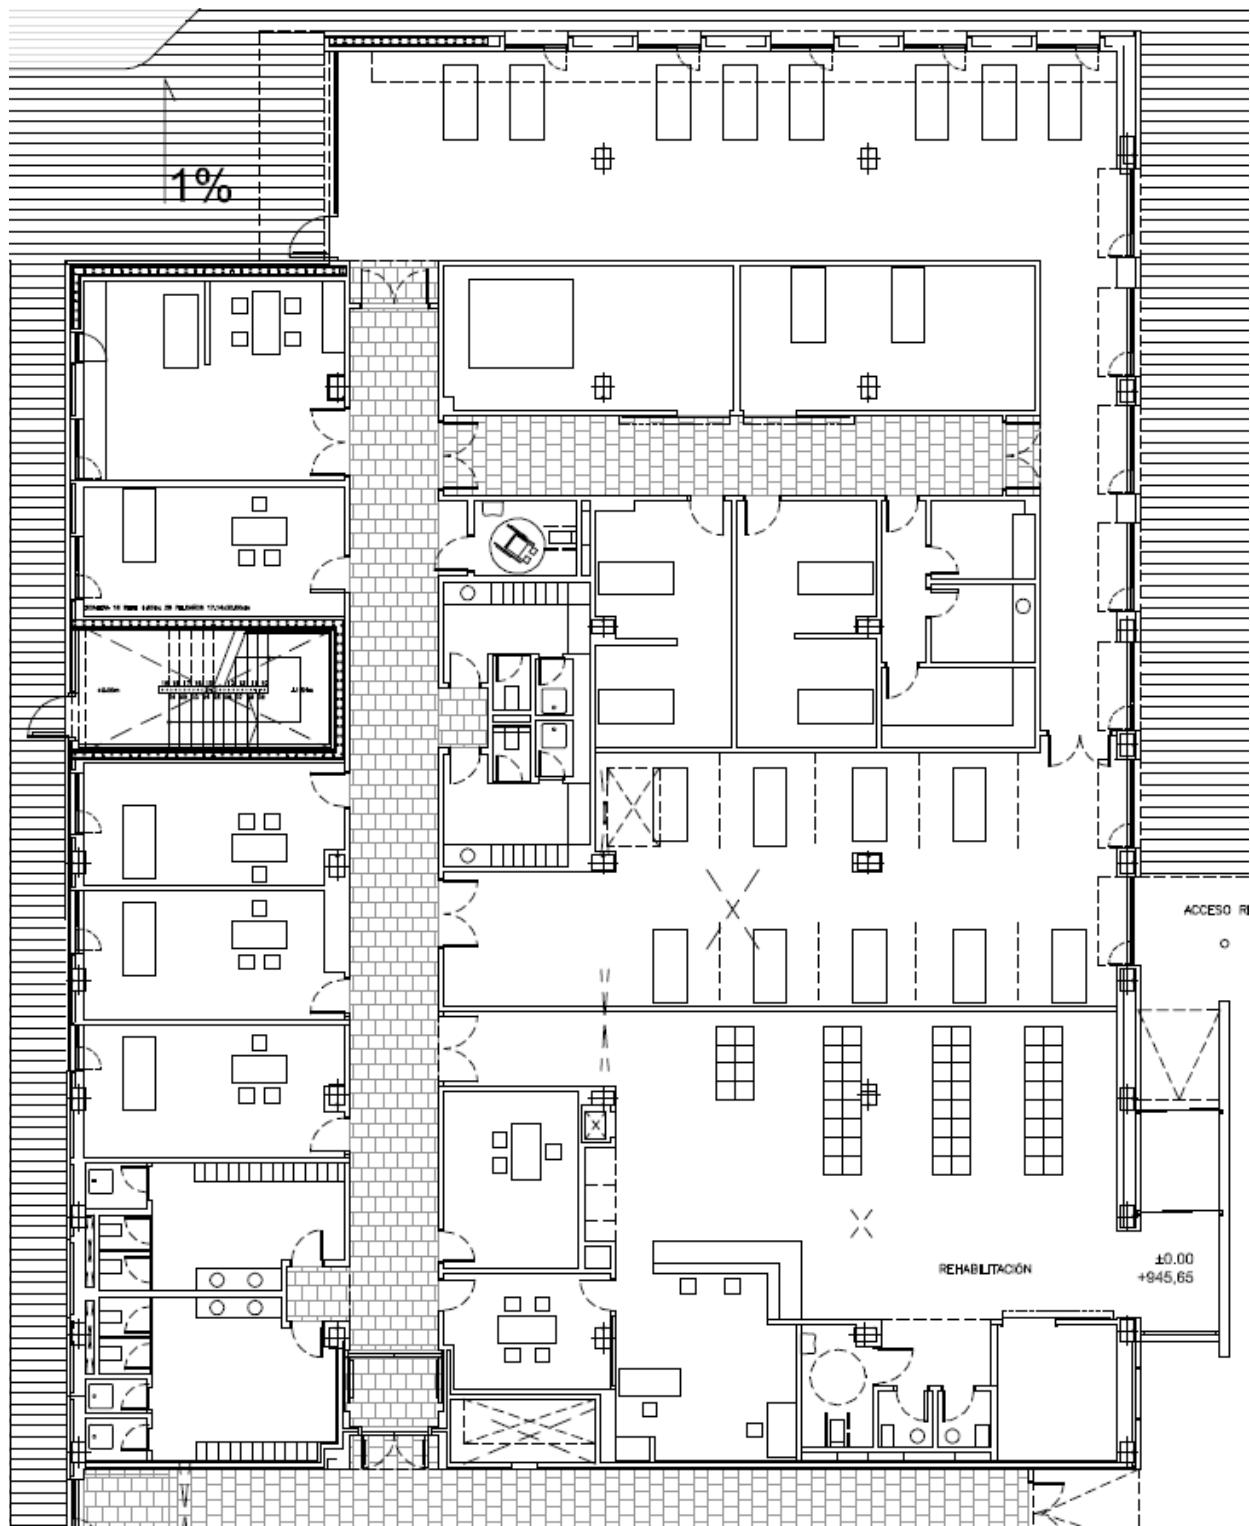


REHABILITACIÓN


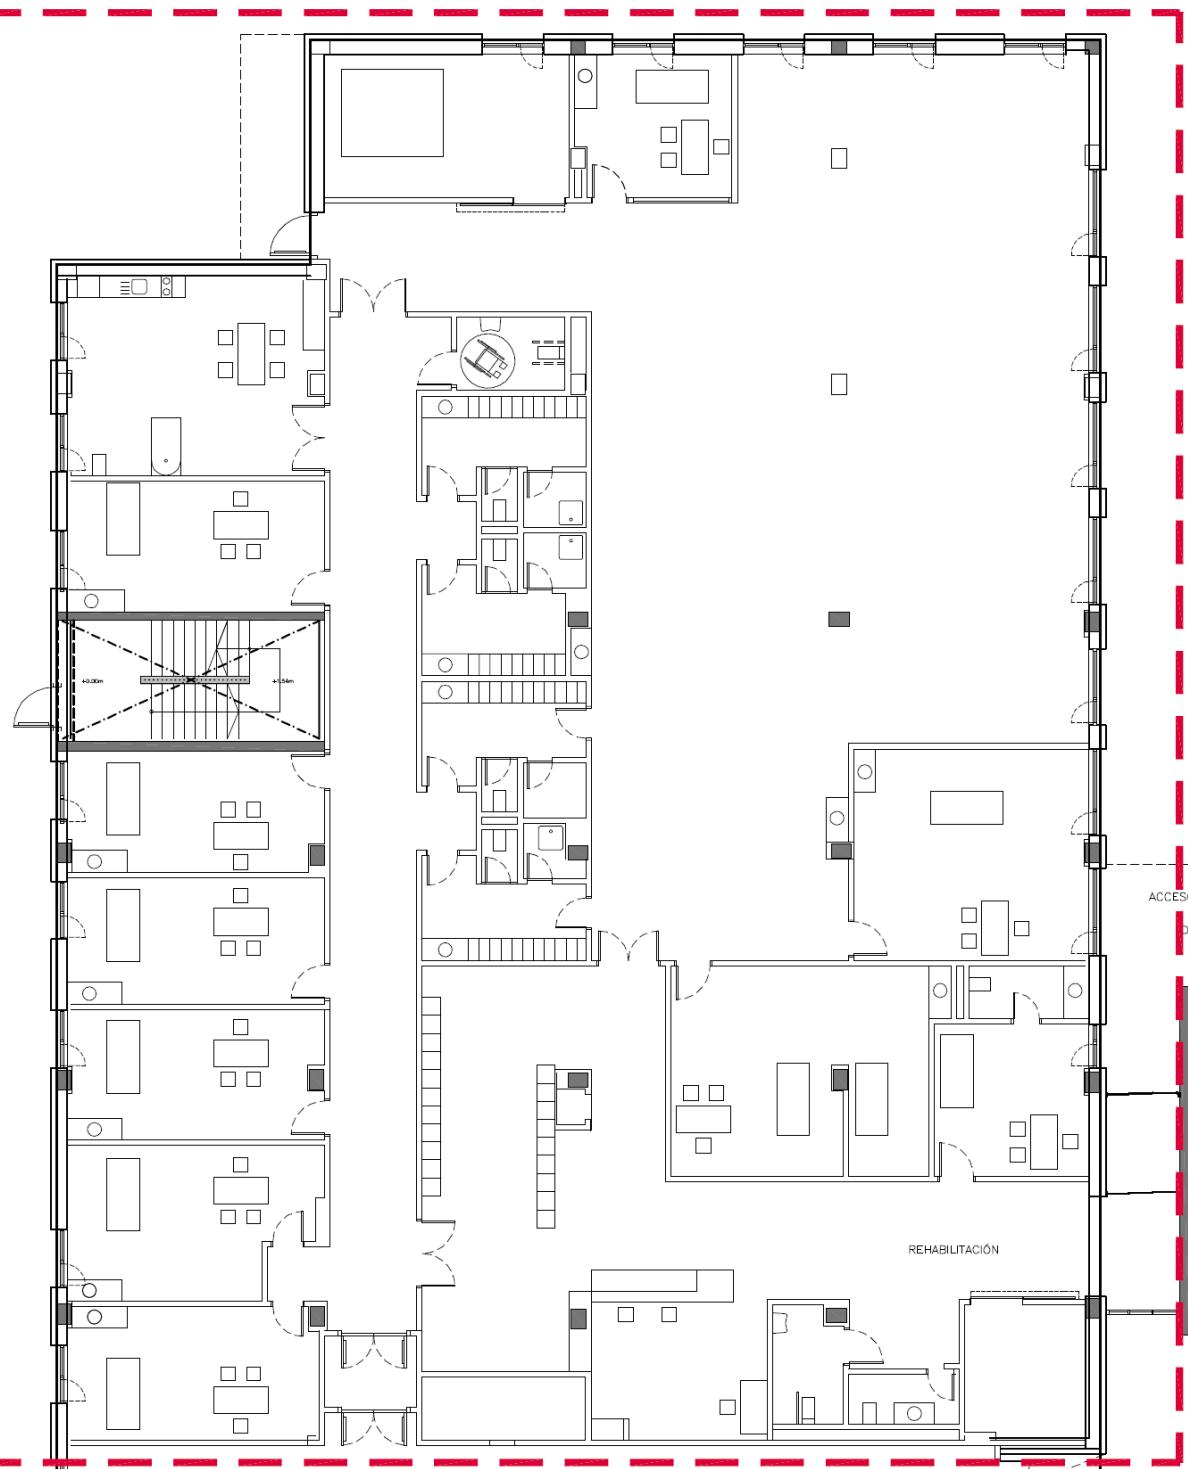


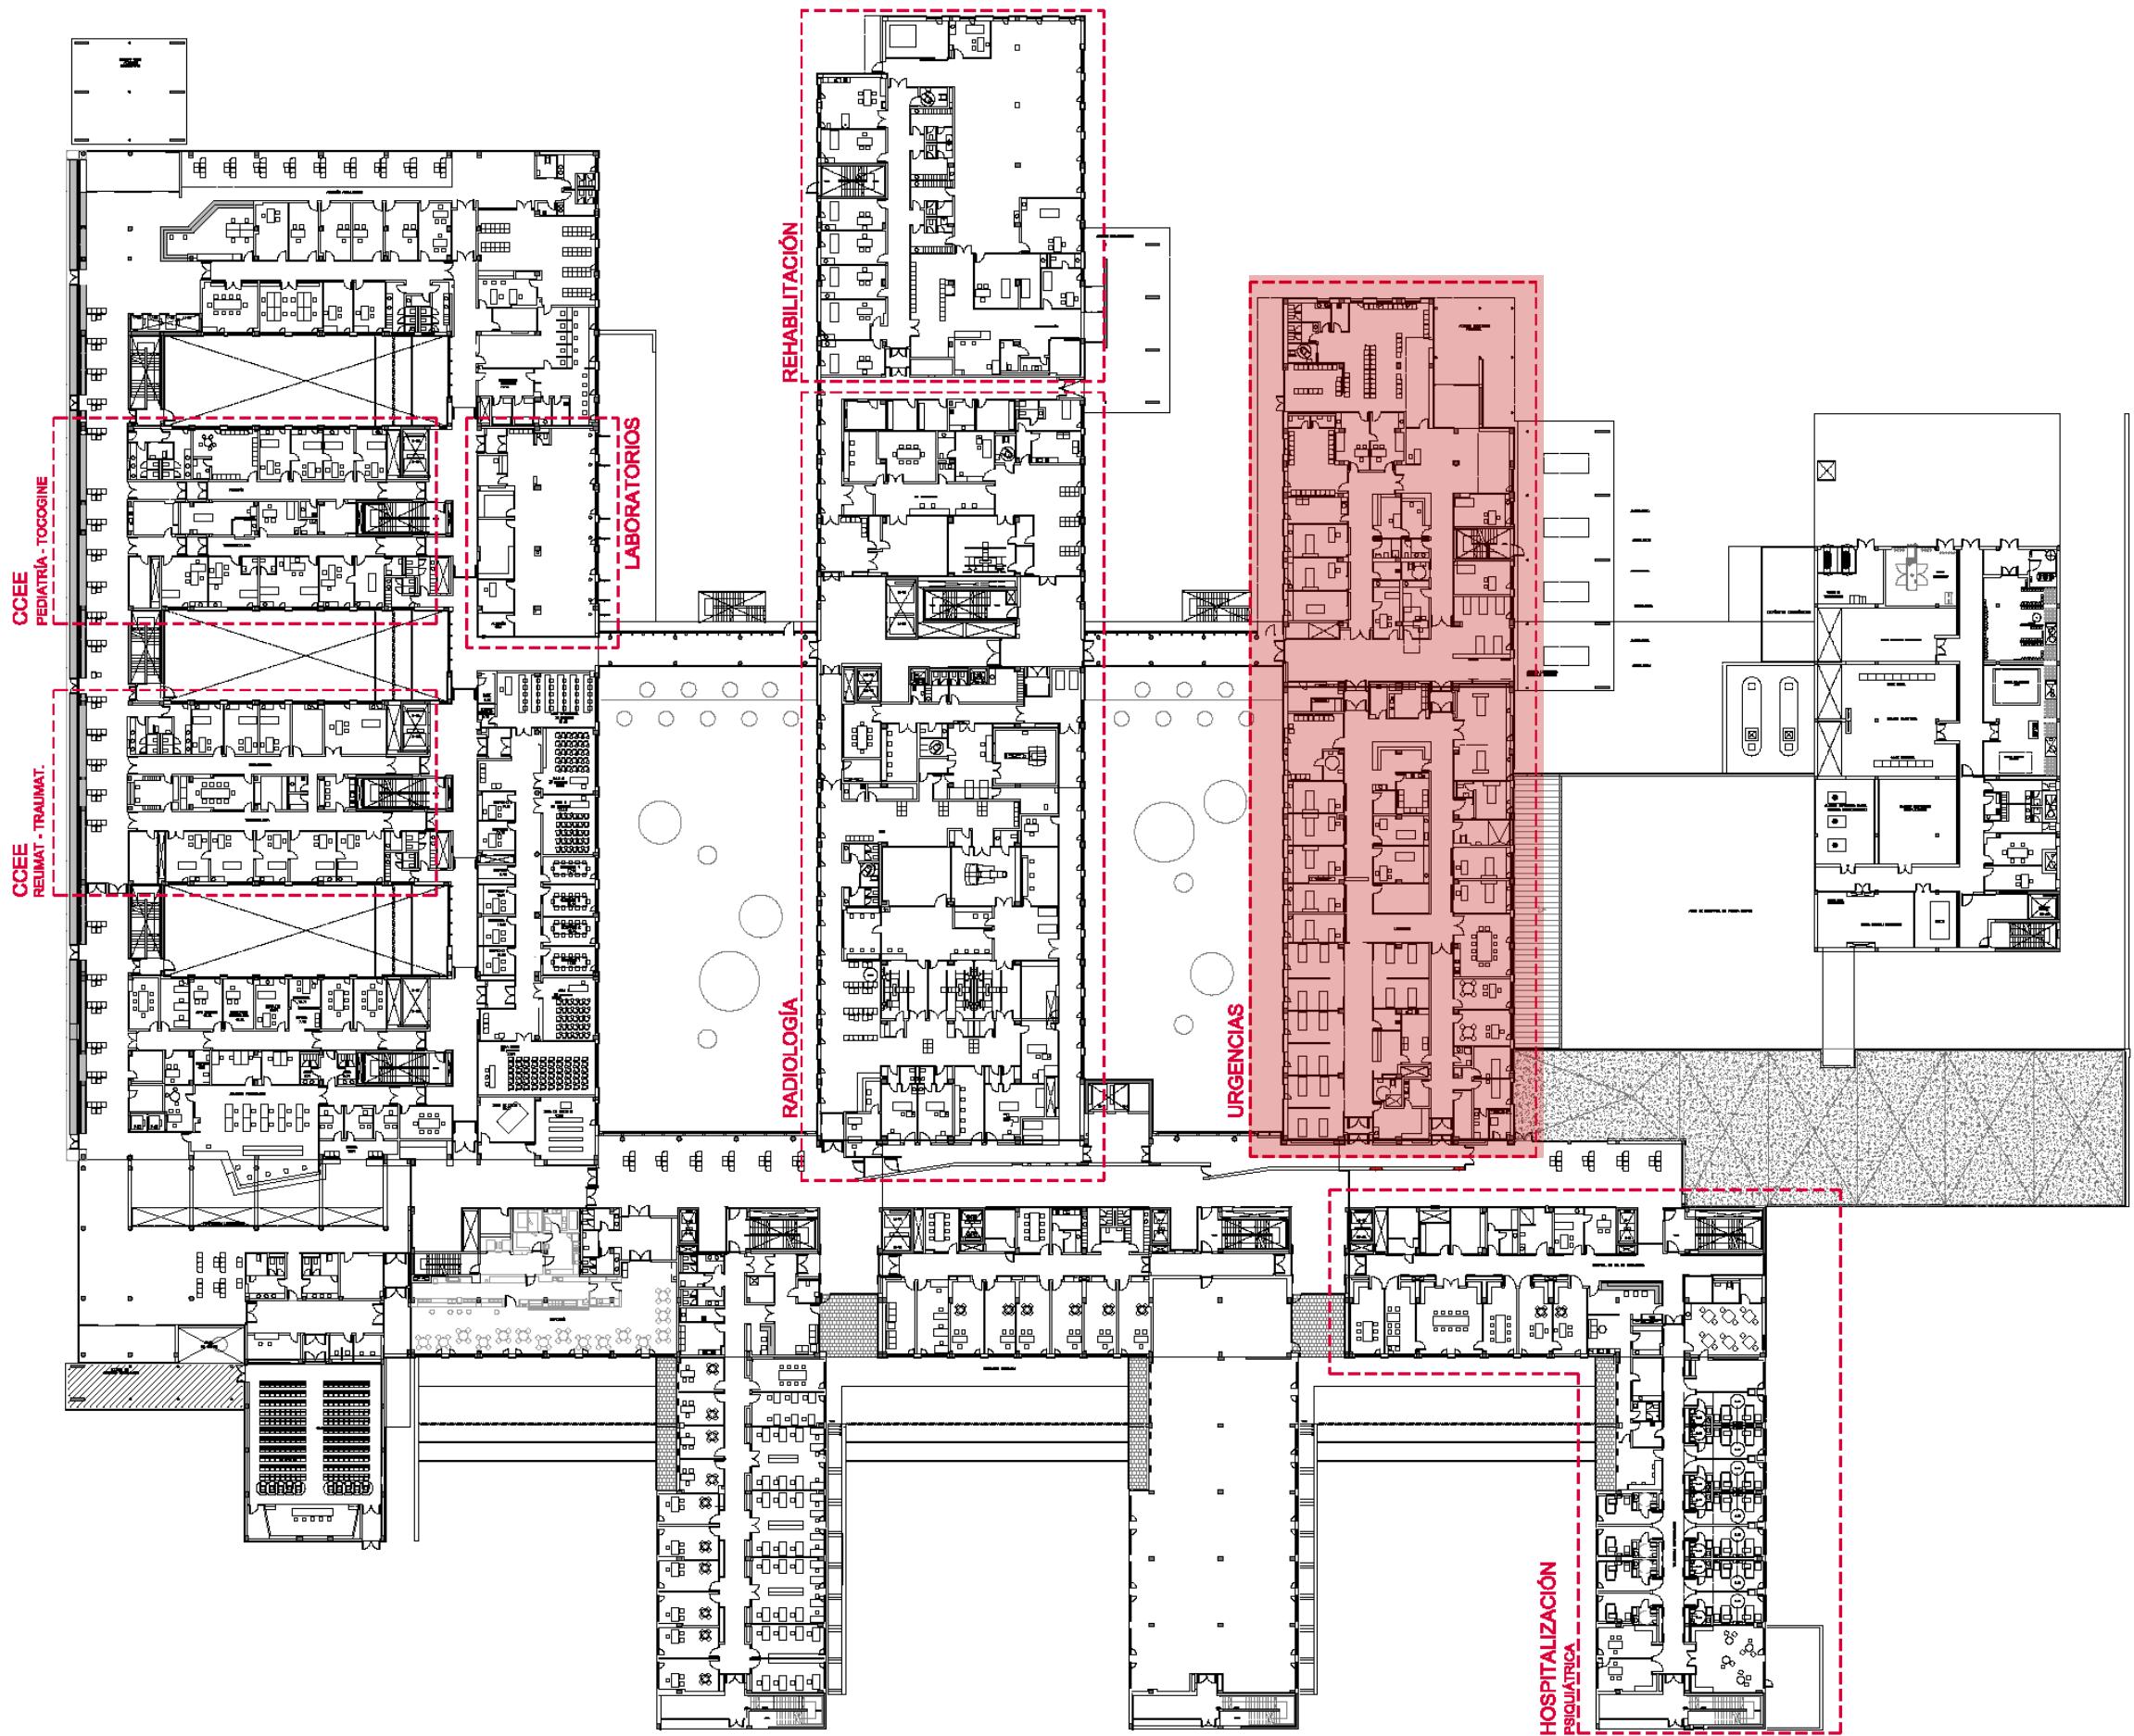


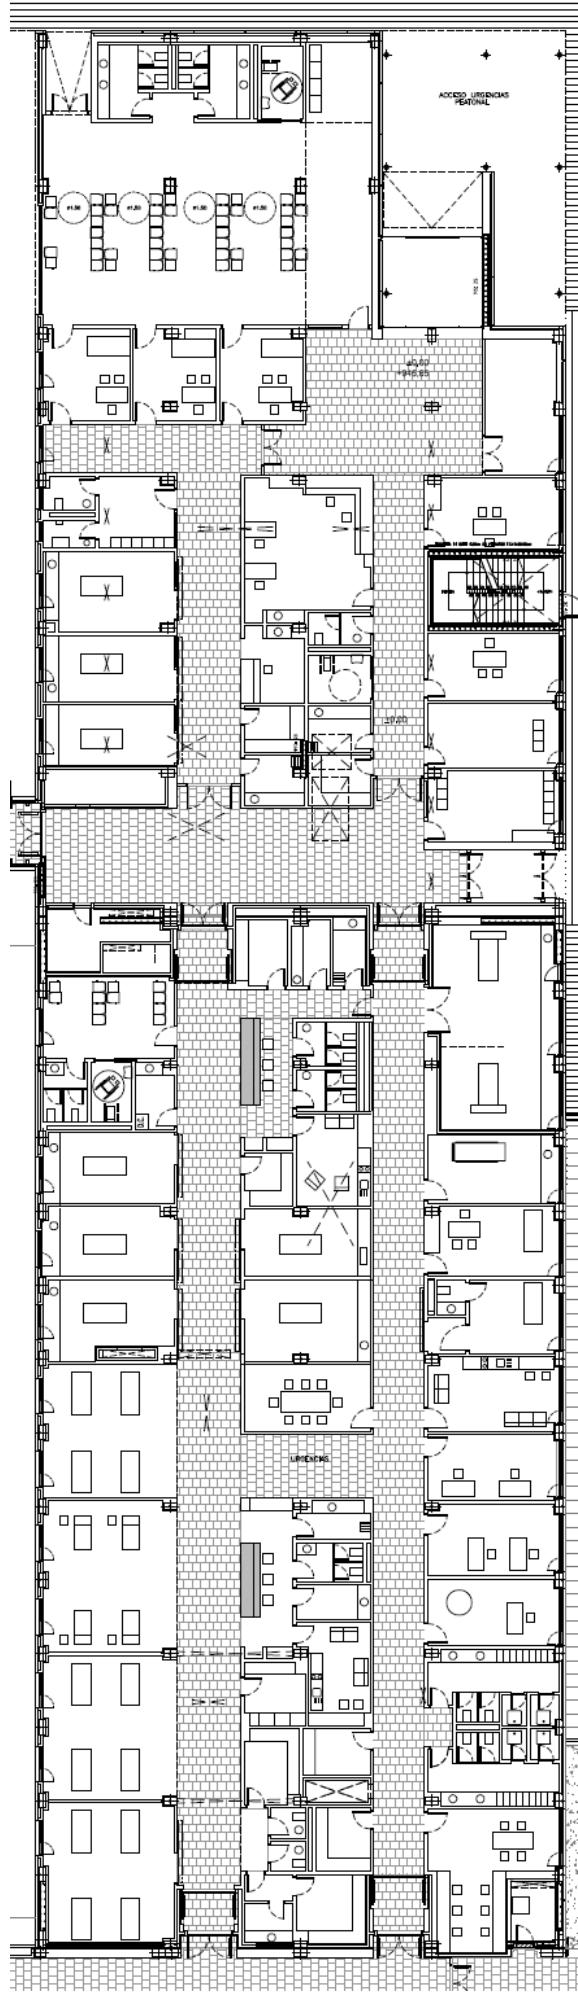


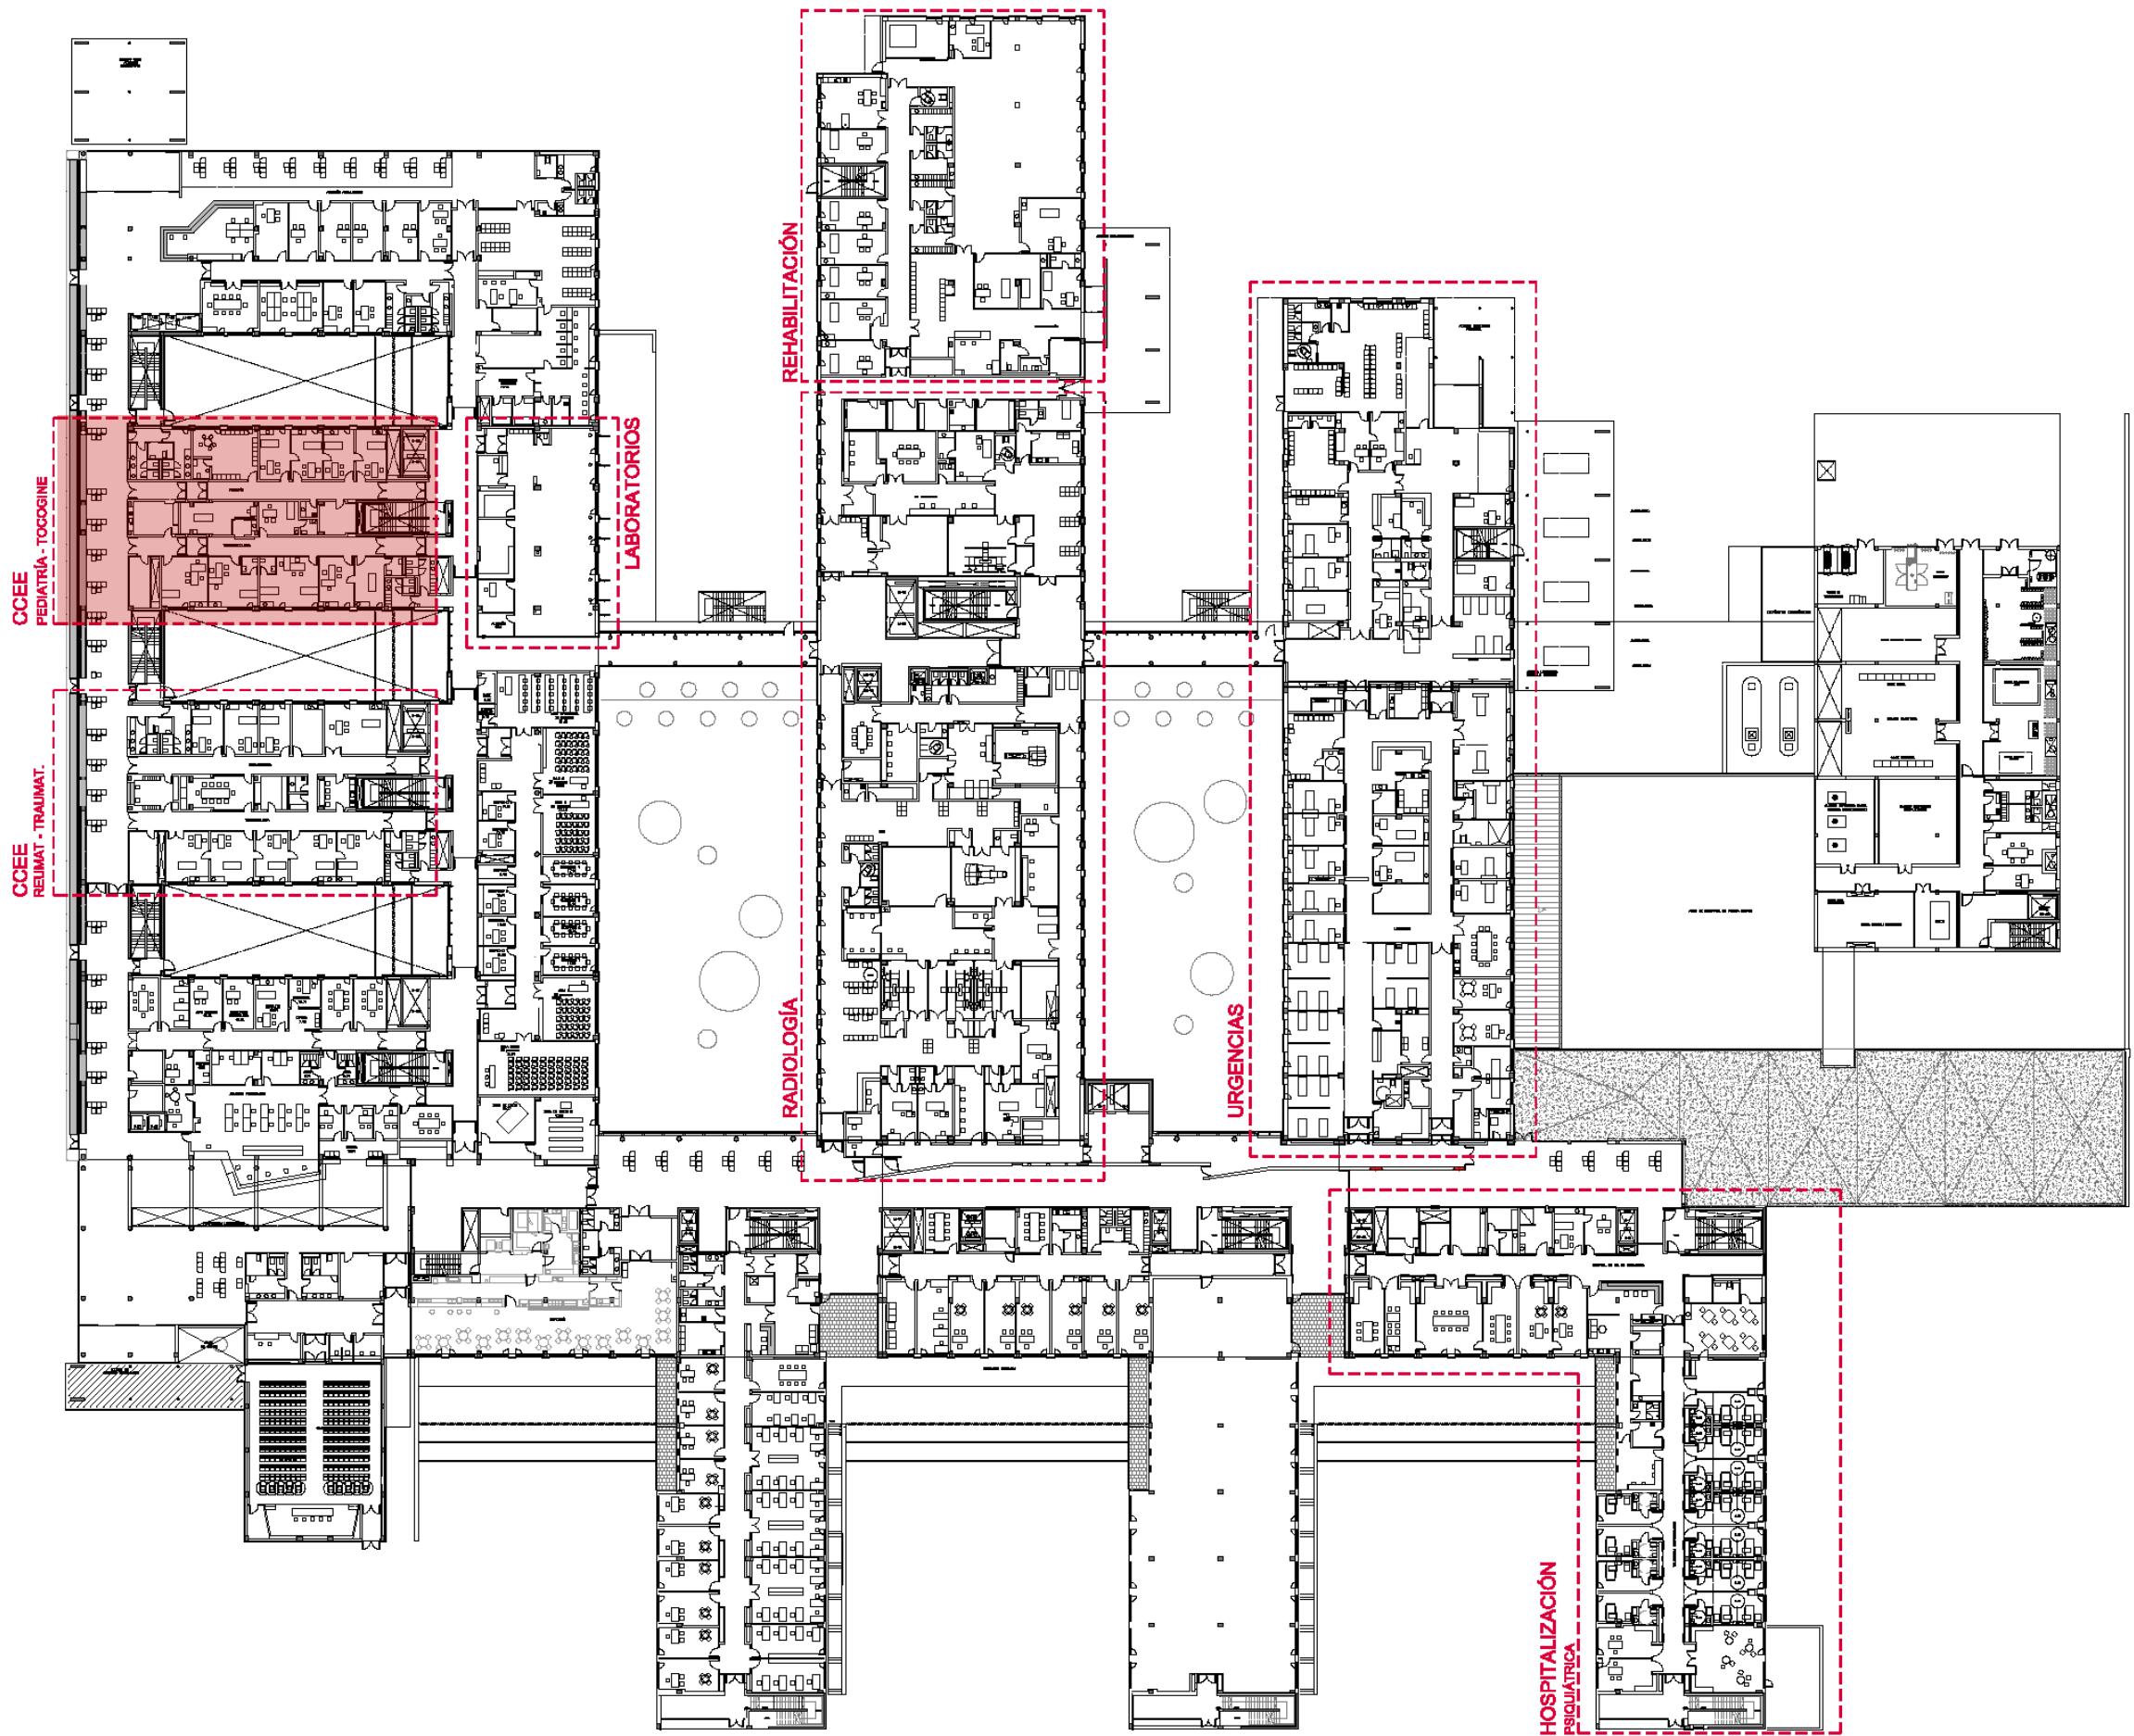




CCEE
PEDIATRÍA - TOCÓGINE

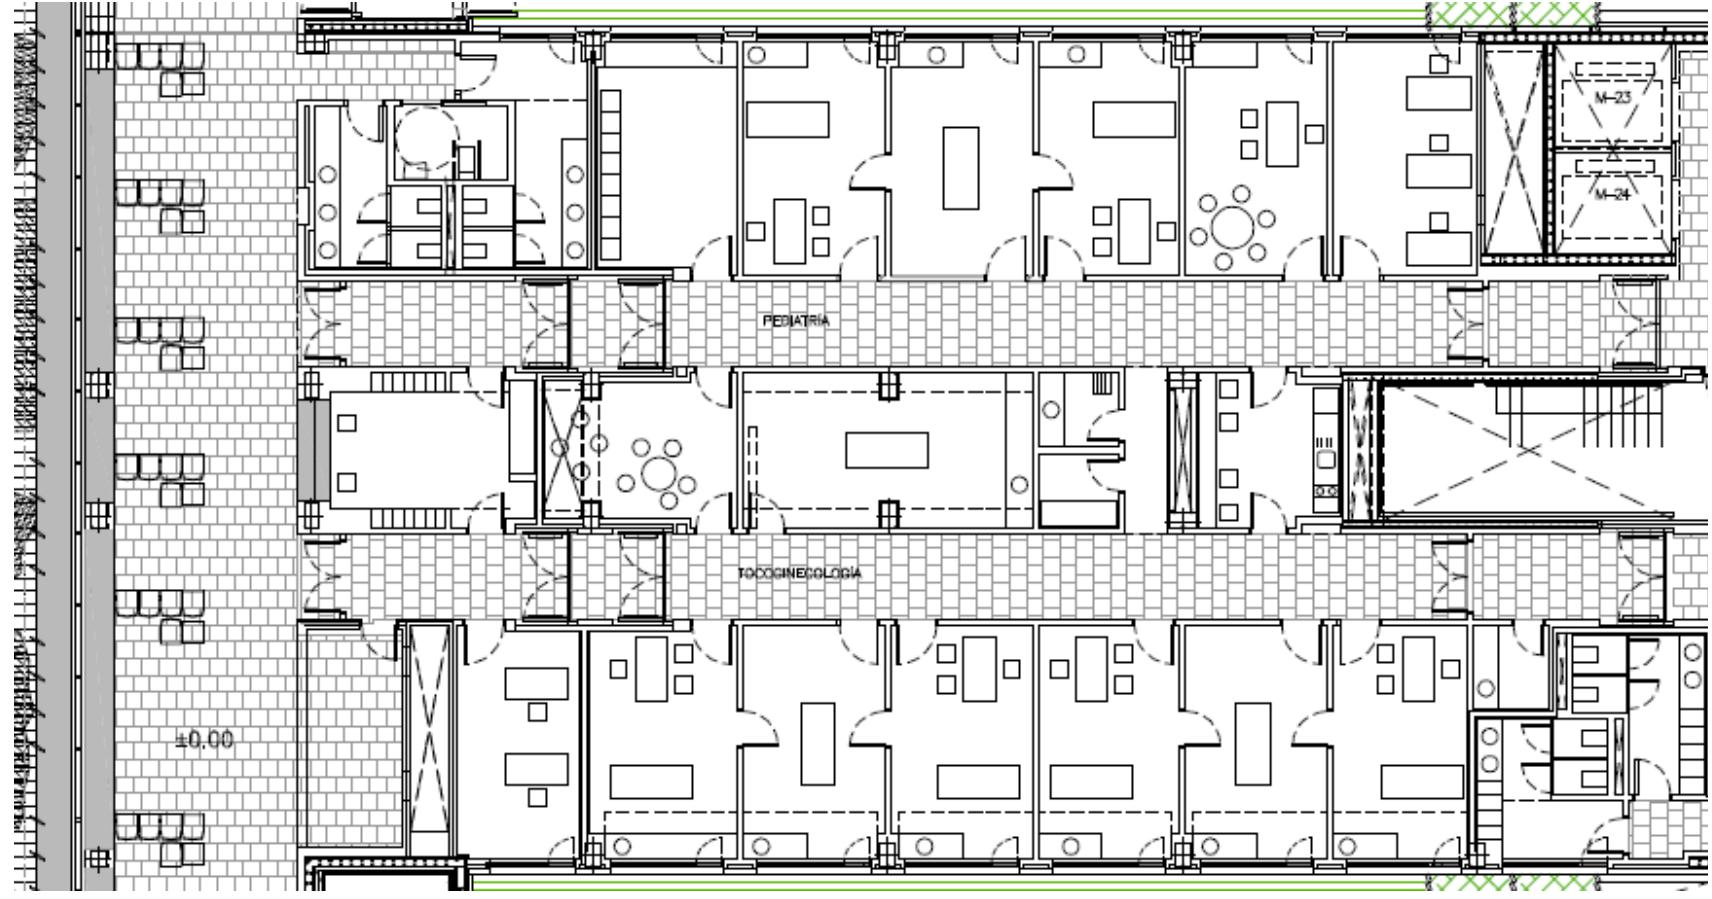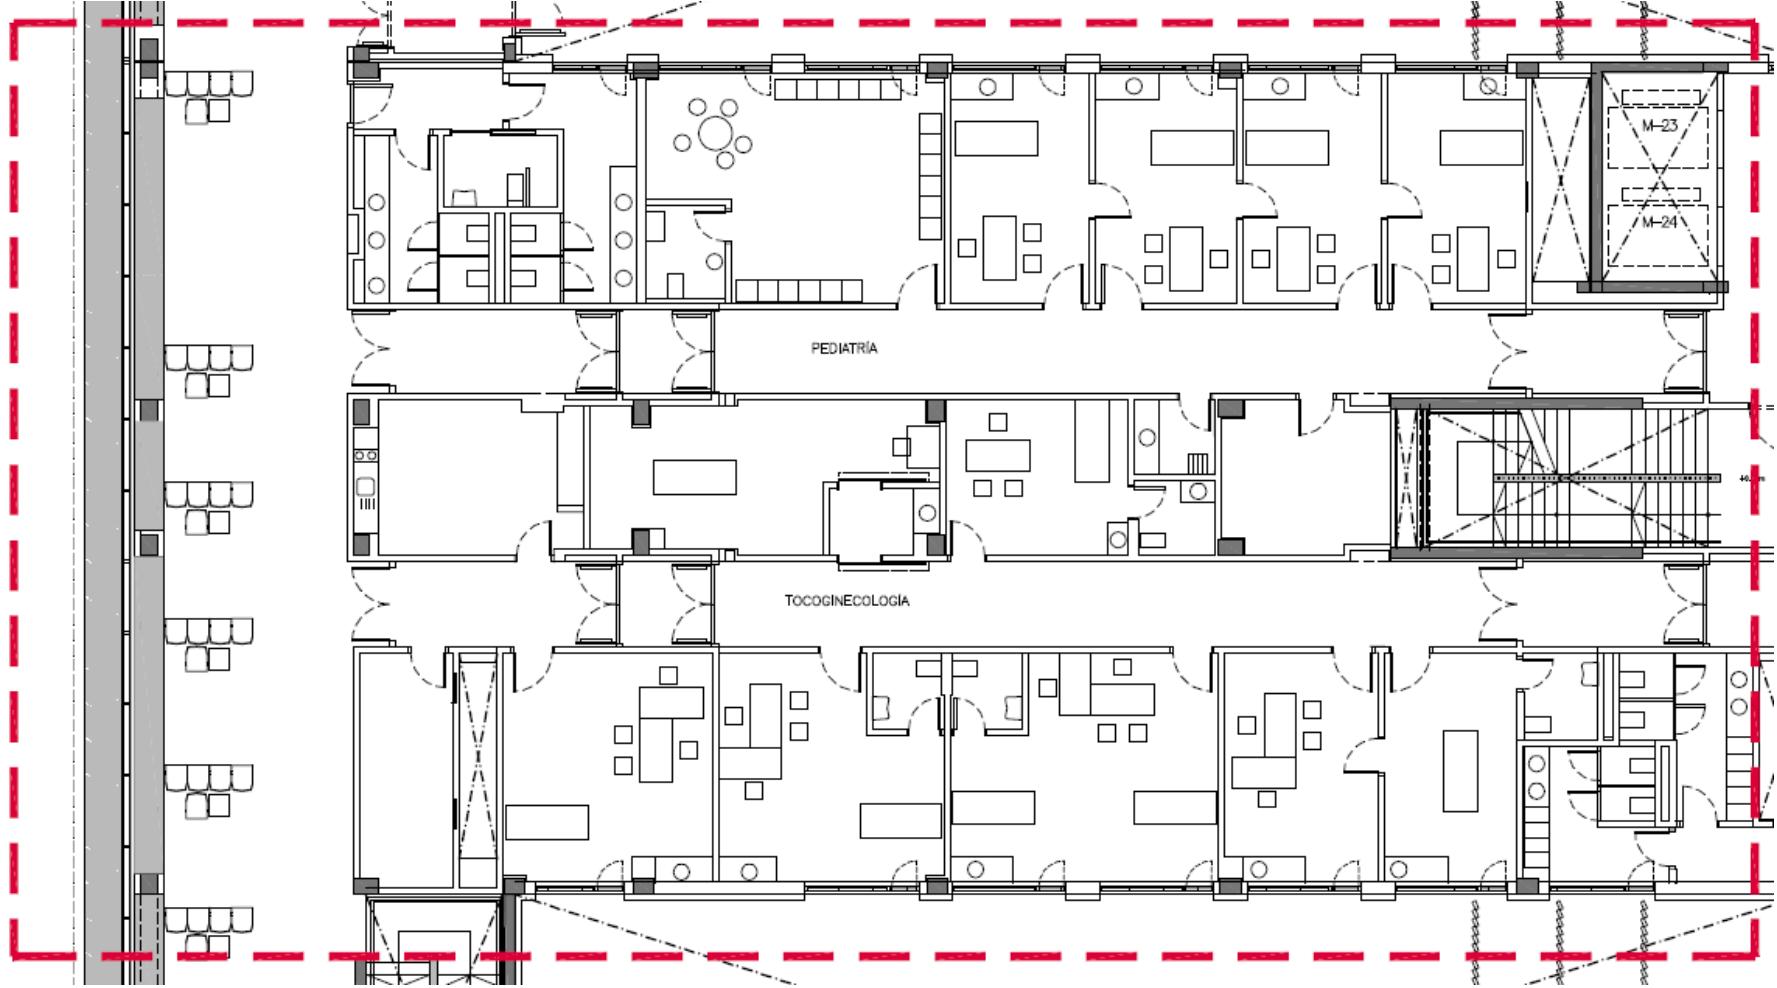


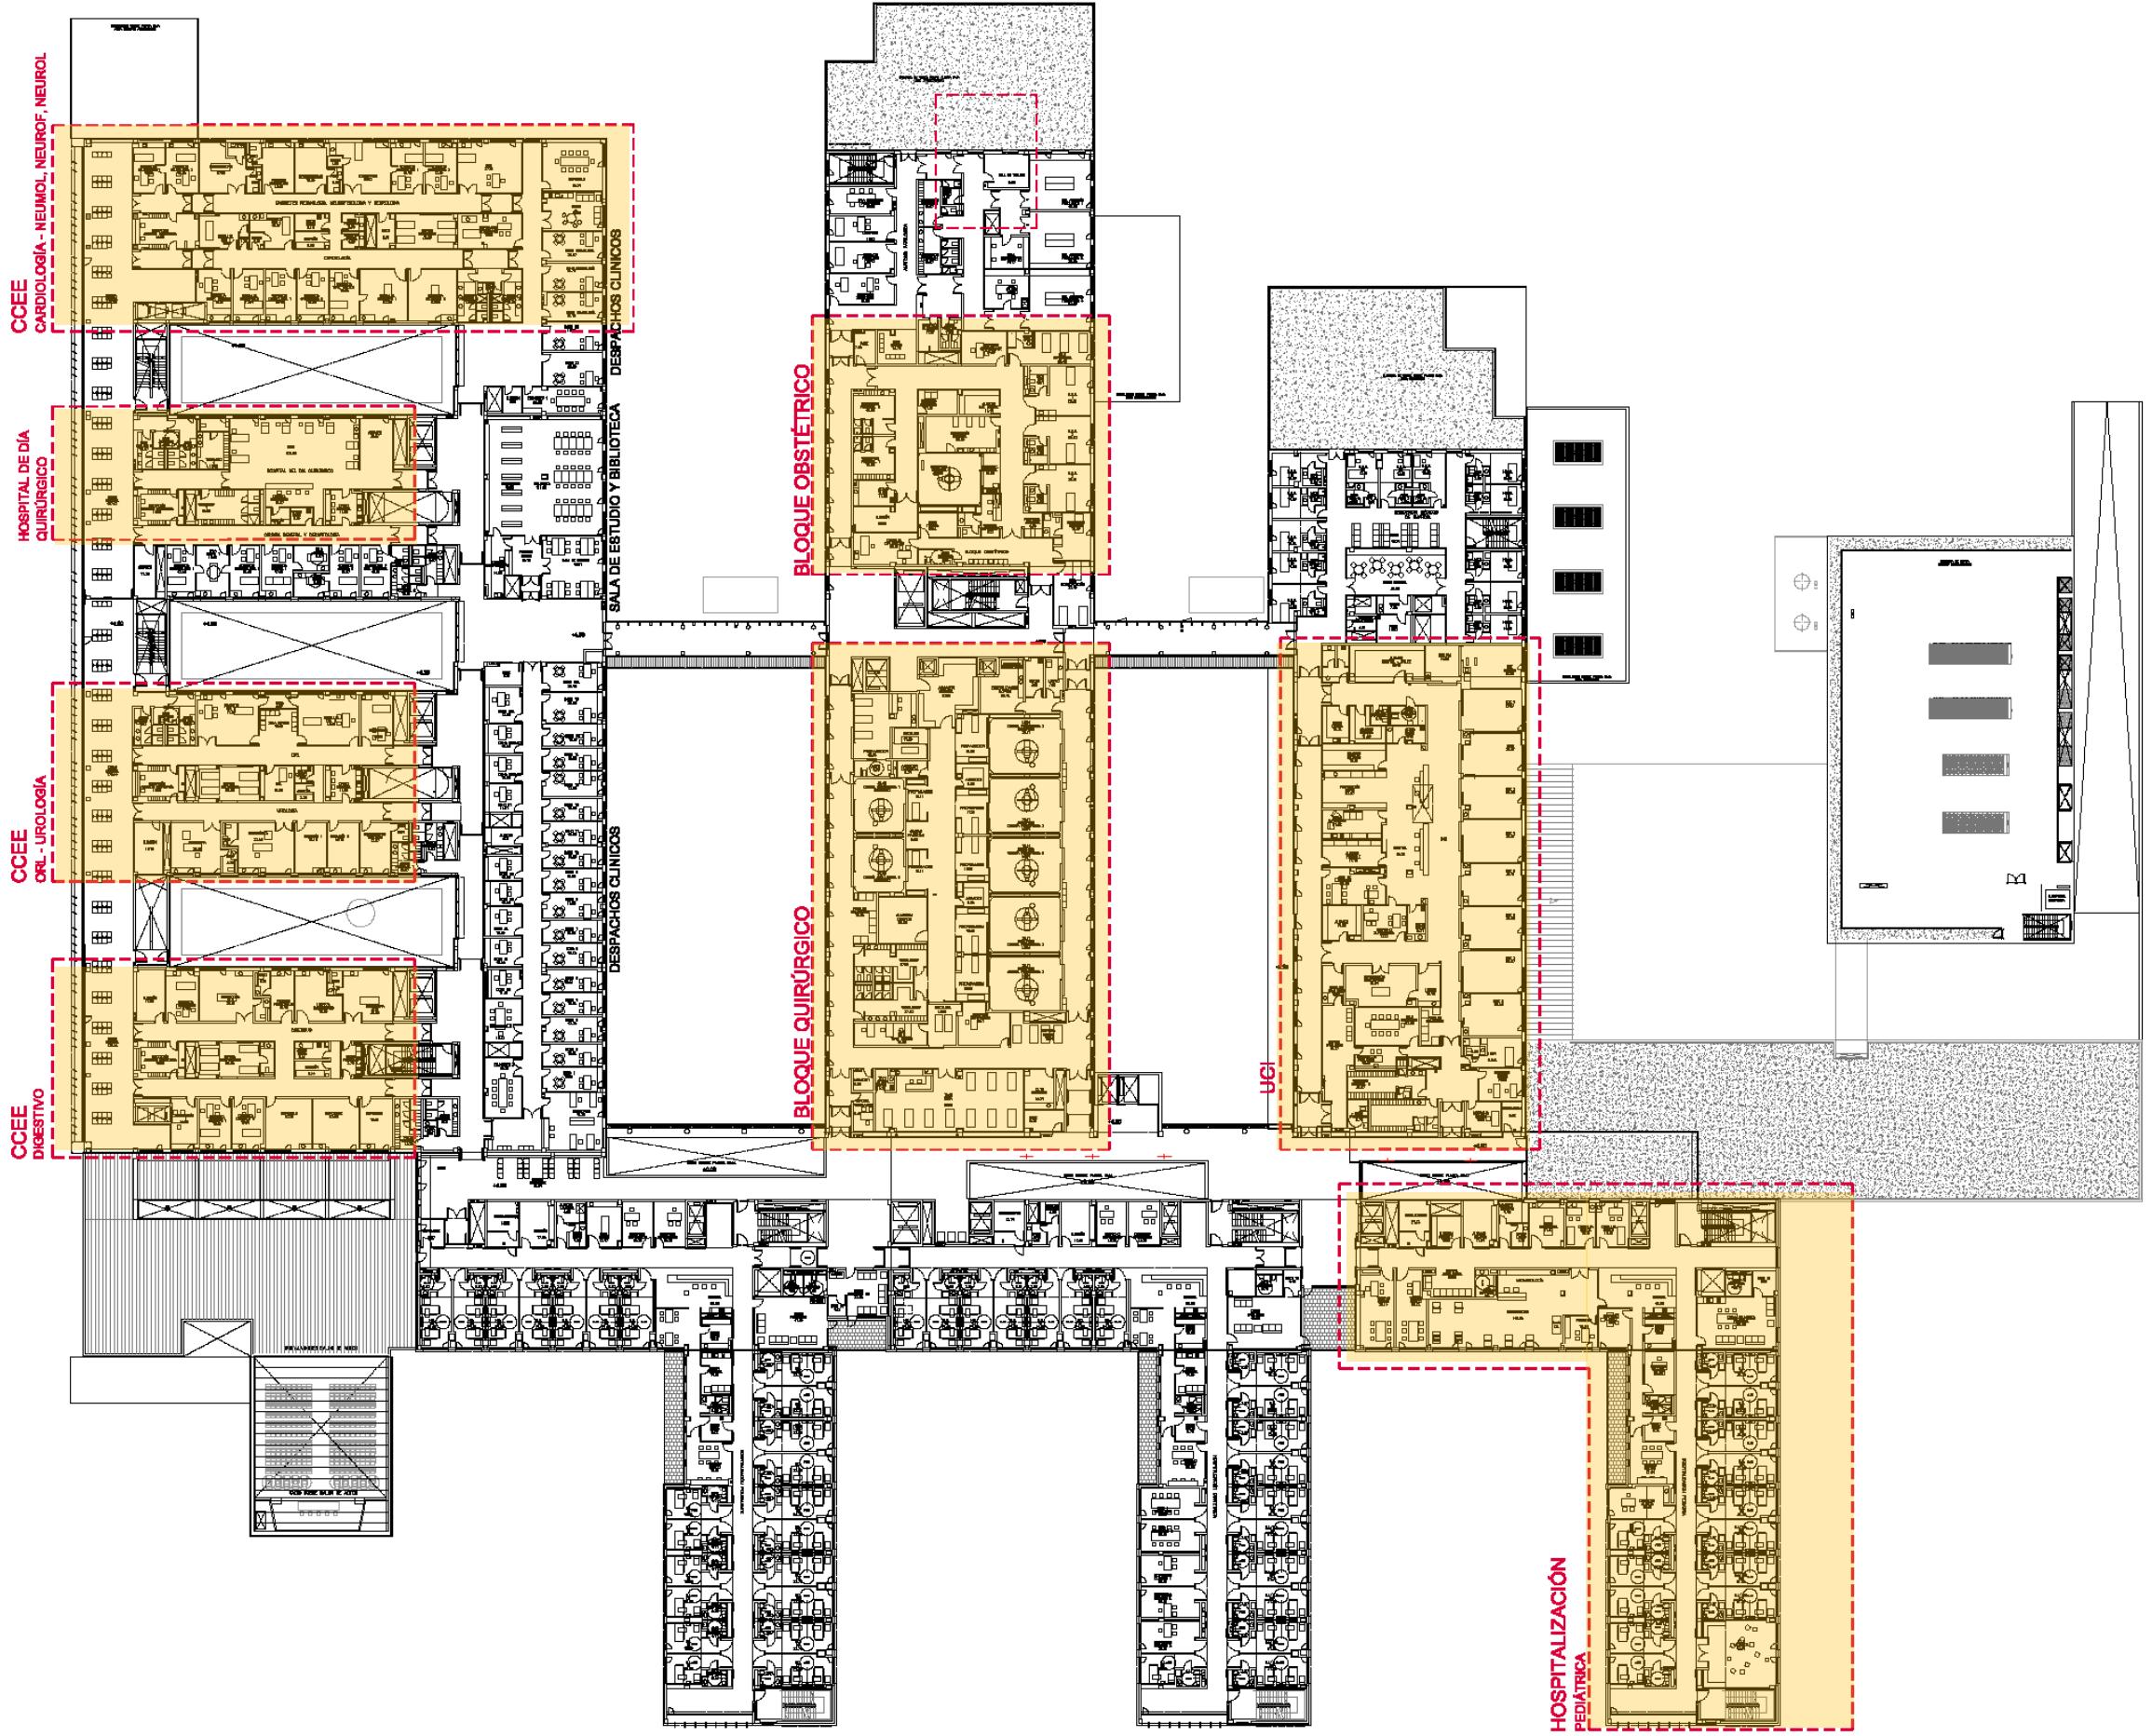


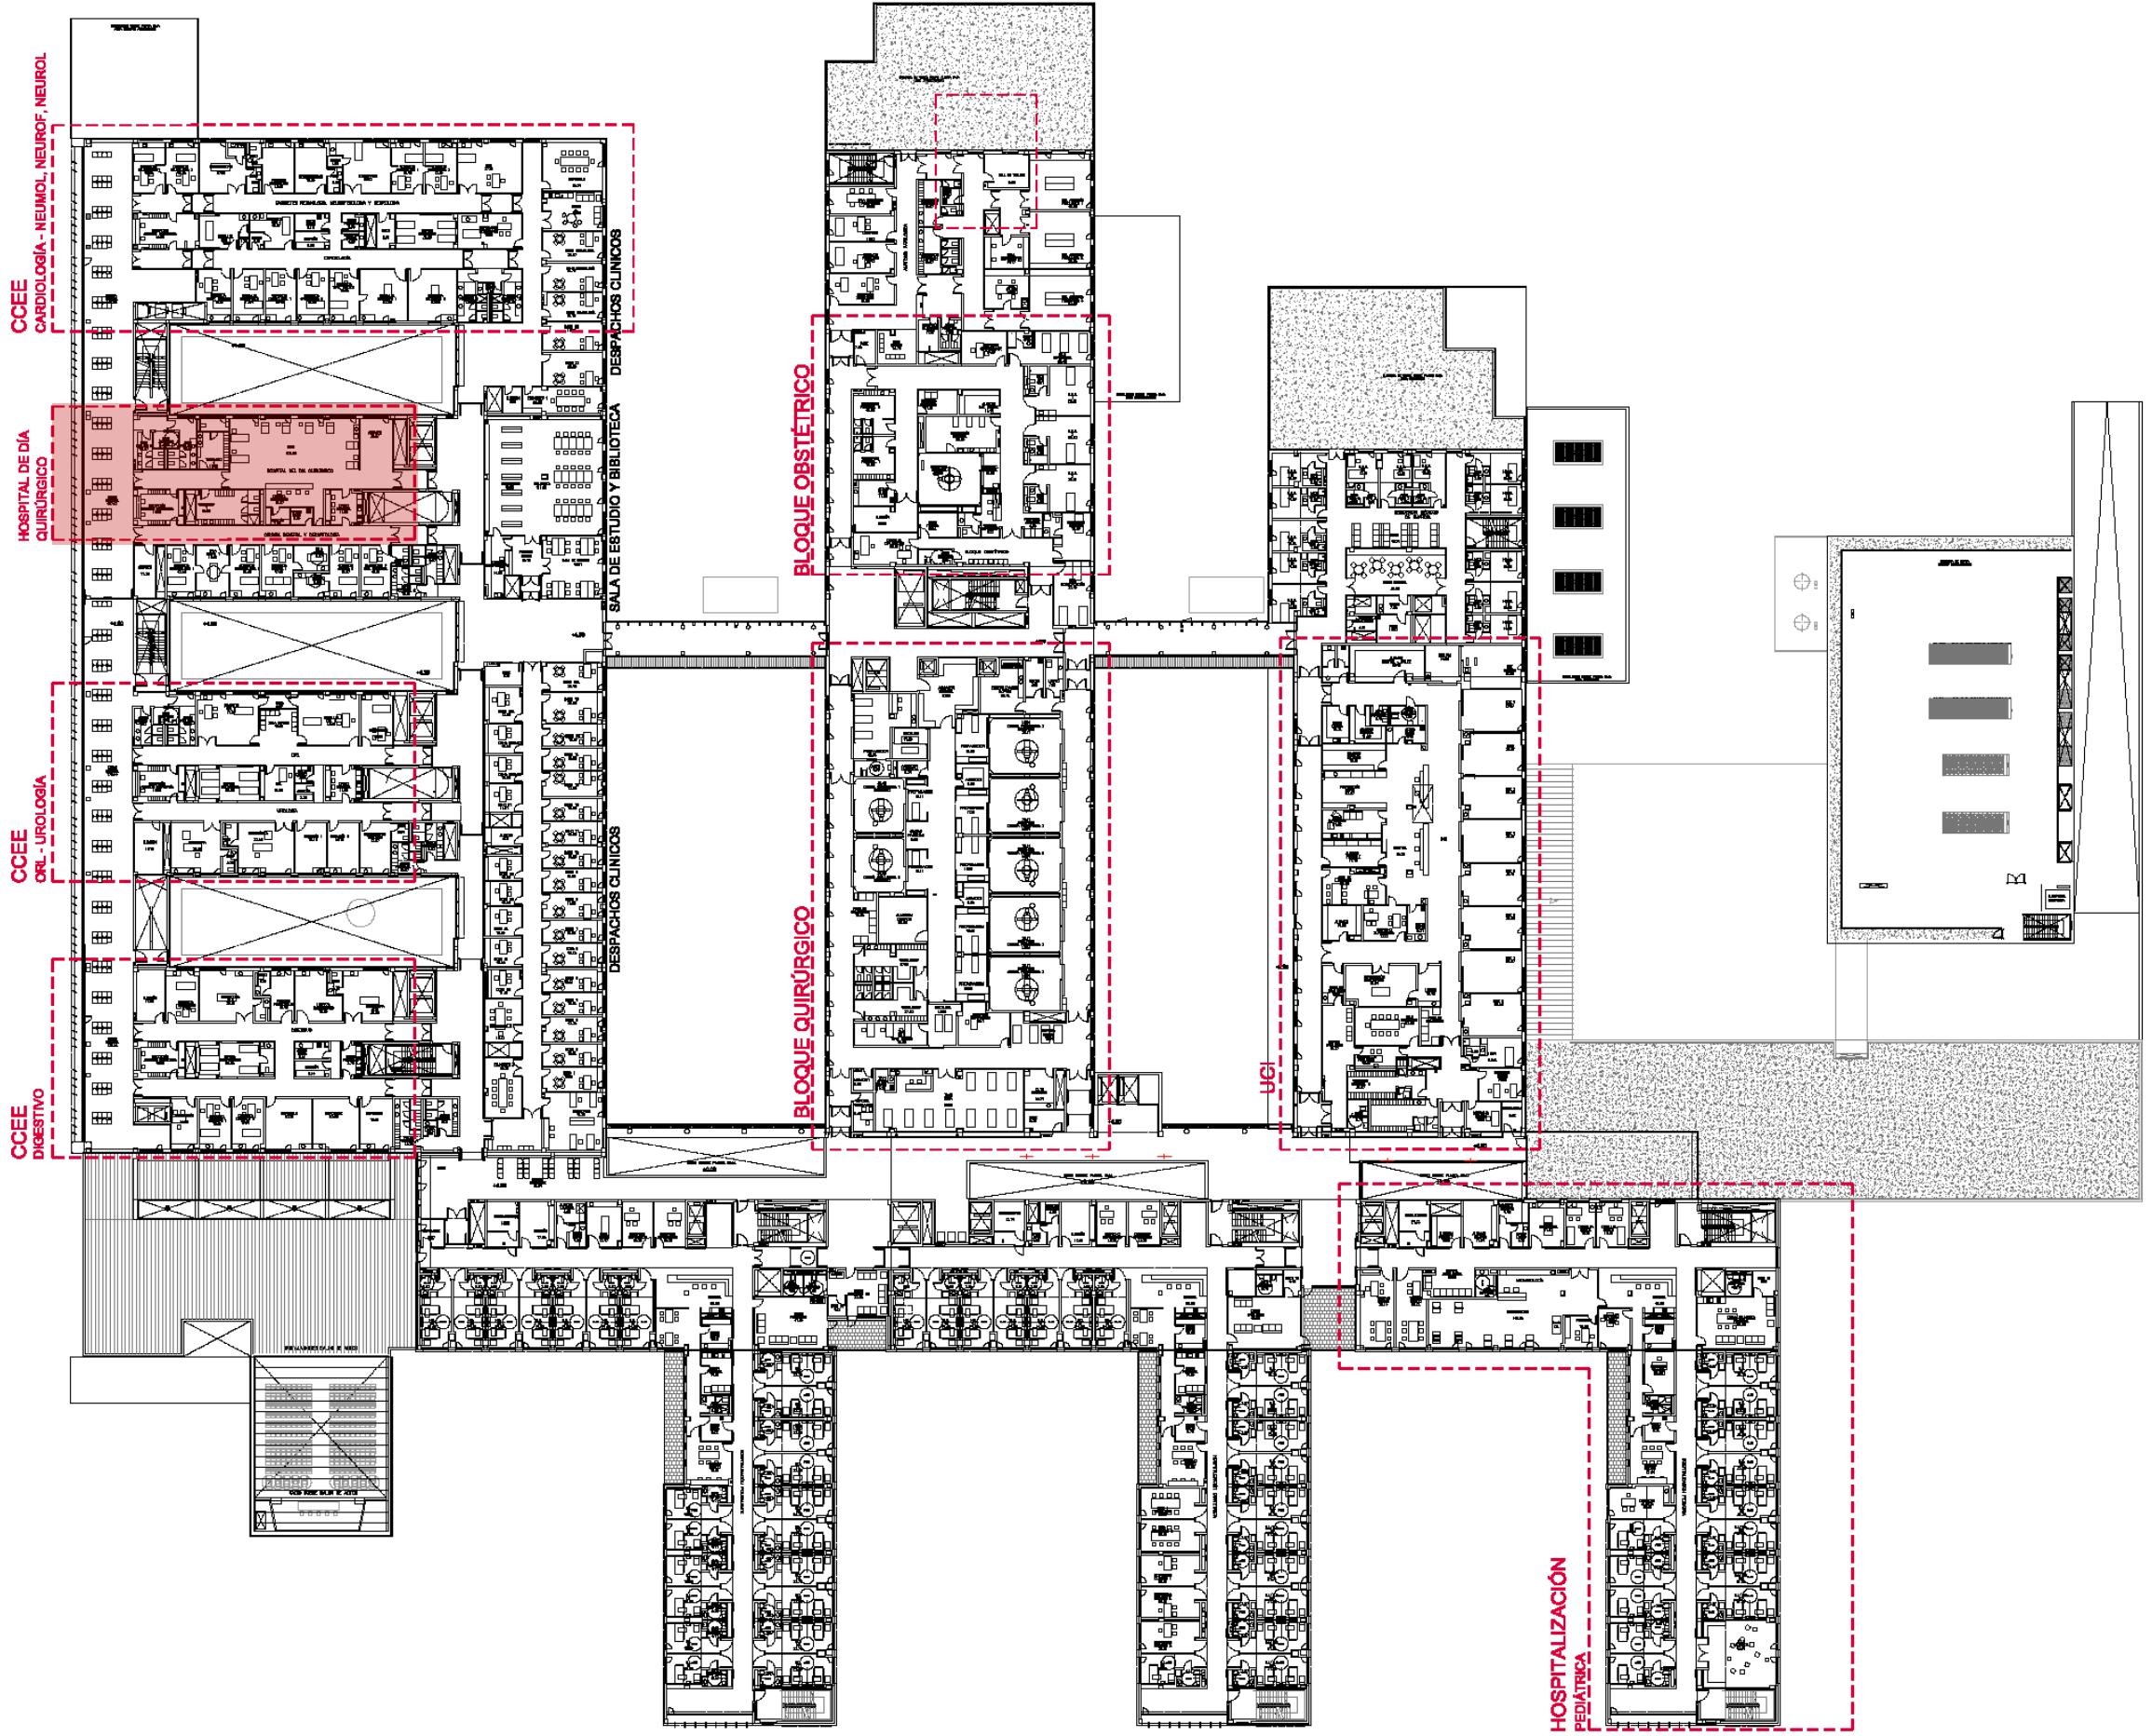



HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO

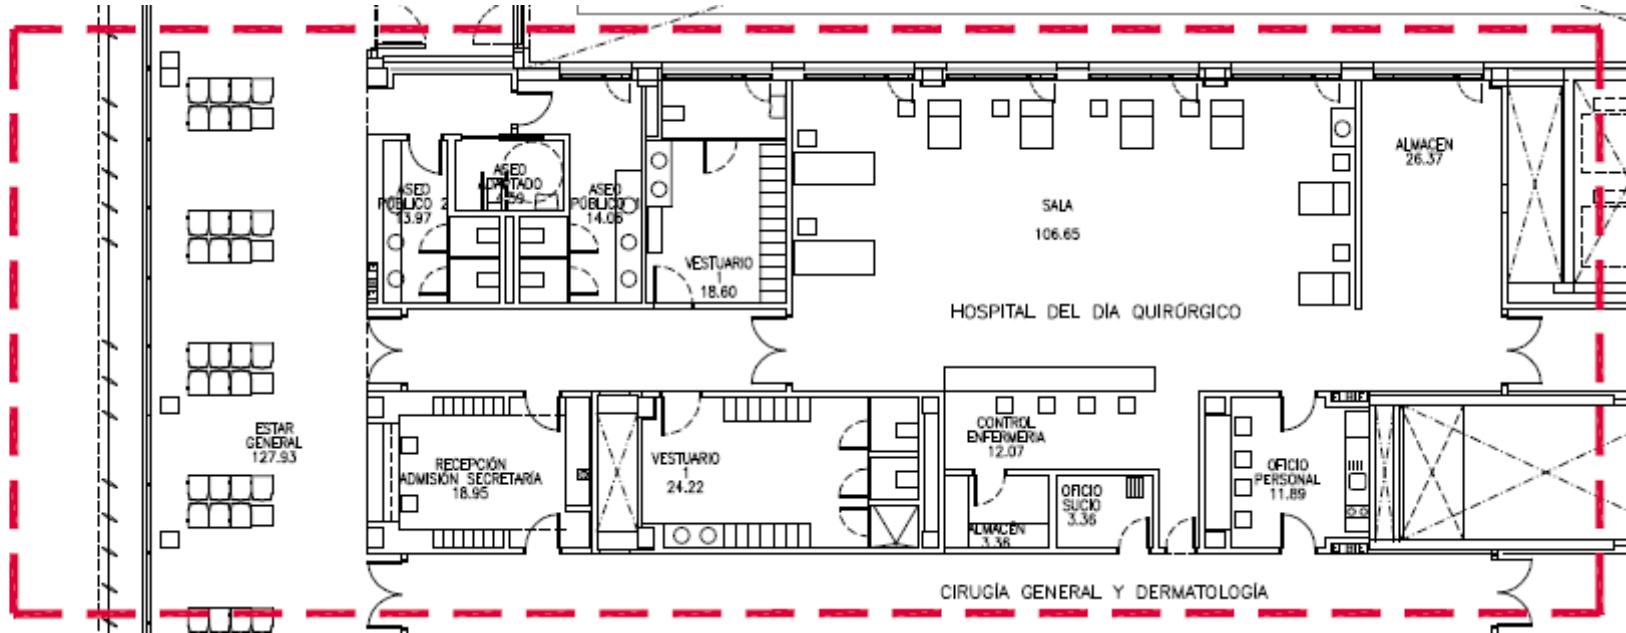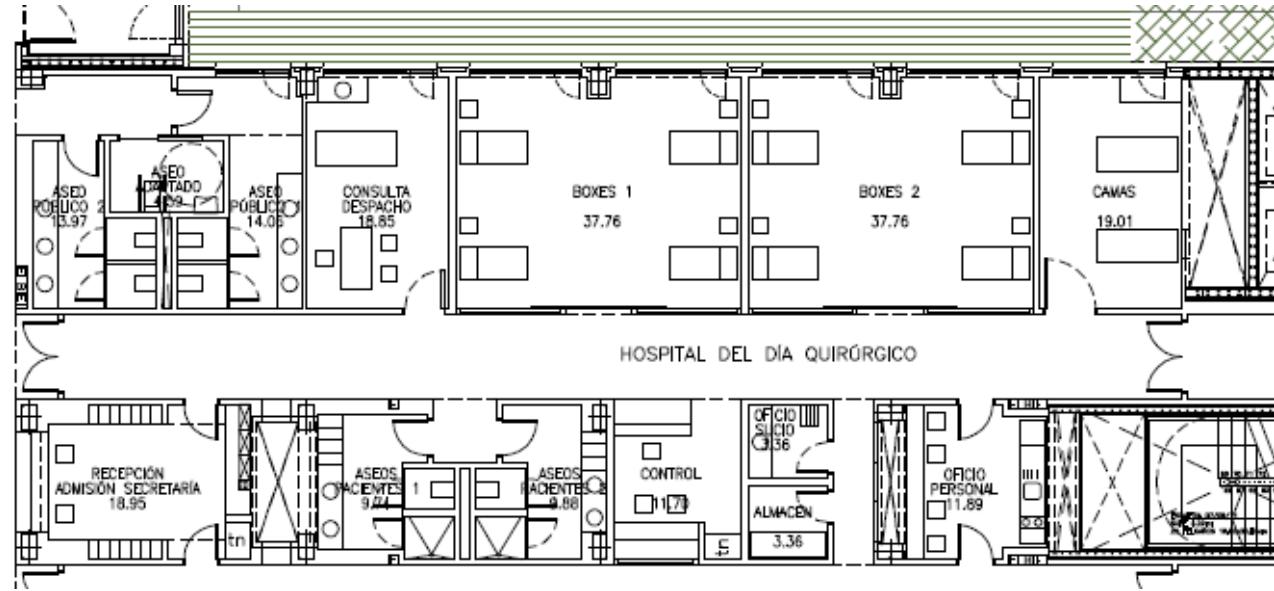
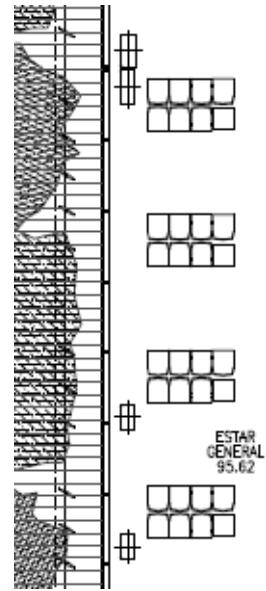




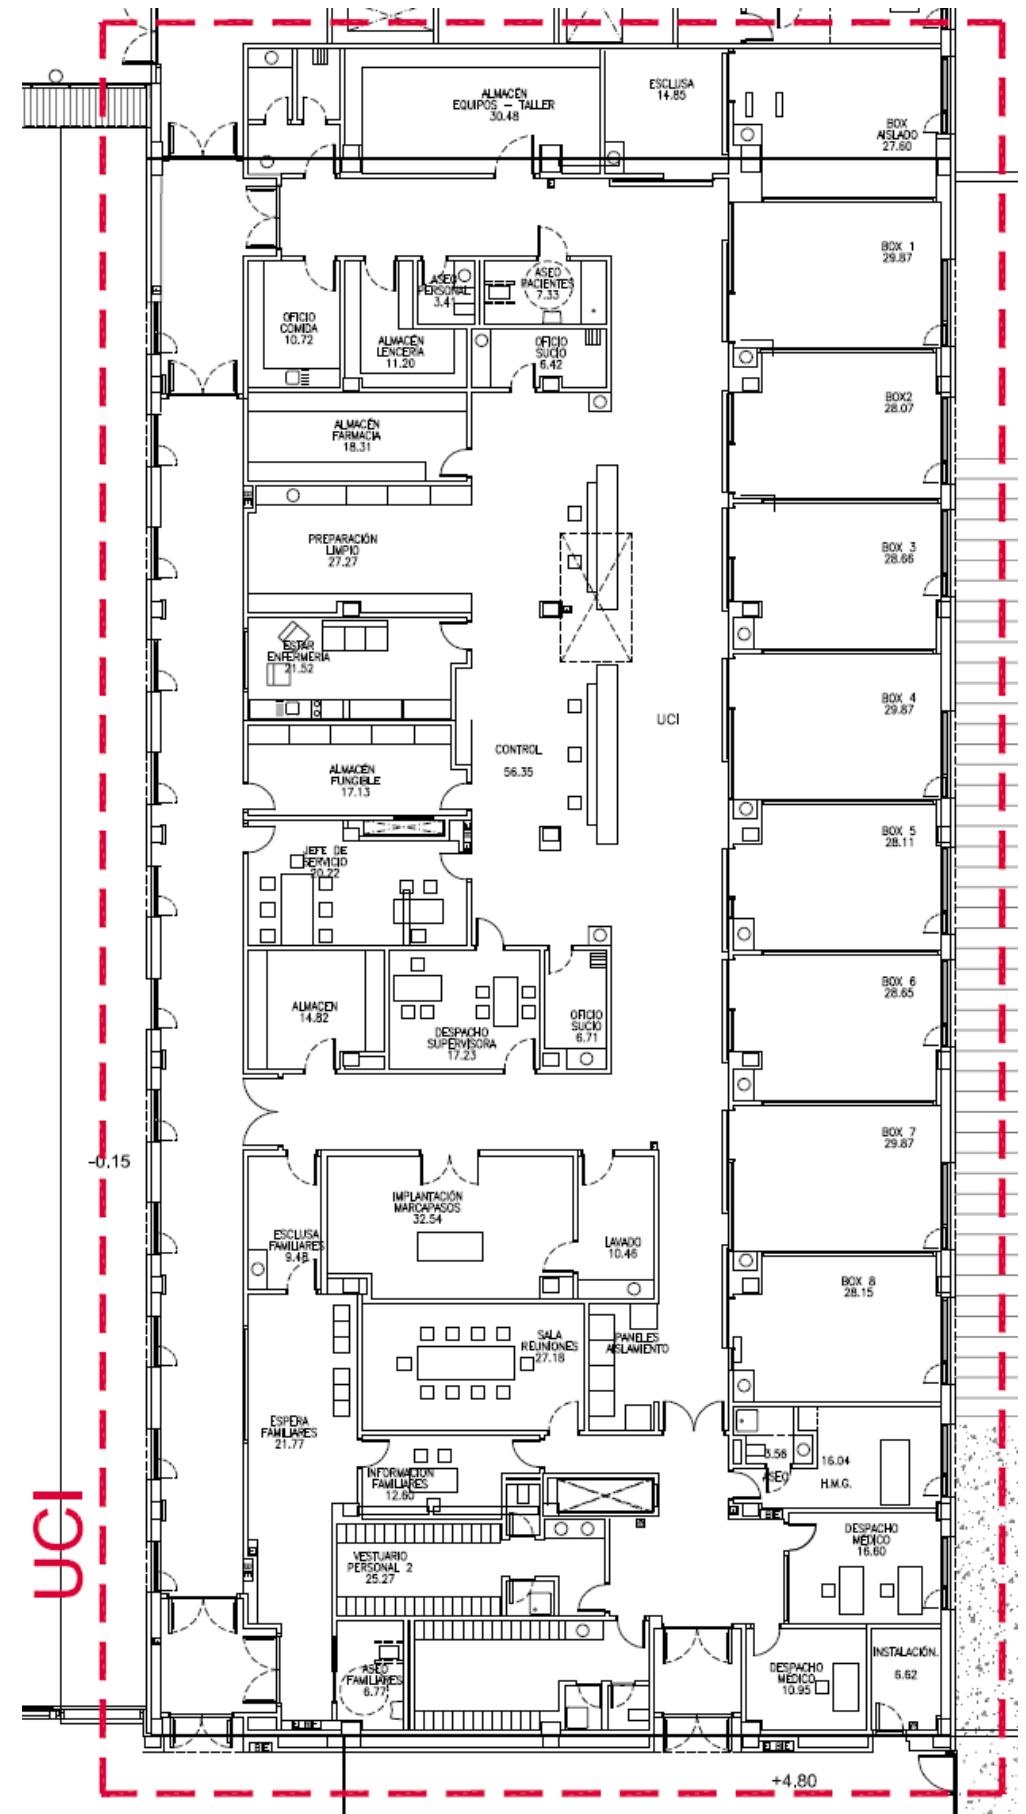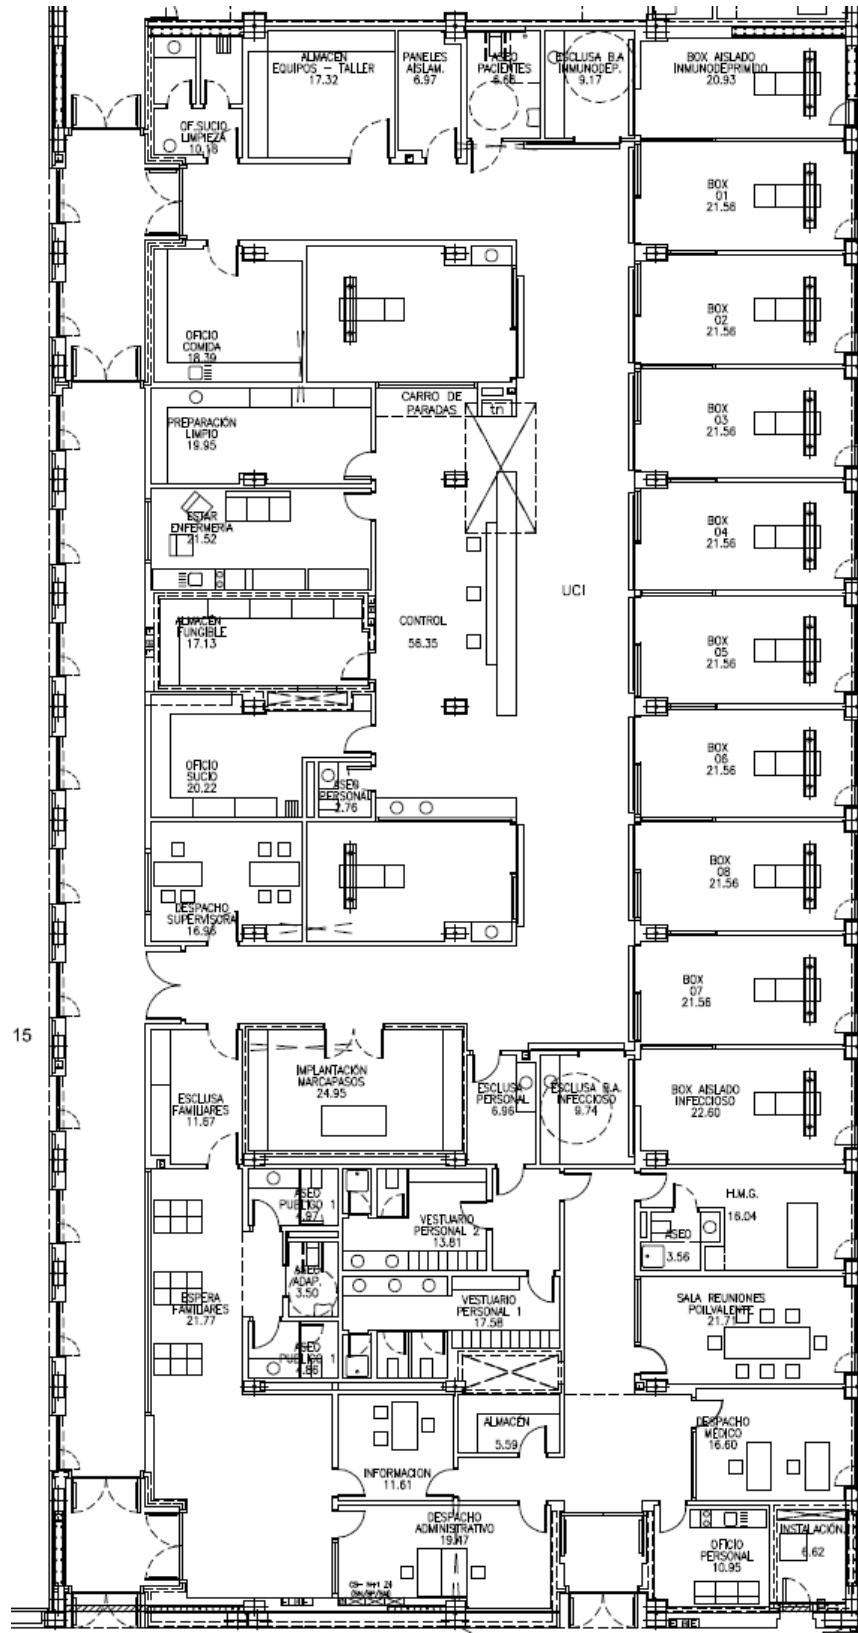


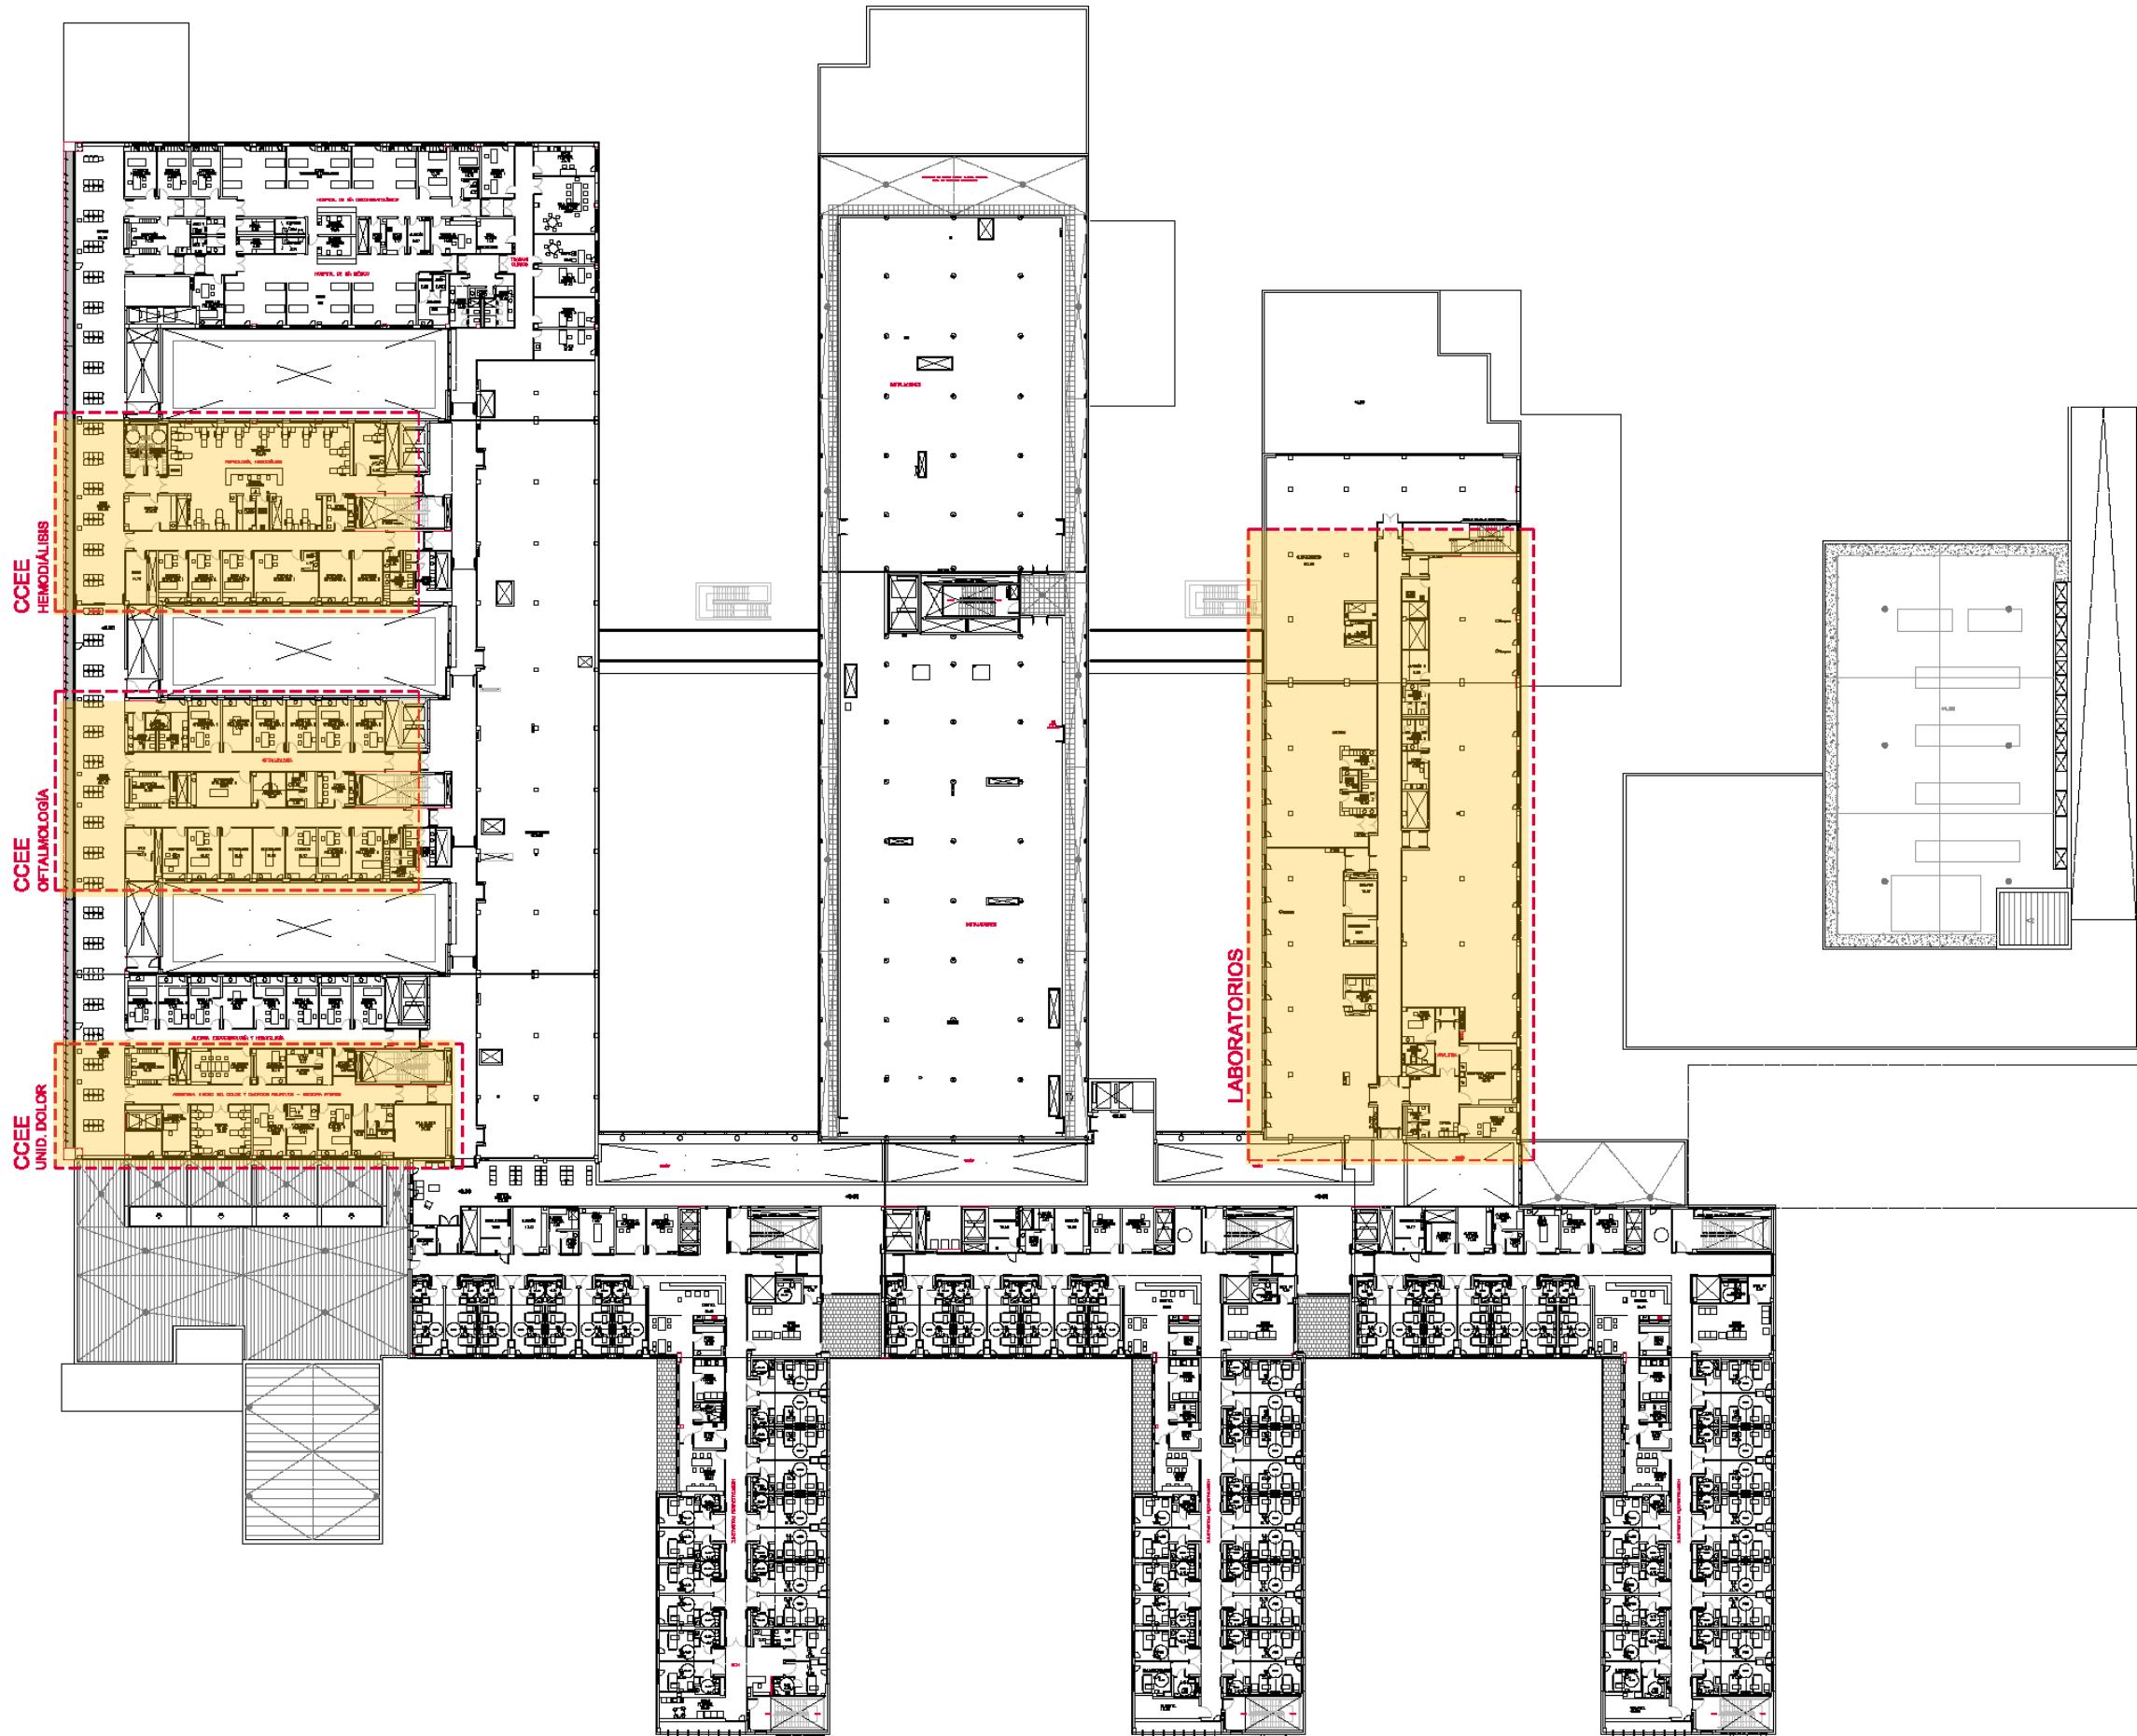


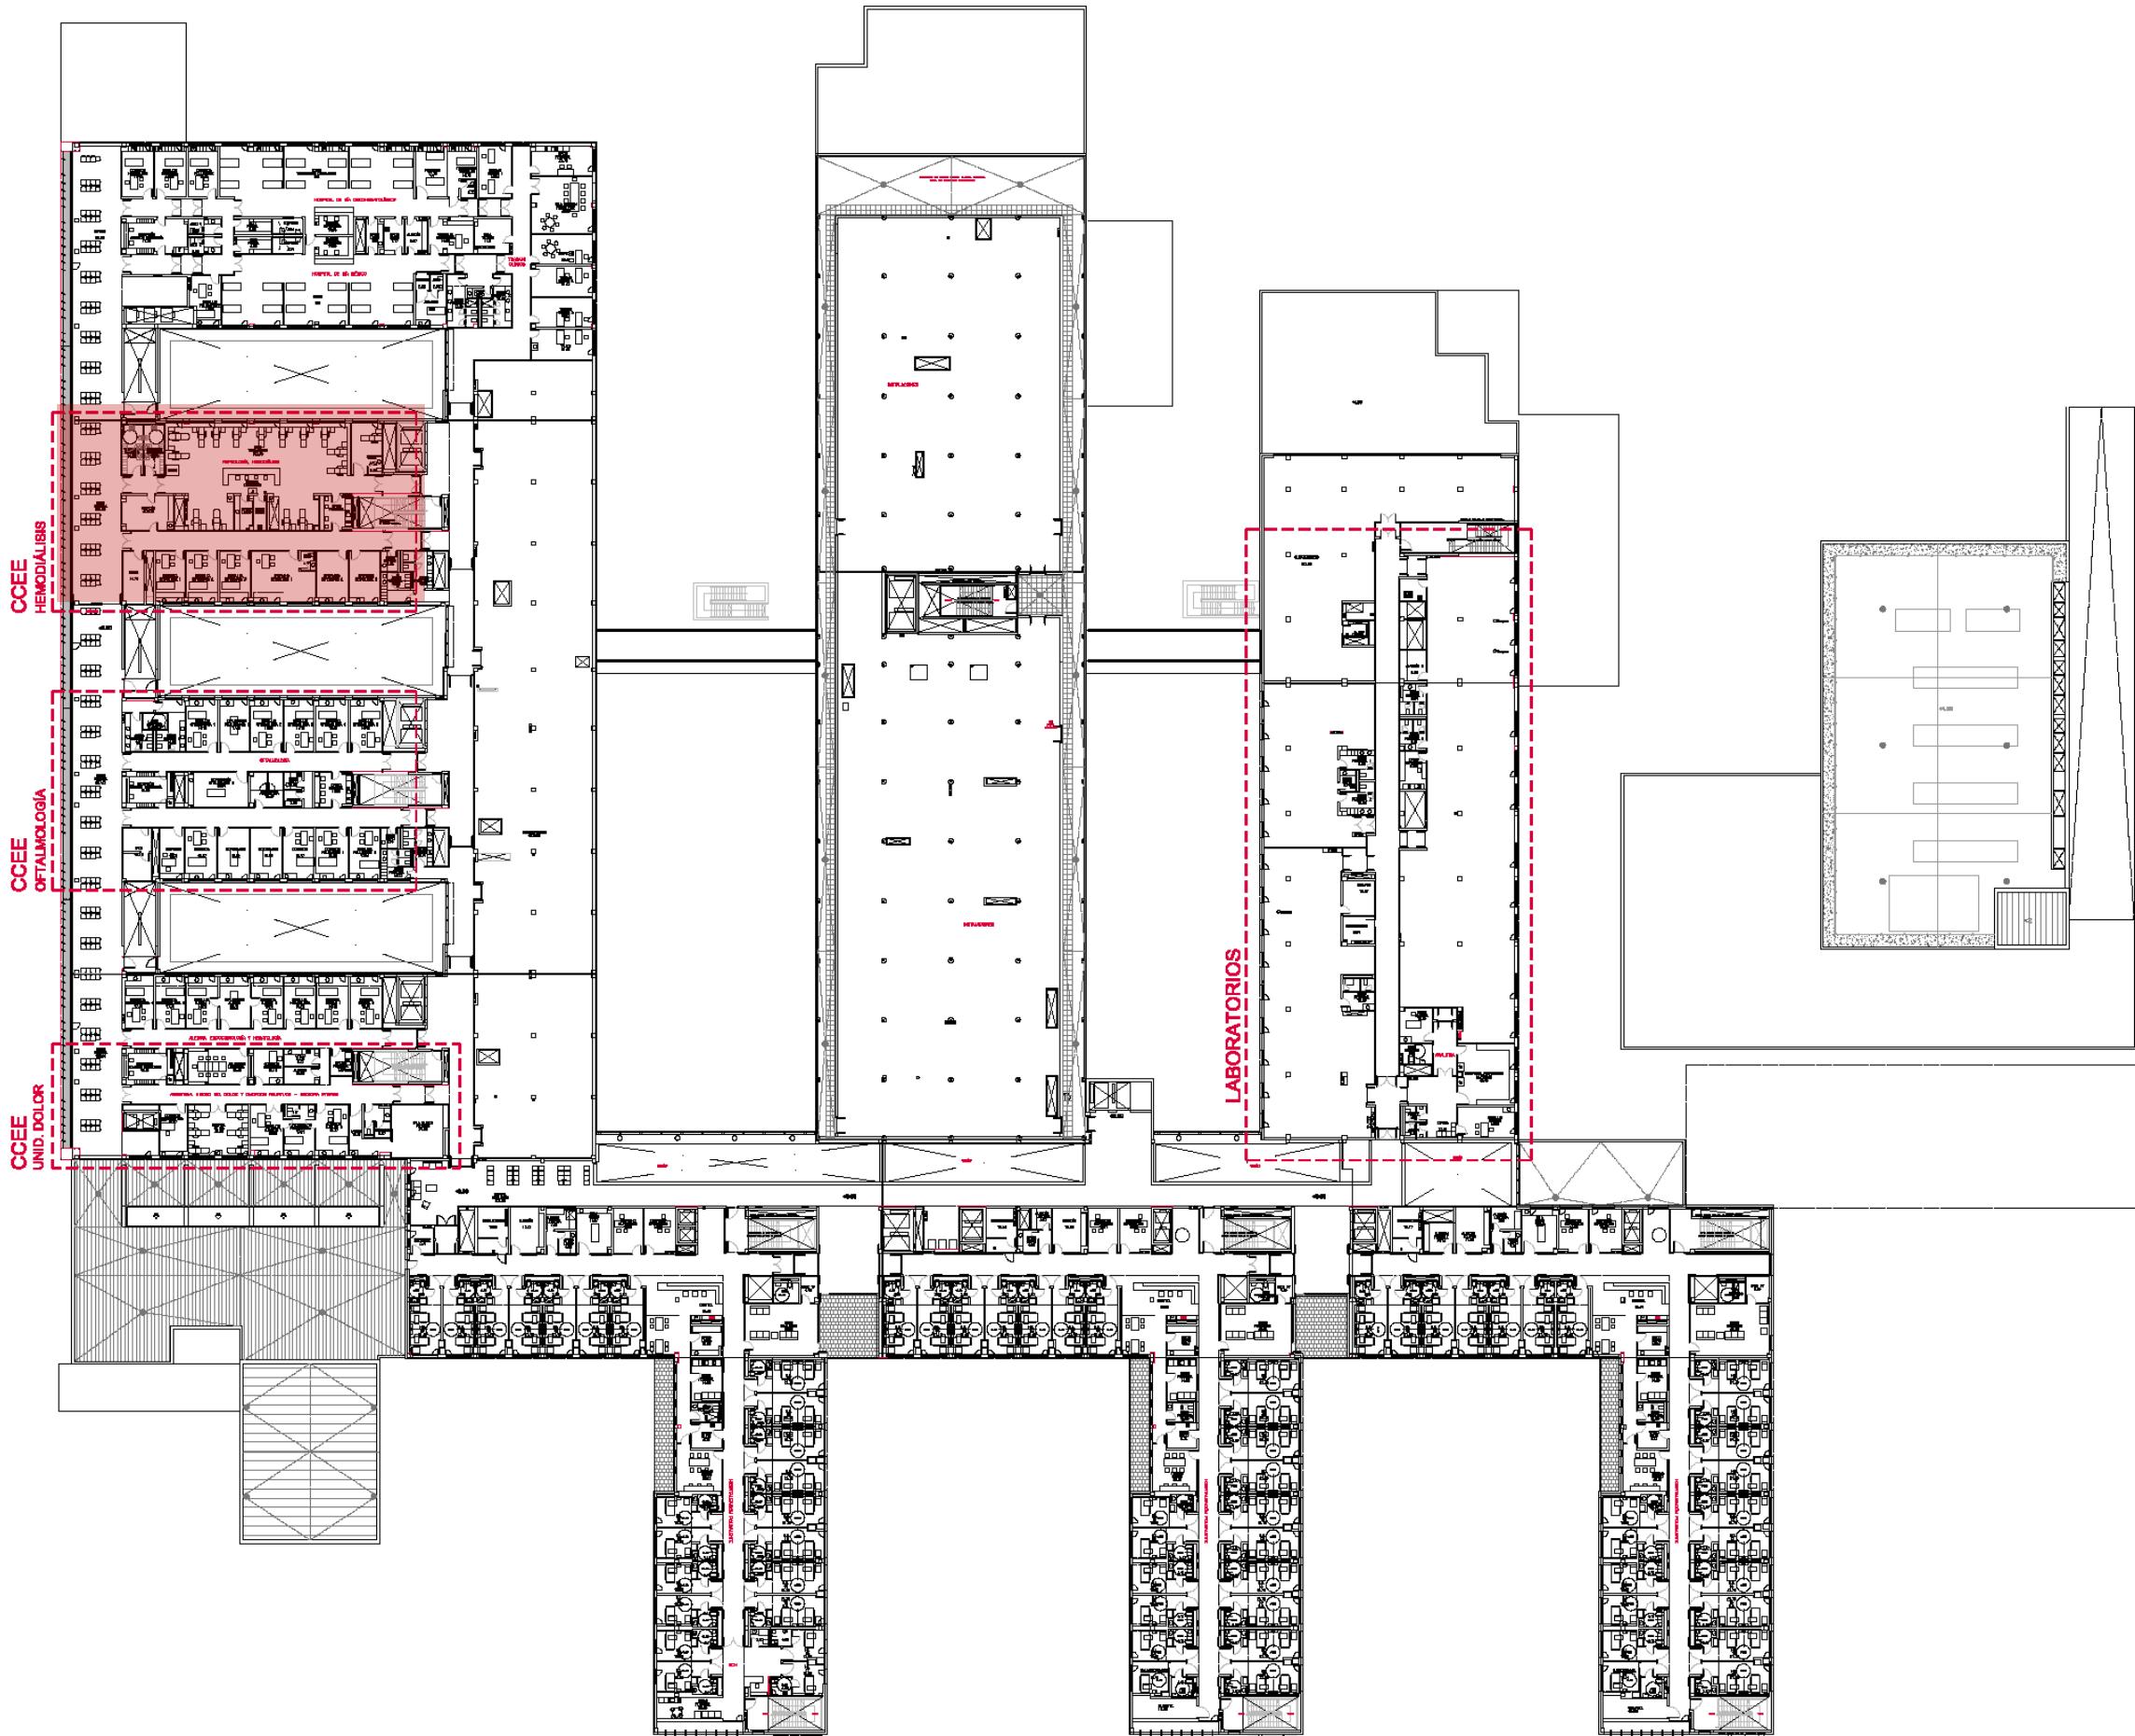

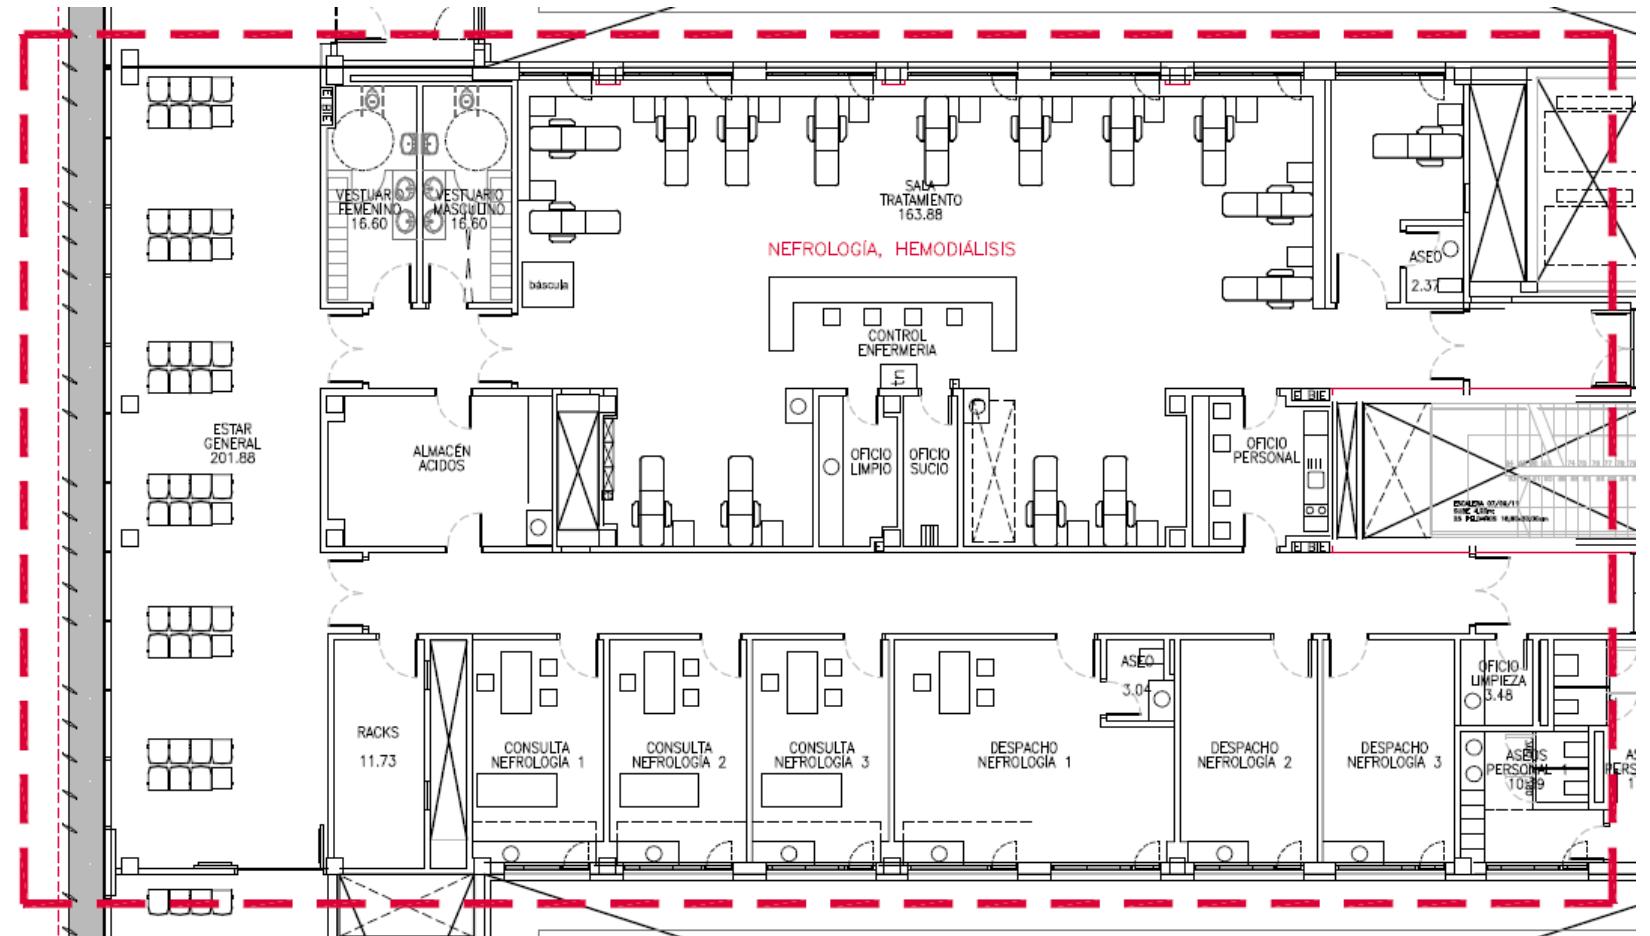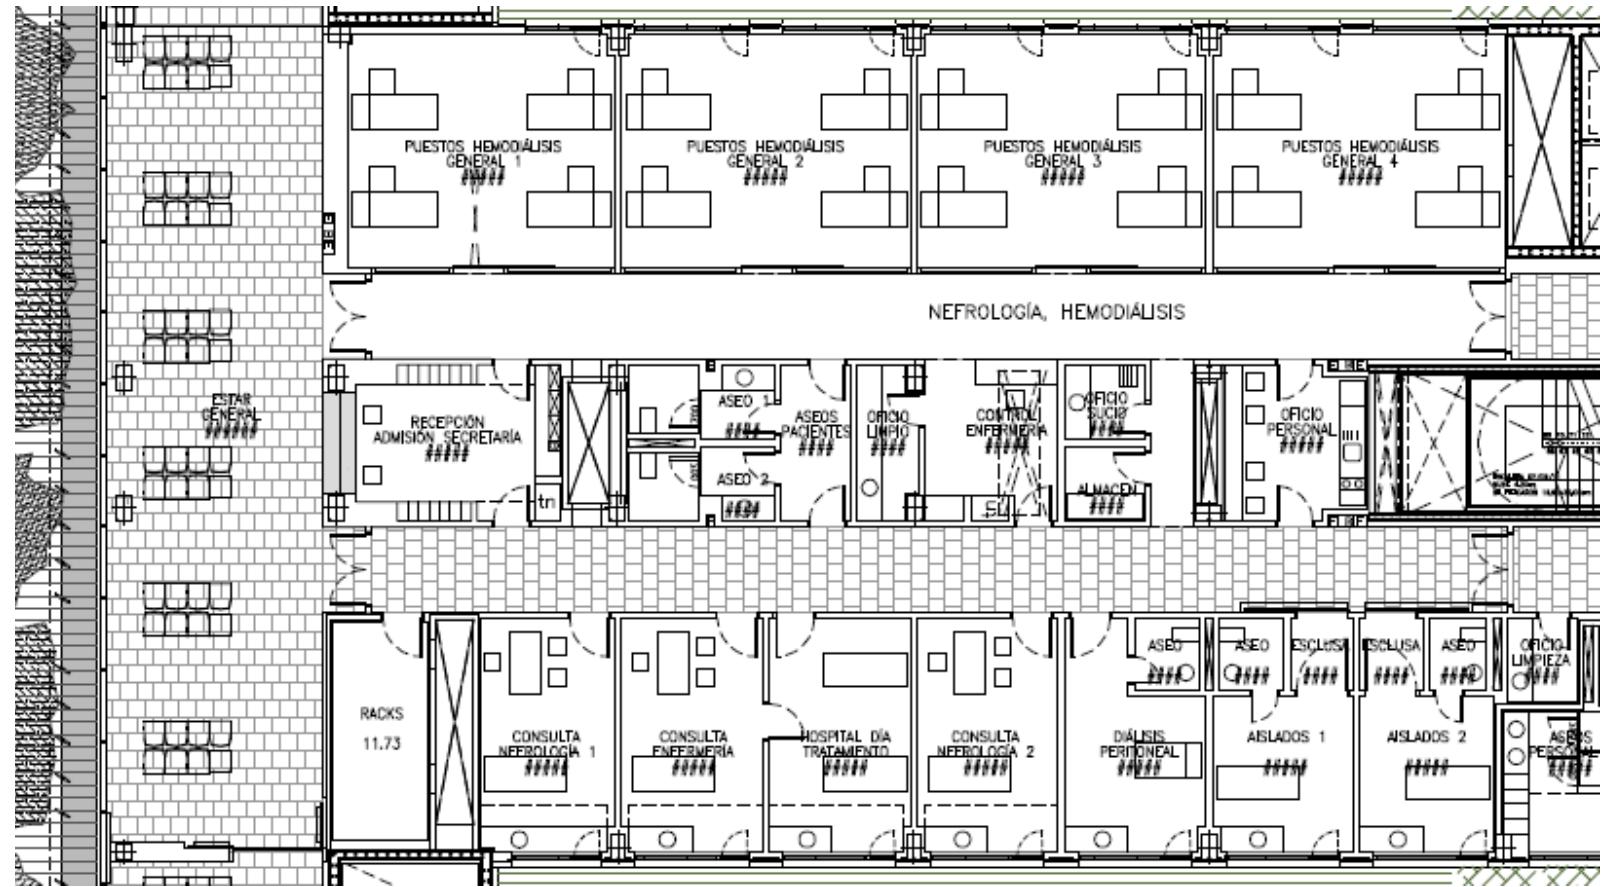

CCEE
HEMODIÁLISIS

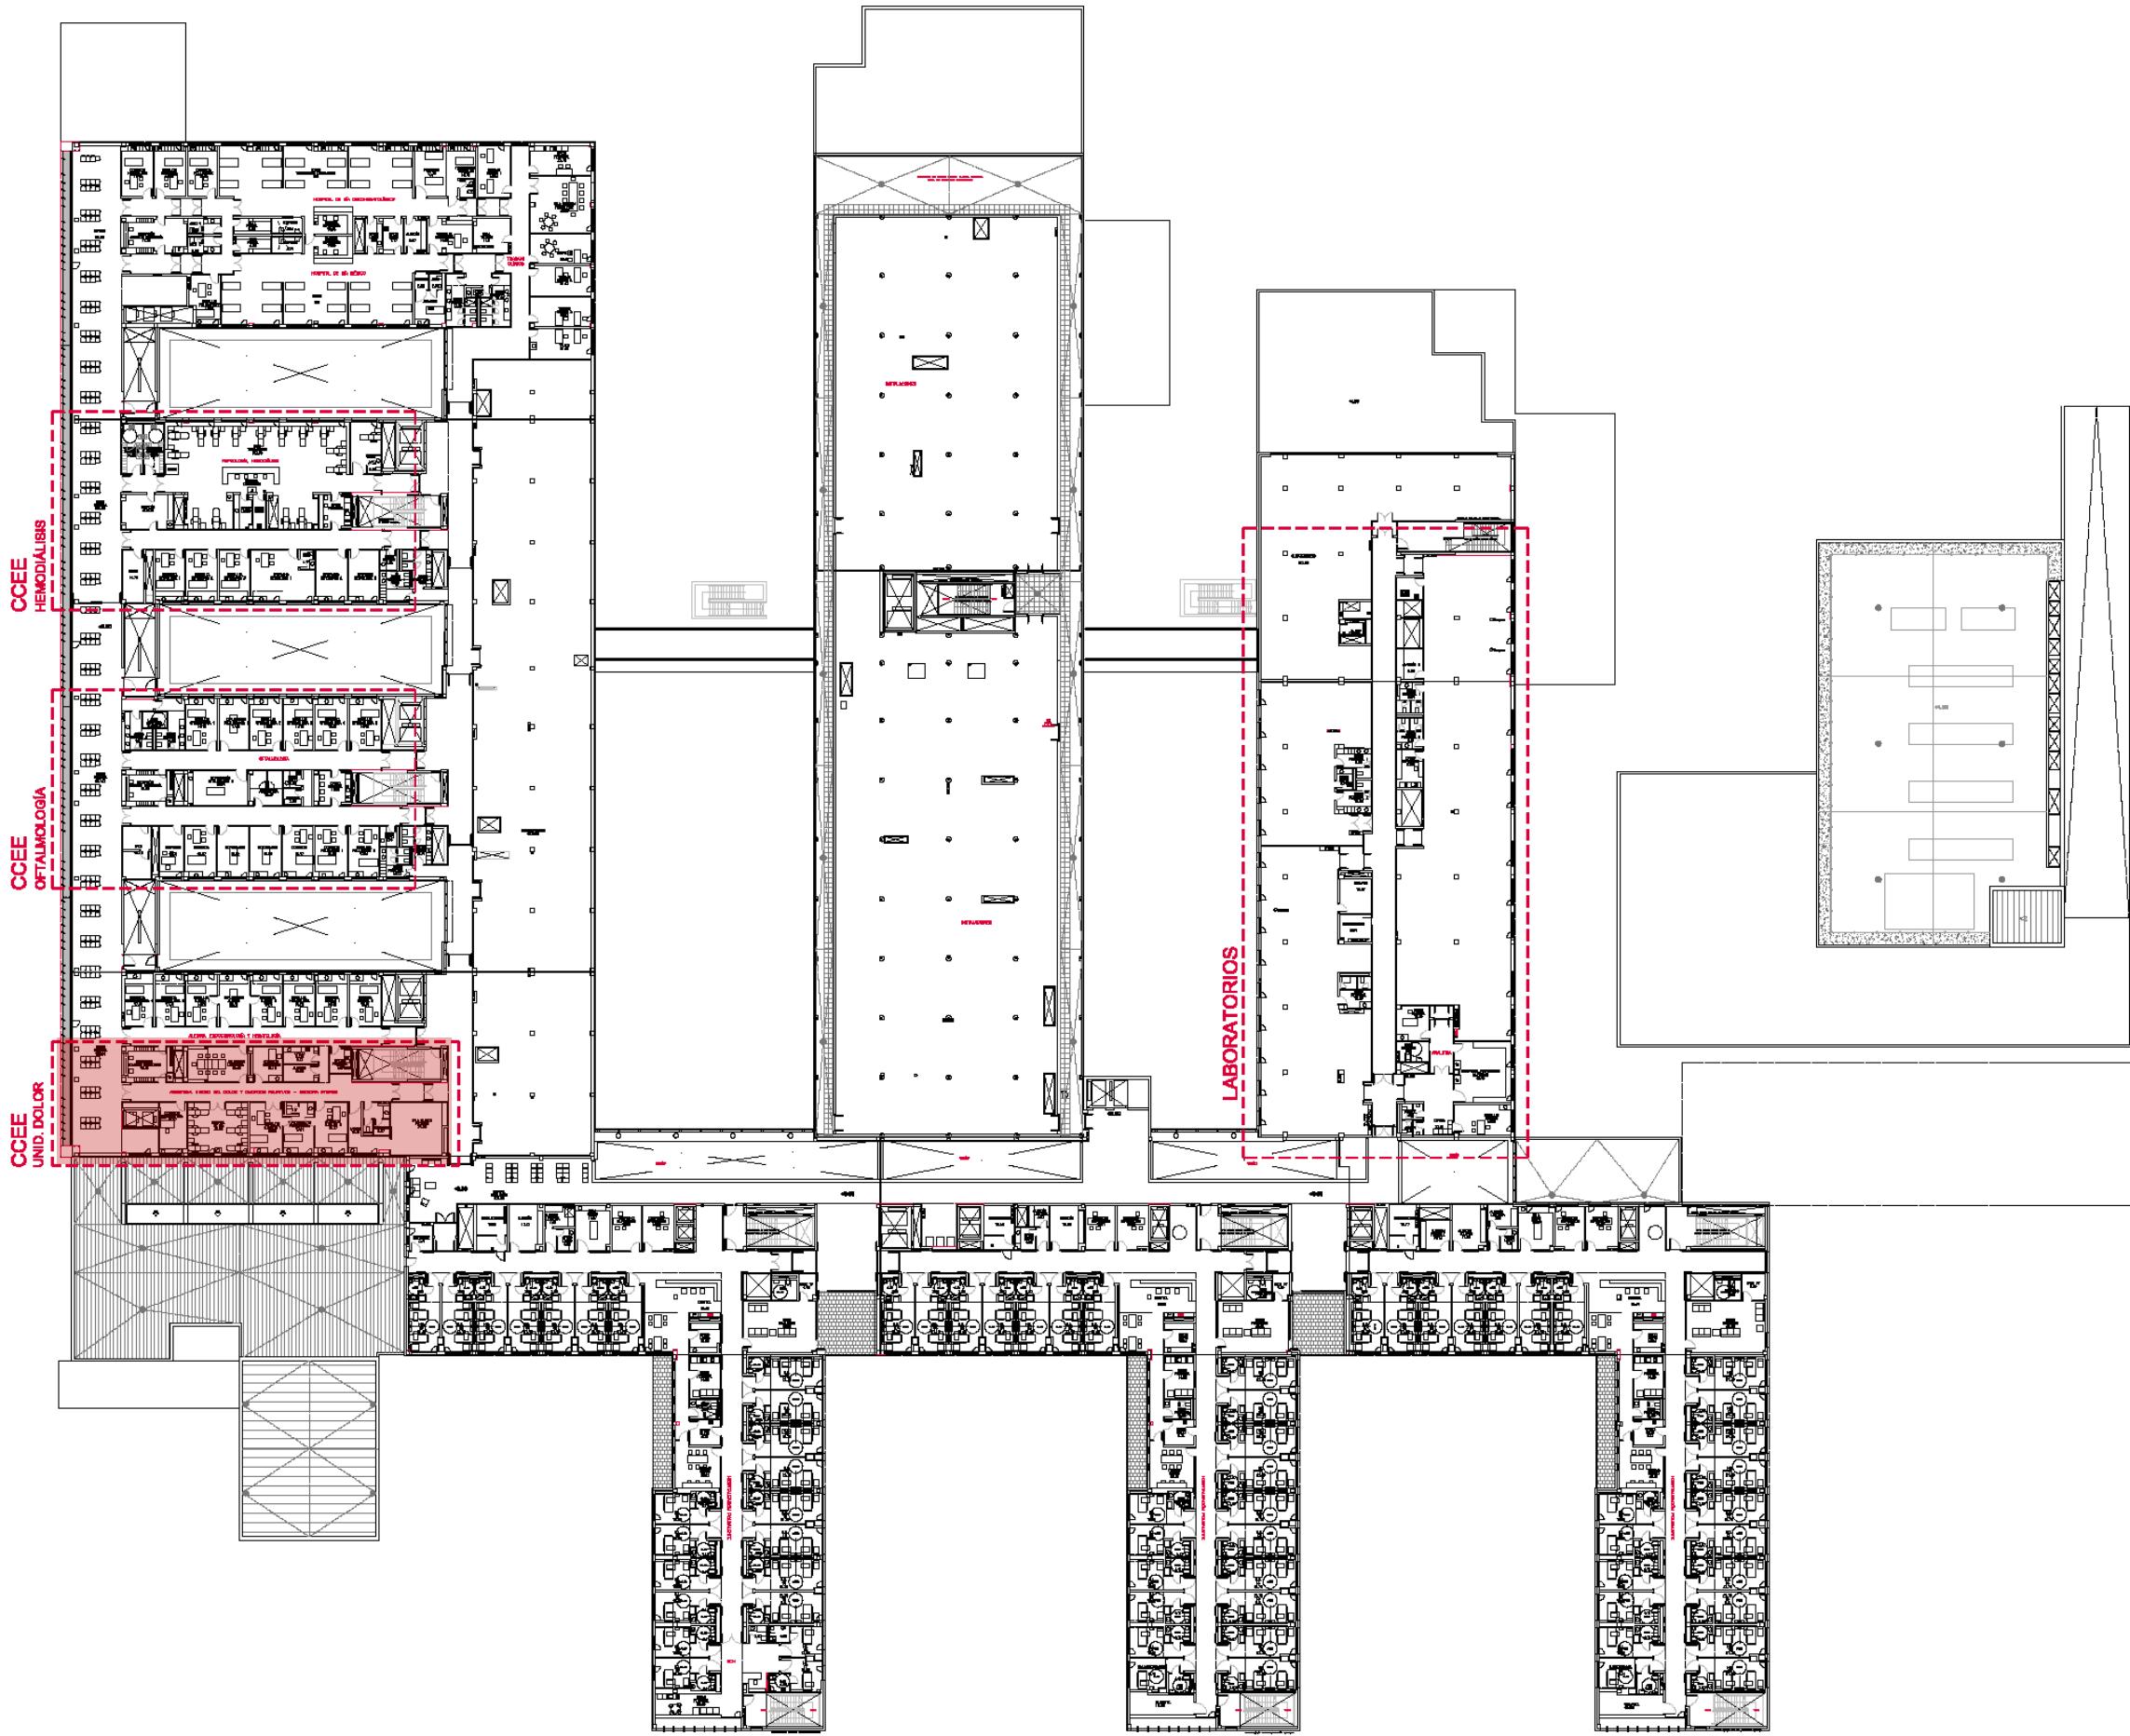

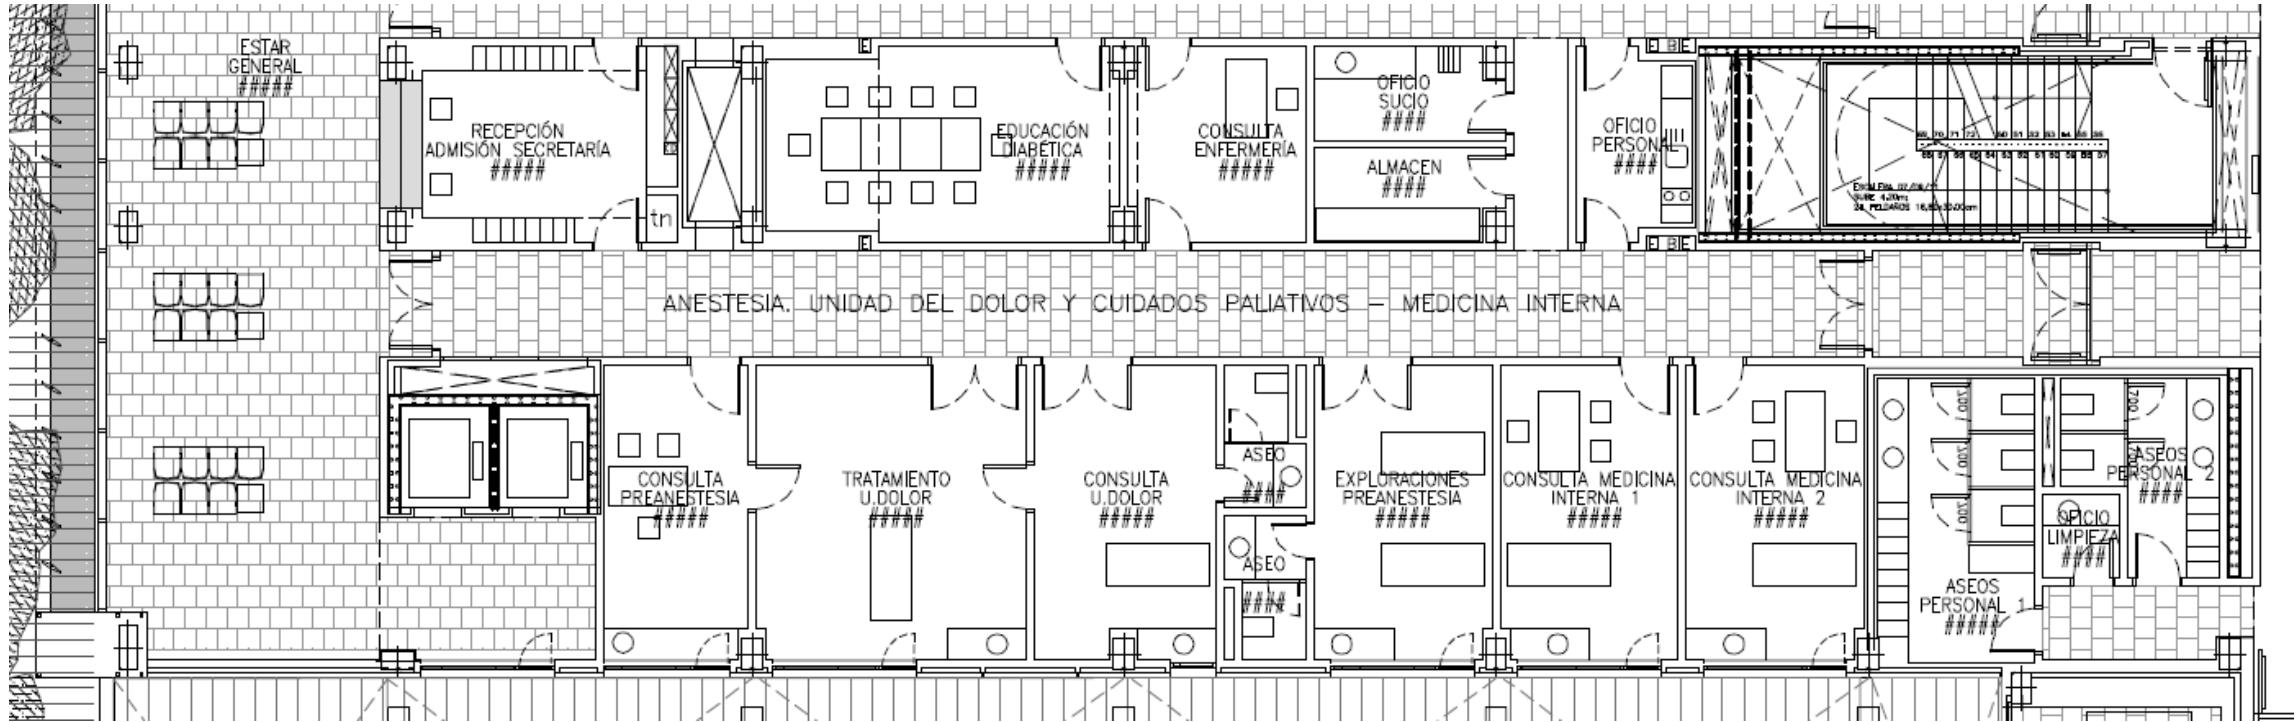

CCEE
UNID. DOLOR

